


60.9%	58.5%	1394/2383	22	32	0/4
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados	Cierre de expediente

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **60.9%** de avance estimado y un **58.5%** terminado; las viviendas avanzan +3.7 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 22 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 11 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

EVOLUCIÓN (VIVIENDAS)

Cada punto muestra el avance ponderado de la revisión; el marcador final distingue el total de obra cuando existe garaje.

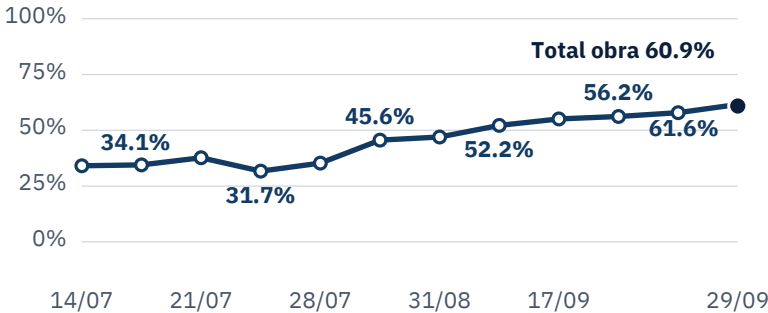

AVANCE POR BLOQUE

BOLUETA	63.8%	1373/2226
GARAJE	38.4%	20/69
ZONAS ESPECIALES	4.4%	1/88

CIERRE DE EXPEDIENTE

Ensayos instrumentales PENDIENTE	Inspección OCA PENDIENTE
CIE / Boletín eléctrico PENDIENTE	Libro del Edificio PENDIENTE

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Color según avance: ■ menos de 50 % ■ 50 a 79 % ■ 80 a 99 % ■ 100 %

Inicio de obra	100.0%	92/92	Infraestructura	82.7%	359/475
Instalación interior	89.7%	520/589	Recuperación tras Pladur	86.1%	79/92
Conexiones	36.7%	67/184	Cierre técnico	47.6%	86/184
Mecanismos	49.6%	90/184	Remates finales	0.0%	0/92
Remates exteriores	0.0%	0/92	Iluminación final	82.2%	72/92
Entrega	8.0%	14/184	Cubierta — Antena/pararrayos	7.1%	0/7
Instalación interior garaje	100.0%	4/4	Equipos	3.2%	2/63
Equipos garaje	80.0%	6/12	Cuadros	13.3%	2/33
Cuartos técnicos garaje	0.0%	0/1	Remates garaje	53.3%	1/3

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 6 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Montante eléctrica Infraestructura	84%	70/95	4
Montante de telecomunicaciones Infraestructura	99%	92/95	0
Montante de servicios comunes Infraestructura	66%	43/95	0
Cableado de zonas comunes Infraestructura	65%	59/95	32
Cuadros presentados Instalación interior	100%	91/92	0
Tubeado interior Instalación interior	98%	92/95	0
+46 más · continúan en el mismo orden de ejecución			

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura — segunda mano Casquillos y bombillas, Placas y tapas	161
Fachada terminada Aplicques y enchufes de terraza	92
Pintura de zonas comunes Iluminación de rellanos / ZZCC	88
+28 más	

PRÓXIMOS FRENTE


Próximo tajo Sagarde	Uds.
Montante eléctrica Infraestructura	25
Montante de telecomunicaciones Infraestructura	3
Montante de servicios comunes Infraestructura	52
+19 más	

38.4%	29.0%	20/69	4	20
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **38.4%** de avance estimado y un **29.0%** terminado; sin comparación histórica suficiente.
Producción: 4 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 6 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

Sin cuatro revisiones comparables; composición del último estado medido.



Terminado X: 20
En marcha M: 10
Iniciado /: 2
Pendiente: 37

DETALLE POR ZONA

Escalera Principal 0% · 0/12	Escalera 2 4% · 0/12
Cuadro General Garaje 27% · 4/15	bombas de achique 51% · 3/7
Trasteros -1 60% · 0/2	planta -1 62% · 2/10
planta -2 100% · 9/9	Trasteros -2 100% · 2/2

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Color según avance: ■ menos de 50 % ■ 50 a 79 % ■ 80 a 99 % ■ 100 %

Instalación interior	48.1% 6/16	Instalación interior garaje	100.0% 4/4
Equipos	8.7% 2/23	Equipos garaje	80.0% 6/12
Cuadros	16.0% 1/10	Cuartos técnicos garaje	0.0% 0/1
Remates garaje	53.3% 1/3		

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 10 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Tubeado visto	51%	3/8	2
Instalación interior			
Cableado visto	45%	3/8	4
Instalación interior			
Colocación alumbrado fijo (recintos)	0%	0/5	5
Equipos			
Colocación alumbrado fijo (viales)	80%	1/2	0
Equipos garaje			
Colocación alumbrado temporizado (recintos)	0%	0/1	1
Equipos			
Colocación alumbrado temporizado (viales)	80%	1/2	0
Equipos garaje			
Colocación luminarias de emergencia (recintos)	0%	0/5	5
Equipos			
Colocación luminarias de emergencia (viales)	80%	1/2	0
Equipos garaje			
Colocación de enchufe de cuarto técnico	0%	0/1	1
Equipos			
Tubeado y cableado hasta cuadro secundario	30%	0/2	1
Cuadros			
+13 más · continúan en el mismo orden de ejecución			

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura (recintos) — 1ª mano	
Colocación alumbrado fijo (recintos), Col...	14
Pintura (recintos) — 2ª mano	
Embornado alumbrado fijo (recintos), Embo...	11
Lucido	
Tubeado visto	5
Pintura de garaje (viales) — 1ª mano	
Colocación alumbrado fijo (viales), Coloc...	3
+12 más	

PRÓXIMOS FRENTE

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Tubeado y cableado hasta cuadro secundario	
Cuadros	1
Derivación de tierra de cuarto técnico	
Cuartos técnicos garaje	1
Alimentación de cuadro de puerta de acceso	
Remates garaje	1
Preinstalación vehículo eléctrico (IRVE)	
Remates garaje	1

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO

OBRA: 2026 BOLUETA ACR | ÁMBITO: ZONAS ESPECIALES

Datos: 29/09/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Neinor Península, S.L.U · Parcela RE A4, Bolueta, 48004 Bilbao (Bizkaia)

4.4%

Avance estimado

1.1%

Terminado estricto

1/88

Celdas terminadas

6

Tajos listos


22

Tajos condicionados

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **4.4%** de avance estimado y un **1.1%** terminado; sin comparación histórica suficiente.
Producción: 6 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 4 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

Sin cuatro revisiones comparables; composición del último estado medido.



■ Terminado X: 1 ■ En marcha M: 4
■ Iniciado /: 2 ■ Pendiente: 81

DETALLE POR ZONA

Basuras
0% · 0/12

Centralización de
contadores P24
0% · 0/12

Cuarto Aeroterminia
0% · 0/17

Cuarto RITS P24
0% · 0/13

Instalaciones
generales
0% · 0/15

Sala de calderas
5% · 0/11

Cubierta
7% · 0/7

Cuarto RITI / Teleco
9% · 0/13

Centralización de
contadores
12% · 1/13

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Color según avance: ■ menos de 50 % ■ 50 a 79 % ■ 80 a 99 % ■ 100 %

Cubierta — Antena/pararrayos ■ 7.1% 0/7 Instalación interior ■ 3.3% 0/18
Equipos ■ 0.0% 0/40 Cuadros ■ 12.2% 1/23

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 10 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Colocación de soporte de antena Cubierta — Antena/pararrayos	25%	0/1	0
Colocación de soporte de pararrayos Cubierta — Antena/pararrayos	25%	0/1	0
Instalación de antena Cubierta — Antena/pararrayos	0%	0/1	1
Instalación de pararrayos Cubierta — Antena/pararrayos	0%	0/1	1
Cableado de antena Cubierta — Antena/pararrayos	0%	0/1	1
Cableado de pararrayos Cubierta — Antena/pararrayos	0%	0/1	1
Tierra de antena Cubierta — Antena/pararrayos	0%	0/1	1
Tubeado empotrado Instalación interior	12%	0/5	4
Cableado empotrado Instalación interior	0%	0/5	5
Tubeado visto Instalación interior	0%	0/4	4
+14 más · continúan en el mismo orden de ejecución			

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura (recintos) — 1ª mano Colocación alumbrado fijo (recintos), Col...	24
Pintura (recintos) — 2ª mano Embornado alumbrado fijo (recintos), Embo...	24
Tabicado (zona común) Tubeado empotrado, Tubeado y cableado has...	5
Lucido Tubeado visto	3
+14 más	

PRÓXIMOS FRENTE

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Colocación de soporte de antena Cubierta — Antena/pararrayos	1
Colocación de soporte de pararrayos Cubierta — Antena/pararrayos	1
Tubeado empotrado Instalación interior	2
Tubeado visto Instalación interior	1
+2 más	
