


64.6%	62.3%	1530/2455	21	35	0/4
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados	Cierre de expediente

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **64.6%** de avance estimado y un **62.3%** terminado; las viviendas avanzan +5.6 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 21 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 11 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

EVOLUCIÓN (VIVIENDAS)

Cada punto muestra el avance ponderado de la revisión; el marcador final distingue el total de obra cuando existe garaje.

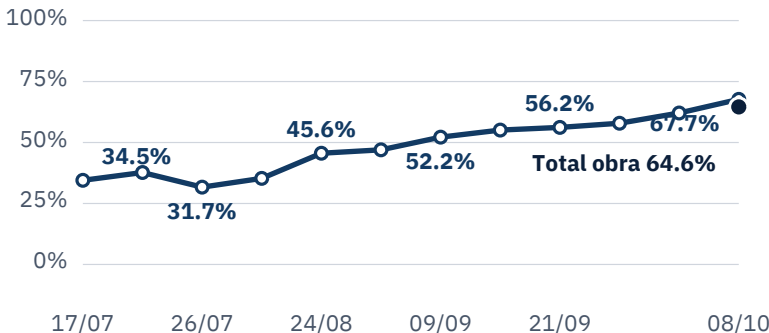

AVANCE POR BLOQUE

BOLUETA	67.7%	1507/2289
GARAJE	38.4%	20/69
ZONAS ESPECIALES	9.4%	3/97

CIERRE DE EXPEDIENTE

Ensayos instrumentales PENDIENTE	Inspección OCA PENDIENTE
CIE / Boletín eléctrico PENDIENTE	Libro del Edificio PENDIENTE

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Color según avance: ■ menos de 50 % ■ 50 a 79 % ■ 80 a 99 % ■ 100 %

Inicio de obra	94.8%	92/97	Infraestructura	93.1%	412/478
Instalación interior	91.7%	560/616	Recuperación tras Pladur	92.6%	88/95
Conexiones	40.0%	76/190	Cierre técnico	51.3%	96/190
Mecanismos	48.0%	90/190	Remates finales	8.0%	7/95
Remates exteriores	0.0%	0/95	Iluminación final	88.0%	80/95
Entrega	8.4%	14/190	Cubierta — Antena/pararrayos	7.1%	0/7
Instalación interior garaje	100.0%	4/4	Equipos	4.2%	2/54
Equipos garaje	80.0%	6/12	Cuadros	13.0%	2/43
Cuartos técnicos garaje	0.0%	0/1	Remates garaje	53.3%	1/3

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 6 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Rozas de timbres Inicio de obra	95%	92/97	5
Montante eléctrica Infraestructura	94%	88/97	2
Montante de telecomunicaciones Infraestructura	97%	92/97	2
Montante de servicios comunes Infraestructura	75%	43/95	0
Cuadros presentados Instalación interior	95%	92/97	5
Tubeador interior Instalación interior	98%	92/95	0
+48 más · continúan en el mismo orden de ejecución			

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura — segunda mano Casquillos y bombillas, Placas y tapas	160
Fachada terminada Apliques y enchufes de terraza	95
Pintura de zonas comunes Iluminación de rellanos / ZZCC	91
+30 más	

PRÓXIMOS FRENTEROS

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Rozas de timbres Inicio de obra	5
Montante eléctrica Infraestructura	9
+19 más	

38.4%	29.0%	20/69	4	20
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **38.4%** de avance estimado y un **29.0%** terminado; sin comparación histórica suficiente.
Producción: 4 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 6 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

Sin cuatro revisiones comparables; composición del último estado medido.



Terminado X: 20
En marcha M: 10
Iniciado /: 2
Pendiente: 37

DETALLE POR ZONA

Escalera Principal 0% · 0/12	Escalera 2 4% · 0/12
Cuadro General Garaje 27% · 4/15	bombas de achique 51% · 3/7
Trasteros -1 60% · 0/2	planta -1 62% · 2/10
planta -2 100% · 9/9	Trasteros -2 100% · 2/2

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: ■ menos de 50 % ■ 50 a 79 % ■ 80 a 99 % ■ 100 %

Instalación interior	48.1% 6/16	Instalación interior garaje	100.0% 4/4
Equipos	8.7% 2/23	Equipos garaje	80.0% 6/12
Cuadros	16.0% 1/10	Cuartos técnicos garaje	0.0% 0/1
Remates garaje	53.3% 1/3		

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 10 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Tubeado visto	51%	3/8	2
Instalación interior			
Cableado visto	45%	3/8	4
Instalación interior			
Colocación alumbrado fijo (recintos)	0%	0/5	5
Equipos			
Colocación alumbrado fijo (viales)	80%	1/2	0
Equipos garaje			
Colocación alumbrado temporizado (recintos)	0%	0/1	1
Equipos			
Colocación alumbrado temporizado (viales)	80%	1/2	0
Equipos garaje			
Colocación luminarias de emergencia (recintos)	0%	0/5	5
Equipos			
Colocación luminarias de emergencia (viales)	80%	1/2	0
Equipos garaje			
Colocación de enchufe de cuarto técnico	0%	0/1	1
Equipos			
Tubeado y cableado hasta cuadro secundario	30%	0/2	1
Cuadros			
+13 más · continúan en el mismo orden de ejecución			

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura (recintos) — 1ª mano	
Colocación alumbrado fijo (recintos), Col...	14
Pintura (recintos) — 2ª mano	
Embornado alumbrado fijo (recintos), Embo...	11
Lucido	
Tubeado visto	5
Pintura de garaje (viales) — 1ª mano	
Colocación alumbrado fijo (viales), Coloc...	3
+12 más	

PRÓXIMOS FRENTES

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Tubeado y cableado hasta cuadro secundario	
Cuadros	1
Derivación de tierra de cuarto técnico	
Cuartos técnicos garaje	1
Alimentación de cuadro de puerta de acceso	
Remates garaje	1
Preinstalación vehículo eléctrico (IRVE)	
Remates garaje	1

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO

OBRA: 2026 BOLUETA ACR | ÁMBITO: ZONAS ESPECIALES

Datos: 08/10/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde

Neinor Península, S.L.U · Parcela RE A4, Bolueta, 48004 Bilbao (Bizkaia)

9.4%

Avance estimado

3.1%

Terminado estricto

3/97

Celdas terminadas

6

Tajos listos


18

Tajos condicionados

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **9.4%** de avance estimado y un **3.1%** terminado; sin comparación histórica suficiente.
Producción: 6 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 4 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

Sin cuatro revisiones comparables; composición del último estado medido.



Terminado X: 3

En marcha M: 9

Iniciado /: 3

Pendiente: 82

DETALLE POR ZONA

Basuras
0% · 0/8

Cuarto Aerotermia
0% · 0/13

Instalaciones
generales
0% · 0/13

Sala de calderas
7% · 0/9

Cubierta
7% · 0/7

Centralización de
contadores P24
10% · 0/12

Cuarto RITI / Teleco
11% · 0/11

Centralización de
contadores
15% · 1/11

Cuarto RITS P24
31% · 2/13

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Color según avance: ■ menos de 50 % ■ 50 a 79 % ■ 80 a 99 % ■ 100 %

Cubierta — Antena/pararrayos ■ 7.1% 0/7 Instalación interior ■ 16.9% 2/26

Equipos | 0.8% 0/31 Cuadros ■ 12.1% 1/33

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 10 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Colocación de soporte de antena Cubierta — Antena/pararrayos	25%	0/1	0
Colocación de soporte de pararrayos Cubierta — Antena/pararrayos	25%	0/1	0
Instalación de antena Cubierta — Antena/pararrayos	0%	0/1	1
Instalación de pararrayos Cubierta — Antena/pararrayos	0%	0/1	1
Cableado de antena Cubierta — Antena/pararrayos	0%	0/1	1
Cableado de pararrayos Cubierta — Antena/pararrayos	0%	0/1	1
Tierra de antena Cubierta — Antena/pararrayos	0%	0/1	1
Tubeado empotrado Instalación interior	26%	0/7	4
Cableado empotrado Instalación interior	9%	0/7	6
Tubeado visto Instalación interior	17%	1/6	5
+10 más · continúan en el mismo orden de ejecución			

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura (recintos) — 1ª mano Colocación alumbrado fijo (recintos), Col...	22
Pintura (recintos) — 2ª mano Embornado alumbrado fijo (recintos), Embo...	21
Tabicado (zona común) Tubeado empotrado, Tubeado y cableado has...	5
Lucido Tubeado visto	3
+12 más	

PRÓXIMOS FRENTE

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Colocación de soporte de antena Cubierta — Antena/pararrayos	1
Colocación de soporte de pararrayos Cubierta — Antena/pararrayos	1
Tubeado empotrado Instalación interior	4
Tubeado visto Instalación interior	2
+2 más	
