

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


OBRA: 2026 MUNGIA ACR NEINOR | ÁMBITO: RESUMEN GENERAL (3 PORTALES/BLOQUES)
Datos: 10/09/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Neinor Península, S.L.U · Parcelas ZR1.1 y ZR1.2 del PEOU U-41, 48100 Mungia (Bizkaia)

87.0%	84.6%	1309/1547	3	3	0/4
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados	Cierre de expediente

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **87.0%** de avance estimado y un **84.6%** terminado; avance de -1.3 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 3 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 2 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

EVOLUCIÓN DEL AVANCE

Cada punto muestra el avance ponderado de la revisión; el marcador final distingue el total de obra cuando existe garaje.

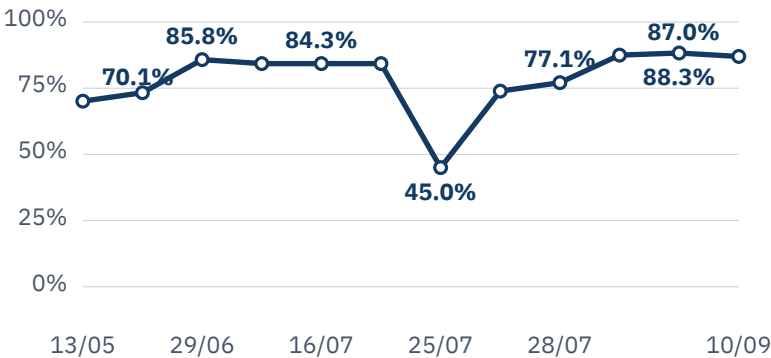

AVANCE POR BLOQUE

ZR1.1	91.2%	438/500
ZR1.2	84.7%	355/425
ZR2.1	85.4%	516/622

CIERRE DE EXPEDIENTE

Ensayos instrumentales PENDIENTE	Inspección OCA PENDIENTE
CIE / Boletín eléctrico PENDIENTE	Libro del Edificio PENDIENTE

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Color según avance: ■ menos de 50 % ■ 50 a 79 % ■ 80 a 99 % ■ 100 %

Inicio de obra	100.0%	62/62	Infraestructura	100.0%	310/310
Instalación interior	97.3%	362/372	Recuperación tras Pladur	100.0%	62/62
Conexiones	100.0%	124/124	Cierre técnico	67.0%	124/185
Mecanismos	100.0%	124/124	Remates finales	32.8%	20/61
Remates exteriores	50.7%	0/62	Iluminación final	98.7%	60/62
Entrega	53.7%	61/123			

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 10 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Termostatos Instalación interior	84%	52/62	10
Cuarto técnico Cierre técnico	0%	0/61	61
Placas y tapas Remates finales	33%	20/61	41
Aplicques y enchufes de terraza Remates exteriores	51%	0/62	9
Agujeros de iluminación en ZZCC Iluminación final	99%	60/62	0
Casquillos y bombillas Entrega	98%	61/62	1
Iluminación de rellanos / ZZCC Entrega	8%	0/61	41

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura de zonas comunes Iluminación de rellanos / ZZCC	61
Pintura – segunda mano Casquillos y bombillas, Placas y tapas	42

PRÓXIMOS FRENTE

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Termostatos Instalación interior	10
Aplicques y enchufes de terraza Remates exteriores	62
Agujeros de iluminación en ZZCC Iluminación final	2

91.2%

Avance estimado

87.6%

Terminado estricto

438/500

Celdas terminadas

2

Tajos listos


1

Tajos condicionados


Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **91.2%** de avance estimado y un **87.6%** terminado; avance de +2.9 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 2 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 1 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

EVOLUCIÓN DEL AVANCE

Cada punto muestra el avance ponderado de la revisión; el marcador final distingue el total de obra cuando existe garaje.

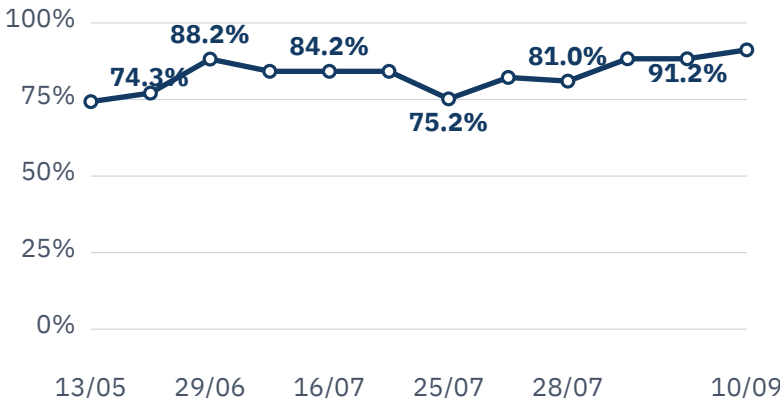

AVANCE POR PLANTA

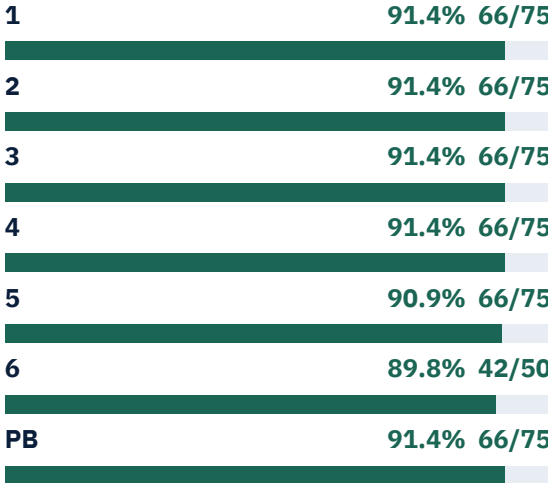

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Color según avance: ■ menos de 50 % ■ 50 a 79 % ■ 80 a 99 % ■ 100 %

Inicio de obra	100.0% 20/20	Infraestructura	100.0% 100/100
Instalación interior	100.0% 120/120	Recuperación tras Pladur	100.0% 20/20
Conexiones	100.0% 40/40	Cierre técnico	66.7% 40/60
Mecanismos	100.0% 40/40	Remates finales	100.0% 20/20
Remates exteriores	58.2% 0/20	Iluminación final	96.0% 18/20
Entrega	62.5% 20/40		

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 10 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Cuarto técnico Cierre técnico	0%	0/20	20
Apliques y enchufes de terraza Remates exteriores	58%	0/20	0
Agujeros de iluminación en ZZCC Iluminación final	96%	18/20	0
Iluminación de rellanos / ZZCC Entrega	25%	0/20	0

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura de zonas comunes Iluminación de rellanos / ZZCC	20

PRÓXIMOS FRENTEROS

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Apliques y enchufes de terraza Remates exteriores	20
Agujeros de iluminación en ZZCC Iluminación final	2

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO

OBRA: 2026 MUNGIA ACR NEINOR | ÁMBITO: ZR1.2

Datos: 10/09/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde

Neinor Península, S.L.U · Parcelas ZR1.1 y ZR1.2 del PEOU U-41, 48100 Mungia (Bizkaia)

84.7%

Avance estimado

83.5%

Terminado estricto

355/425

Celdas terminadas

2

Tajos listos


3

Tajos condicionados

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **84.7%** de avance estimado y un **83.5%** terminado; avance de -3.5 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 2 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 2 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

EVOLUCIÓN DEL AVANCE

Cada punto muestra el avance ponderado de la revisión; el marcador final distingue el total de obra cuando existe garaje.

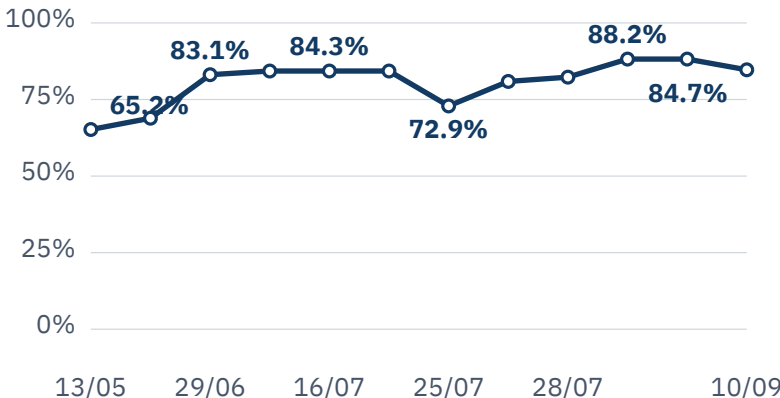

AVANCE POR PLANTA

1	86.4%	42/50
2	86.4%	63/75
3	86.4%	63/75
4	84.0%	63/75
5	84.0%	63/75
6	84.0%	42/50
PB	76.0%	19/25

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Color según avance: ■ menos de 50 % ■ 50 a 79 % ■ 80 a 99 % ■ 100 %

Inicio de obra	100.0%	17/17	Infraestructura	100.0%	85/85
Instalación interior	99.0%	101/102	Recuperación tras Pladur	100.0%	17/17
Conexiones	100.0%	34/34	Cierre técnico	66.7%	34/51
Mecanismos	100.0%	34/34	Remates finales	0.0%	0/17
Remates exteriores	28.2%	0/17	Iluminación final	100.0%	17/17
Entrega	47.1%	16/34			

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 10 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Termostatos Instalación interior	94%	16/17	1
Cuarto técnico Cierre técnico	0%	0/17	17
Placas y tapas Remates finales	0%	0/17	17
Apliques y enchufes de terraza Remates exteriores	28%	0/17	9
Casquillos y bombillas Entrega	94%	16/17	1
Iluminación de rellanos / ZZCC Entrega	0%	0/17	17

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura — segunda mano Casquillos y bombillas, Placas y tapas	18
Pintura de zonas comunes Iluminación de rellanos / ZZCC	17

PRÓXIMOS FRENTE

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Termostatos Instalación interior	1
Apliques y enchufes de terraza Remates exteriores	17

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


OBRA: 2026 MUNGIA ACR NEINOR | ÁMBITO: ZR2.1
Datos: 10/09/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Neinor Península, S.L.U · Parcelas ZR1.1 y ZR1.2 del PEOU U-41, 48100 Mungia (Bizkaia)

85.4%	83.0%	516/622	2	2
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **85.4%** de avance estimado y un **83.0%** terminado; avance de -3.1 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 2 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 2 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

EVOLUCIÓN DEL AVANCE

Cada punto muestra el avance ponderado de la revisión; el marcador final distingue el total de obra cuando existe garaje.

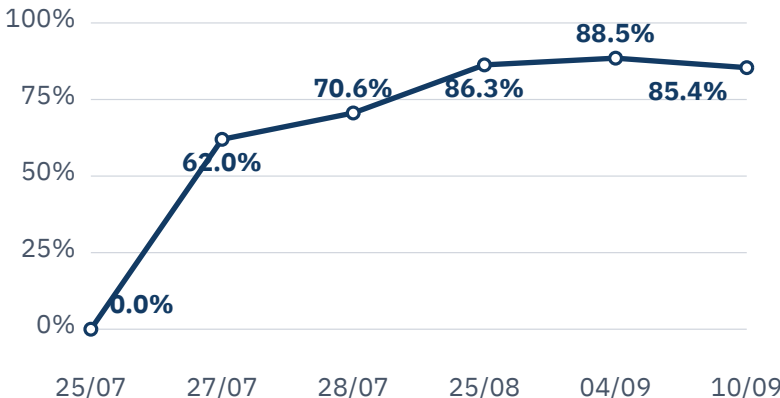

AVANCE POR PLANTA

1	86.4%	84/100
2	88.5%	105/122
3	86.4%	105/125
4	82.4%	100/125
5	82.4%	80/100
PB	86.4%	42/50

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Color según avance: ■ menos de 50 % ■ 50 a 79 % ■ 80 a 99 % ■ 100 %

Inicio de obra	100.0%	25/25	Infraestructura	100.0%	125/125
Instalación interior	94.0%	141/150	Recuperación tras Pladur	100.0%	25/25
Conexiones	100.0%	50/50	Cierre técnico	67.6%	50/74
Mecanismos	100.0%	50/50	Remates finales	0.0%	0/24
Remates exteriores	60.0%	0/25	Iluminación final	100.0%	25/25
Entrega	51.0%	25/49			

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 10 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Termostatos Instalación interior	64%	16/25	9
Cuarto técnico Cierre técnico	0%	0/24	24
Placas y tapas Remates finales	0%	0/24	24
Aplicques y enchufes de terraza Remates exteriores	60%	0/25	0
Iluminación de rellanos / ZZCC Entrega	0%	0/24	24

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura de zonas comunes Iluminación de rellanos / ZZCC	24
Pintura — segunda mano Placas y tapas	24

PRÓXIMOS FRENTES

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Termostatos Instalación interior	9
Aplicques y enchufes de terraza Remates exteriores	25
