

66.1%

Avance estimado

63.7%

Terminado estricto

1566/2458

Celdas terminadas

21

Tajos listos

35

Tajos condicionados


0/4

Cierre de expediente

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **66.1%** de avance estimado y un **63.7%** terminado; las viviendas avanzan +1.5 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 21 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 11 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

EVOLUCIÓN (VIVIENDAS)

Cada punto muestra el avance ponderado de la revisión; el marcador final distingue el total de obra cuando existe garaje.

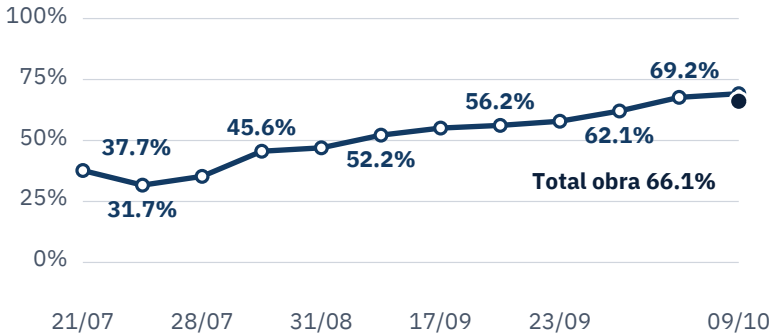

AVANCE POR BLOQUE

BOLUETA 69.2% 1534/2289

GARAJE 43.5% 29/72

ZONAS ESPECIALES 10.7% 3/97

CIERRE DE EXPEDIENTE

Ensayos instrumentales
PENDIENTE

Inspección OCA
PENDIENTE

CIE / Boletín eléctrico
PENDIENTE

Libro del Edificio
PENDIENTE

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Color según avance: ■ menos de 50 % ■ 50 a 79 % ■ 80 a 99 % ■ 100 %

Inicio de obra	94.8% 92/97	Infraestructura	94.5% 416/478
Instalación interior	91.6% 560/616	Recuperación tras Pladur	92.6% 88/95
Conexiones	40.0% 76/190	Cierre técnico	54.5% 99/190
Mecanismos	53.3% 100/190	Remates finales	8.0% 7/95
Remates exteriores	0.0% 0/95	Iluminación final	88.0% 80/95
Entrega	14.3% 24/190	Cubierta — Antena/pararrayos	7.1% 0/7
Instalación interior garaje	100.0% 4/4	Equipos	8.6% 4/58
Equipos garaje	100.0% 12/12	Cuadros	16.7% 3/42
Cuartos técnicos garaje	0.0% 0/1	Remates garaje	53.3% 1/3

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 6 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Rozas de timbres Inicio de obra	95%	92/97	5
Montante eléctrica Infraestructura	97%	92/97	0
Montante de telecomunicaciones Infraestructura	97%	92/97	0
Montante de servicios comunes Infraestructura	78%	43/95	0
Cuadros presentados Instalación interior	95%	92/97	5
Tubeador interior Instalación interior	98%	92/95	0

+42 más · continúan en el mismo orden de ejecución

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura — segunda mano Casquillos y bombillas, Placas y tapas	151
Fachada terminada Apliques y enchufes de terraza	95
Pintura de zonas comunes Iluminación de rellanos / ZZCC	91
+30 más	

PRÓXIMOS FRENTEROS

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Rozas de timbres Inicio de obra	5
Montante eléctrica Infraestructura	5
+19 más	

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO

OBRA: 2026 BOLUETA ACR | ÁMBITO: GARAJE
Datos: 09/10/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Neinor Península, S.L.U · Parcela RE A4, Bolueta, 48004 Bilbao (Bizkaia)

43.5%	40.3%	29/72	4	13
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **43.5%** de avance estimado y un **40.3%** terminado; avance de +3.7 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 4 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 3 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

Sin cuatro revisiones comparables; composición del último estado medido.



Terminado X: 29
En marcha M: 1
Iniciado /: 7
Pendiente: 35

DETALLE POR ZONA

Escalera Principal 2% · 0/12	Escalera 2 4% · 0/12
Trasteros -1 25% · 0/4	Cuadro General Garaje 27% · 4/15
bombas de achique 67% · 4/6	planta -1 86% · 8/10
planta -2 100% · 9/9	Trasteros -2 100% · 4/4

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Color según avance: ■ menos de 50 % ■ 50 a 79 % ■ 80 a 99 % ■ 100 %

Instalación interior	43.8% 6/16	Instalación interior garaje	100.0% 4/4
Equipos	17.6% 4/27	Equipos garaje	100.0% 12/12
Cuadros	22.2% 2/9	Cuartos técnicos garaje	0.0% 0/1
Remates garaje	53.3% 1/3		

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 10 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Tubeado visto	47%	3/8	2
Instalación interior			
Cableado visto	41%	3/8	4
Instalación interior			
Colocación alumbrado fijo (recintos)	18%	1/7	5
Equipos			
Colocación alumbrado temporizado (recintos)	0%	0/1	1
Equipos			
Colocación luminarias de emergencia (recintos)	5%	0/5	4
Equipos			
Colocación de enchufe de cuarto técnico	0%	0/1	1
Equipos			
Tubeado y cableado hasta cuadro secundario	50%	1/2	1
Cuadros			
Colocación y mecanizado de cuadro propio	0%	0/2	2
Cuadros			
Embornado de cuadro propio	0%	0/1	1
Cuadros			
Rotulación de cuadro propio	0%	0/2	2
Cuadros			
+7 más · continúan en el mismo orden de ejecución			

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura (recintos) – 1ª mano	
Colocación alumbrado fijo (recintos), Col...	15
Pintura (recintos) – 2ª mano	
Embornado alumbrado fijo (recintos), Embo...	11
Lucido	
Tubeado visto	5
Colocación alumbrado fijo (recintos)	
Embornado alumbrado fijo (recintos)	5
+6 más	

PRÓXIMOS FRENTE

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Tubeado y cableado hasta cuadro secundario	1
Cuadros	
Derivación de tierra de cuarto técnico	1
Cuartos técnicos garaje	
Alimentación de cuadro de puerta de acceso	1
Remates garaje	
Preinstalación vehículo eléctrico (IRVE)	1
Remates garaje	

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO

OBRA: 2026 BOLUETA ACR | ÁMBITO: ZONAS ESPECIALES

Datos: 09/10/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Neinor Península, S.L.U · Parcela RE A4, Bolueta, 48004 Bilbao (Bizkaia)

10.7%

Avance estimado

3.1%

Terminado estricto

3/97

Celdas terminadas

6

Tajos listos


18

Tajos condicionados

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **10.7%** de avance estimado y un **3.1%** terminado; sin comparación histórica suficiente. **Producción:** 6 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 4 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

Sin cuatro revisiones comparables; composición del último estado medido.



Terminado X: 3
En marcha M: 9
Iniciado /: 8
Pendiente: 77

DETALLE POR ZONA

Basuras
0% · 0/8

Cuarto Aerotermia
0% · 0/13

Instalaciones
generales
0% · 0/13

Sala de calderas
7% · 0/9

Cubierta
7% · 0/7

Cuarto RITI / Teleco
11% · 0/11

Centralización de
contadores
15% · 1/11

Centralización de
contadores P24
20% · 0/12

Cuarto RITS P24
31% · 2/13

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Color según avance: ■ menos de 50 % ■ 50 a 79 % ■ 80 a 99 % ■ 100 %

Cubierta — Antena/pararrayos 7.1% 0/7 Instalación interior 17.9% 2/26

Equipos 0.8% 0/31 Cuadros 15.2% 1/33

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 10 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Colocación de soporte de antena Cubierta — Antena/pararrayos	25%	0/1	0
Colocación de soporte de pararrayos Cubierta — Antena/pararrayos	25%	0/1	0
Instalación de antena Cubierta — Antena/pararrayos	0%	0/1	1
Instalación de pararrayos Cubierta — Antena/pararrayos	0%	0/1	1
Cableado de antena Cubierta — Antena/pararrayos	0%	0/1	1
Cableado de pararrayos Cubierta — Antena/pararrayos	0%	0/1	1
Tierra de antena Cubierta — Antena/pararrayos	0%	0/1	1
Tubeado empotrado Instalación interior	26%	0/7	4
Cableado empotrado Instalación interior	12%	0/7	5
Tubeado visto Instalación interior	17%	1/6	5
+10 más · continúan en el mismo orden de ejecución			

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura (recintos) — 1ª mano Colocación alumbrado fijo (recintos), Col...	22
Pintura (recintos) — 2ª mano Embornado alumbrado fijo (recintos), Embo...	21
Tabicado (zona común) Tubeado empotrado, Tubeado y cableado has...	5
Lucido Tubeado visto	3
+12 más	

PRÓXIMOS FRENTE

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Colocación de soporte de antena Cubierta — Antena/pararrayos	1
Colocación de soporte de pararrayos Cubierta — Antena/pararrayos	1
Tubeado empotrado Instalación interior	4
Tubeado visto Instalación interior	2
+2 más	
