

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


OBRA: 2026 MUNGIA ACR NEINOR | ÁMBITO: RESUMEN GENERAL (3 PORTALES/BLOQUES)  
Datos: 10/09/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde  
Neinor Península, S.L.U · Parcelas ZR1.1 y ZR1.2 del PEOU U-41, 48100 Mungia (Bizkaia)

|                 |                    |                   |              |                     |                      |
|-----------------|--------------------|-------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 87.0%           | 84.6%              | 1309/1547         | 3            | 3                   | 0/4                  |
| Avance estimado | Terminado estricto | Celdas terminadas | Tajos listos | Tajos condicionados | Cierre de expediente |

**Situación eléctrica:** Sagarde alcanza un **87.0%** de avance estimado y un **84.6%** terminado; avance de -1.3 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 3 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 2 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

EVOLUCIÓN DEL AVANCE

Cada punto muestra el avance ponderado de la revisión; el marcador final distingue el total de obra cuando existe garaje.

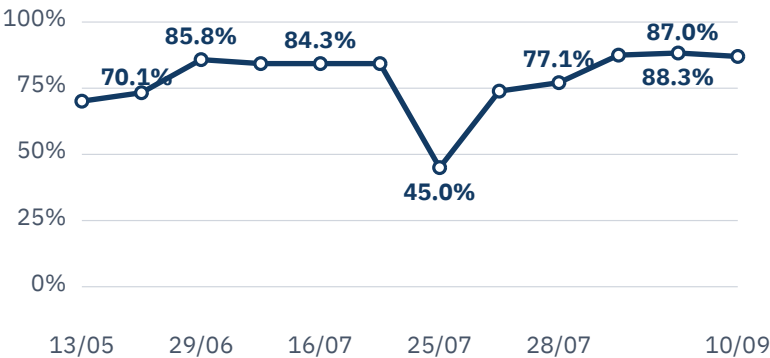

AVANCE POR BLOQUE

|       |       |         |
|-------|-------|---------|
| ZR1.1 | 91.2% | 438/500 |
| ZR1.2 | 84.7% | 355/425 |
| ZR2.1 | 85.4% | 516/622 |

CIERRE DE EXPEDIENTE

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Ensayos instrumentales<br>PENDIENTE  | Inspección OCA<br>PENDIENTE     |
| CIE / Boletín eléctrico<br>PENDIENTE | Libro del Edificio<br>PENDIENTE |

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Color según avance: ■ menos de 50 % ■ 50 a 79 % ■ 80 a 99 % ■ 100 %

|                      |        |         |                          |        |         |
|----------------------|--------|---------|--------------------------|--------|---------|
| Inicio de obra       | 100.0% | 62/62   | Infraestructura          | 100.0% | 310/310 |
| Instalación interior | 97.3%  | 362/372 | Recuperación tras Pladur | 100.0% | 62/62   |
| Conexiones           | 100.0% | 124/124 | Cierre técnico           | 67.0%  | 124/185 |
| Mecanismos           | 100.0% | 124/124 | Remates finales          | 32.8%  | 20/61   |
| Remates exteriores   | 50.7%  | 0/62    | Iluminación final        | 98.7%  | 60/62   |
| Entrega              | 53.7%  | 61/123  |                          |        |         |

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 10 filas, en el orden de ejecución de la base.

| Tajo Sagarde / fase                                          | Avance | Hecho | Pend. |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|
| <b>Termostatos</b><br>Instalación interior                   | 84%    | 52/62 | 10    |
| <b>Cuarto técnico</b><br>Cierre técnico                      | 0%     | 0/61  | 61    |
| <b>Placas y tapas</b><br>Remates finales                     | 33%    | 20/61 | 41    |
| <b>Aplicques y enchufes de terraza</b><br>Remates exteriores | 51%    | 0/62  | 9     |
| <b>Agujeros de iluminación en ZZCC</b><br>Iluminación final  | 99%    | 60/62 | 0     |
| <b>Casquillos y bombillas</b><br>Entrega                     | 98%    | 61/62 | 1     |
| <b>Iluminación de rellanos / ZZCC</b><br>Entrega             | 8%     | 0/61  | 41    |

CONDICIONANTES

| Condicionante                                                           | Afecta |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Pintura de zonas comunes</b><br>Iluminación de rellanos / ZZCC       | 61     |
| <b>Pintura – segunda mano</b><br>Casquillos y bombillas, Placas y tapas | 42     |

PRÓXIMOS FRENTE

| Próximo tajo Sagarde                                         | Uds. |
|--------------------------------------------------------------|------|
| <b>Termostatos</b><br>Instalación interior                   | 10   |
| <b>Aplicques y enchufes de terraza</b><br>Remates exteriores | 62   |
| <b>Agujeros de iluminación en ZZCC</b><br>Iluminación final  | 2    |

91.2%

Avance estimado

87.6%

Terminado estricto

438/500

Celdas terminadas

2

Tajos listos


1

Tajos condicionados

**Situación eléctrica:** Sagarde alcanza un **91.2%** de avance estimado y un **87.6%** terminado; avance de +2.9 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 2 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 1 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

### EVOLUCIÓN DEL AVANCE

Cada punto muestra el avance ponderado de la revisión; el marcador final distingue el total de obra cuando existe garaje.

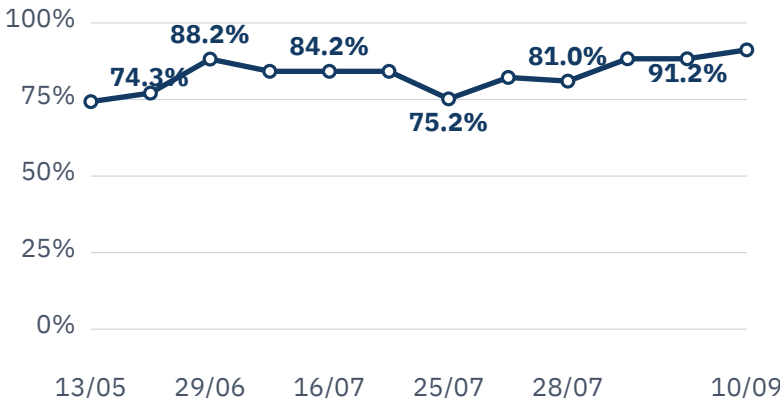

### AVANCE POR PLANTA

|    |       |       |
|----|-------|-------|
| 1  | 91.4% | 66/75 |
| 2  | 91.4% | 66/75 |
| 3  | 91.4% | 66/75 |
| 4  | 91.4% | 66/75 |
| 5  | 90.9% | 66/75 |
| 6  | 89.8% | 42/50 |
| PB | 91.4% | 66/75 |

### FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Color según avance: ■ menos de 50 % ■ 50 a 79 % ■ 80 a 99 % ■ 100 %

|                      |        |         |                          |        |         |
|----------------------|--------|---------|--------------------------|--------|---------|
| Inicio de obra       | 100.0% | 20/20   | Infraestructura          | 100.0% | 100/100 |
| Instalación interior | 100.0% | 120/120 | Recuperación tras Pladur | 100.0% | 20/20   |
| Conexiones           | 100.0% | 40/40   | Cierre técnico           | 66.7%  | 40/60   |
| Mecanismos           | 100.0% | 40/40   | Remates finales          | 100.0% | 20/20   |
| Remates exteriores   | 58.2%  | 0/20    | Iluminación final        | 96.0%  | 18/20   |
| Entrega              | 62.5%  | 20/40   |                          |        |         |

### TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 10 filas, en el orden de ejecución de la base.

| Tajo Sagarde / fase                                  | Avance | Hecho | Pend. |
|------------------------------------------------------|--------|-------|-------|
| Cuarto técnico<br>Cierre técnico                     | 0%     | 0/20  | 20    |
| Apliques y enchufes de terraza<br>Remates exteriores | 58%    | 0/20  | 0     |
| Agujeros de iluminación en ZZCC<br>Iluminación final | 96%    | 18/20 | 0     |
| Iluminación de rellanos / ZZCC<br>Entrega            | 25%    | 0/20  | 0     |

### CONDICIONANTES

| Condicionante                                              | Afecta |
|------------------------------------------------------------|--------|
| Pintura de zonas comunes<br>Iluminación de rellanos / ZZCC | 20     |

### PRÓXIMOS FRENTE

| Próximo tajo Sagarde                                 | Uds. |
|------------------------------------------------------|------|
| Apliques y enchufes de terraza<br>Remates exteriores | 20   |
| Agujeros de iluminación en ZZCC<br>Iluminación final | 2    |

## INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO

OBRA: 2026 MUNGIA ACR NEINOR | ÁMBITO: ZR1.2

Datos: 10/09/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde

Neinor Península, S.L.U · Parcelas ZR1.1 y ZR1.2 del PEOU U-41, 48100 Mungia (Bizkaia)

84.7%

Avance estimado

83.5%

Terminado estricto

355/425

Celdas terminadas

2

Tajos listos


3

Tajos condicionados

**Situación eléctrica:** Sagarde alcanza un **84.7%** de avance estimado y un **83.5%** terminado; avance de -3.5 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 2 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 2 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

### EVOLUCIÓN DEL AVANCE

Cada punto muestra el avance ponderado de la revisión; el marcador final distingue el total de obra cuando existe garaje.

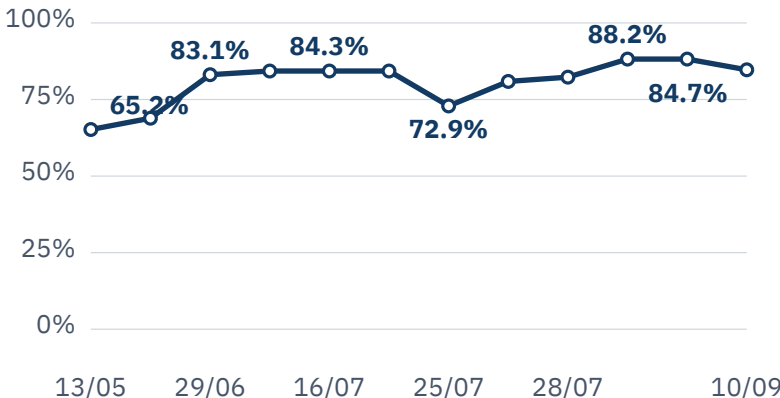

### AVANCE POR PLANTA

|    |       |       |
|----|-------|-------|
| 1  | 86.4% | 42/50 |
| 2  | 86.4% | 63/75 |
| 3  | 86.4% | 63/75 |
| 4  | 84.0% | 63/75 |
| 5  | 84.0% | 63/75 |
| 6  | 84.0% | 42/50 |
| PB | 76.0% | 19/25 |

### FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Color según avance: ■ menos de 50 % ■ 50 a 79 % ■ 80 a 99 % ■ 100 %

|                      |        |         |                          |        |       |
|----------------------|--------|---------|--------------------------|--------|-------|
| Inicio de obra       | 100.0% | 17/17   | Infraestructura          | 100.0% | 85/85 |
| Instalación interior | 99.0%  | 101/102 | Recuperación tras Pladur | 100.0% | 17/17 |
| Conexiones           | 100.0% | 34/34   | Cierre técnico           | 66.7%  | 34/51 |
| Mecanismos           | 100.0% | 34/34   | Remates finales          | 0.0%   | 0/17  |
| Remates exteriores   | 28.2%  | 0/17    | Iluminación final        | 100.0% | 17/17 |
| Entrega              | 47.1%  | 16/34   |                          |        |       |

### TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 10 filas, en el orden de ejecución de la base.

| Tajo Sagarde / fase                                         | Avance | Hecho | Pend. |
|-------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|
| <b>Termostatos</b><br>Instalación interior                  | 94%    | 16/17 | 1     |
| <b>Cuarto técnico</b><br>Cierre técnico                     | 0%     | 0/17  | 17    |
| <b>Placas y tapas</b><br>Remates finales                    | 0%     | 0/17  | 17    |
| <b>Apliques y enchufes de terraza</b><br>Remates exteriores | 28%    | 0/17  | 9     |
| <b>Casquillos y bombillas</b><br>Entrega                    | 94%    | 16/17 | 1     |
| <b>Iluminación de rellanos / ZZCC</b><br>Entrega            | 0%     | 0/17  | 17    |

### CONDICIONANTES

| Condicionante                                                           | Afecta |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Pintura — segunda mano</b><br>Casquillos y bombillas, Placas y tapas | 18     |
| <b>Pintura de zonas comunes</b><br>Iluminación de rellanos / ZZCC       | 17     |

### PRÓXIMOS FRENTE

| Próximo tajo Sagarde                                        | Uds. |
|-------------------------------------------------------------|------|
| <b>Termostatos</b><br>Instalación interior                  | 1    |
| <b>Apliques y enchufes de terraza</b><br>Remates exteriores | 17   |

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


OBRA: 2026 MUNGIA ACR NEINOR | ÁMBITO: ZR2.1  
Datos: 10/09/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde  
Neinor Península, S.L.U · Parcelas ZR1.1 y ZR1.2 del PEOU U-41, 48100 Mungia (Bizkaia)

|                 |                    |                   |              |                     |
|-----------------|--------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 85.4%           | 83.0%              | 516/622           | 2            | 2                   |
| Avance estimado | Terminado estricto | Celdas terminadas | Tajos listos | Tajos condicionados |

**Situación eléctrica:** Sagarde alcanza un **85.4%** de avance estimado y un **83.0%** terminado; avance de -3.1 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 2 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 2 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

EVOLUCIÓN DEL AVANCE

Cada punto muestra el avance ponderado de la revisión; el marcador final distingue el total de obra cuando existe garaje.

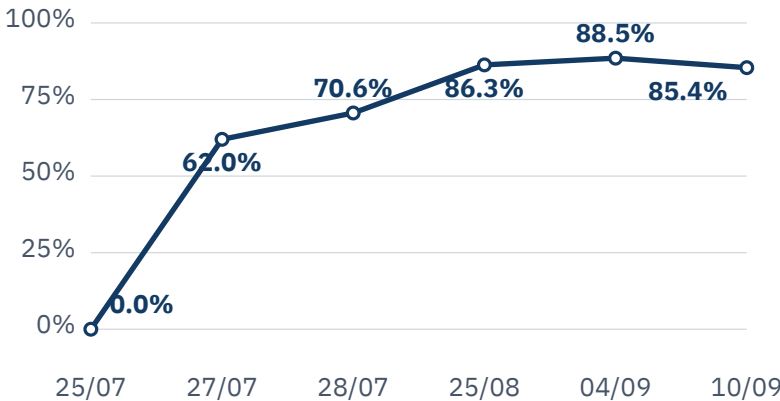

AVANCE POR PLANTA

|    |       |         |
|----|-------|---------|
| 1  | 86.4% | 84/100  |
| 2  | 88.5% | 105/122 |
| 3  | 86.4% | 105/125 |
| 4  | 82.4% | 100/125 |
| 5  | 82.4% | 80/100  |
| PB | 86.4% | 42/50   |

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Color según avance: ■ menos de 50 % ■ 50 a 79 % ■ 80 a 99 % ■ 100 %

|                      |        |         |                          |        |         |
|----------------------|--------|---------|--------------------------|--------|---------|
| Inicio de obra       | 100.0% | 25/25   | Infraestructura          | 100.0% | 125/125 |
| Instalación interior | 94.0%  | 141/150 | Recuperación tras Pladur | 100.0% | 25/25   |
| Conexiones           | 100.0% | 50/50   | Cierre técnico           | 67.6%  | 50/74   |
| Mecanismos           | 100.0% | 50/50   | Remates finales          | 0.0%   | 0/24    |
| Remates exteriores   | 60.0%  | 0/25    | Iluminación final        | 100.0% | 25/25   |
| Entrega              | 51.0%  | 25/49   |                          |        |         |

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 10 filas, en el orden de ejecución de la base.

| Tajo Sagarde / fase                                   | Avance | Hecho | Pend. |
|-------------------------------------------------------|--------|-------|-------|
| Termostatos<br>Instalación interior                   | 64%    | 16/25 | 9     |
| Cuarto técnico<br>Cierre técnico                      | 0%     | 0/24  | 24    |
| Placas y tapas<br>Remates finales                     | 0%     | 0/24  | 24    |
| Aplicques y enchufes de terraza<br>Remates exteriores | 60%    | 0/25  | 0     |
| Iluminación de rellanos / ZZCC<br>Entrega             | 0%     | 0/24  | 24    |

CONDICIONANTES

| Condicionante                                              | Afecta |
|------------------------------------------------------------|--------|
| Pintura de zonas comunes<br>Iluminación de rellanos / ZZCC | 24     |
| Pintura — segunda mano<br>Placas y tapas                   | 24     |

PRÓXIMOS FRENTES

| Próximo tajo Sagarde                                  | Uds. |
|-------------------------------------------------------|------|
| Termostatos<br>Instalación interior                   | 9    |
| Aplicques y enchufes de terraza<br>Remates exteriores | 25   |
