

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


OBRA: 2025 GERNIKA 32V | ÁMBITO: RESUMEN GENERAL (2 PORTALES/BLOQUES)
Datos: 28/09/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Kortezubi Bidea, Nº 1 - Amaur, Nº 7, 48300 Gernika-Lumo (Bizkaia)

95.4%	94.5%	818/866	3	2	0/4
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados	Cierre de expediente

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **95.4%** de avance estimado y un **94.5%** terminado; las viviendas avanzan +2.6 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 3 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 1 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

EVOLUCIÓN (VIVIENDAS)

Cada punto muestra el avance ponderado de la revisión; el marcador final distingue el total de obra cuando existe garaje.

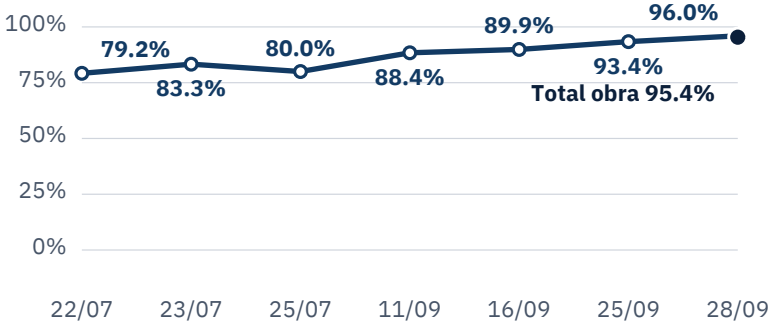

AVANCE POR BLOQUE

PORTAL 1	95.5% 379/400
PORTAL 2	96.5% 373/392
GARAJE	89.2% 66/74

CIERRE DE EXPEDIENTE

Ensayos instrumentales PENDIENTE	Inspección OCA PENDIENTE
CIE / Boletín eléctrico PENDIENTE	Libro del Edificio PENDIENTE

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Color según avance: ■ menos de 50 % ■ 50 a 79 % ■ 80 a 99 % ■ 100 %

Inicio de obra	100.0% 32/32	Infraestructura	100.0% 160/160
Instalación interior	100.0% 204/204	Recuperación tras Pladur	100.0% 32/32
Conexiones	100.0% 64/64	Cierre técnico	98.2% 84/88
Mecanismos	100.0% 64/64	Remates finales	87.5% 28/32
Remates exteriores	93.8% 27/32	Iluminación final	100.0% 32/32
Entrega	62.6% 37/64	Instalación interior garaje	100.0% 4/4
Equipos	84.4% 27/32	Equipos garaje	100.0% 12/12
Cuadros	83.3% 5/6	Cuartos técnicos garaje	100.0% 2/2
Remates garaje	66.7% 4/6		

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 10 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Cuarto técnico Cierre técnico	93%	20/24	0
Placas y tapas Remates finales	88%	28/32	4
Aplicques y enchufes de terraza Remates exteriores	94%	27/32	0
Casquillos y bombillas Entrega	25%	5/32	19
Colocación alumbrado fijo (recintos) Equipos	33%	2/6	4
Colocación luminarias de emergencia (recintos) Equipos	86%	6/7	1
Rotulación de cuadro propio Cuadros	0%	0/1	1
Alimentación de cuadro de puerta de acceso Remates garaje	0%	0/2	2

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura – segunda mano Casquillos y bombillas, Placas y tapas	11

PRÓXIMOS FRENTE

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Cuarto técnico Cierre técnico	4
Aplicques y enchufes de terraza Remates exteriores	5
Casquillos y bombillas Entrega	20

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO

OBRA: 2025 GERNIKA 32V | ÁMBITO: PORTAL 1


Datos: 28/09/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Kortezubi Bidea, N° 1 - Amaiur, N° 7, 48300 Gernika-Lumo (Bizkaia)

95.5%	94.8%	379/400	2	2
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **95.5%** de avance estimado y un **94.8%** terminado; avance de +3.3 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 2 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 1 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

EVOLUCIÓN DEL AVANCE

Cada punto muestra el avance ponderado de la revisión; el marcador final distingue el total de obra cuando existe garaje.

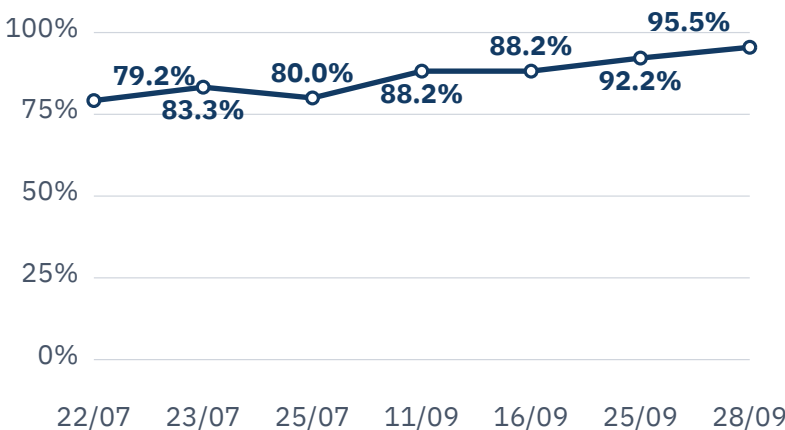

AVANCE POR PLANTA

1	96.6%	96/100
2	96.1%	95/100
3	97.8%	97/100
PB	91.6%	91/100

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Color según avance: ■ menos de 50 % ■ 50 a 79 % ■ 80 a 99 % ■ 100 %

Inicio de obra	100.0%	16/16	Infraestructura	100.0%	80/80
Instalación interior	100.0%	96/96	Recuperación tras Pladur	100.0%	16/16
Conexiones	100.0%	32/32	Cierre técnico	100.0%	48/48
Mecanismos	100.0%	32/32	Remates finales	75.0%	12/16
Remates exteriores	92.5%	13/16	Iluminación final	100.0%	16/16
Entrega	60.5%	18/32			

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 10 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Placas y tapas Remates finales	75%	12/16	4
Apliques y enchufes de terraza Remates exteriores	92%	13/16	0
Casquillos y bombillas Entrega	21%	2/16	10

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura — segunda mano Casquillos y bombillas, Placas y tapas	11

PRÓXIMOS FRENTES

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Apliques y enchufes de terraza Remates exteriores	3
Casquillos y bombillas Entrega	7

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


OBRA: 2025 GERNIKA 32V | ÁMBITO: PORTAL 2
Datos: 28/09/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Kortezubi Bidea, Nº 1 - Amaiur, Nº 7, 48300 Gernika-Lumo (Bizkaia)

96.5%	95.2%	373/392	3	0
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **96.5%** de avance estimado y un **95.2%** terminado; avance de +1.8 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 3 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 0 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

EVOLUCIÓN DEL AVANCE

Cada punto muestra el avance ponderado de la revisión; el marcador final distingue el total de obra cuando existe garaje.

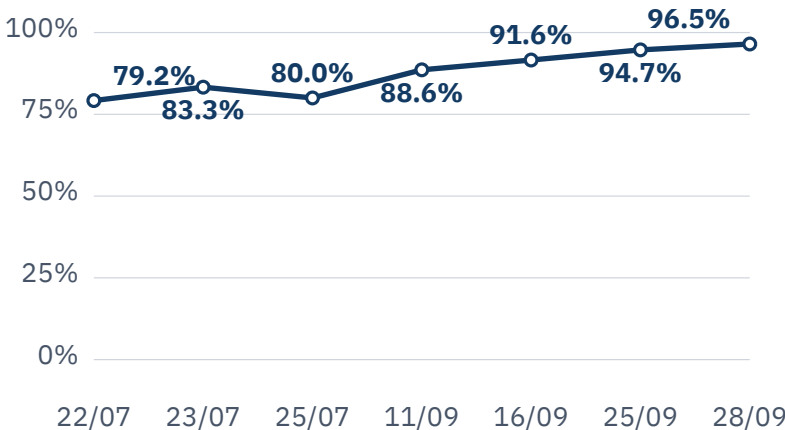

AVANCE POR PLANTA

1	97.6%	97/100
2	95.9%	90/96
3	96.9%	93/96
PB	95.6%	93/100

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Color según avance: ■ menos de 50 % ■ 50 a 79 % ■ 80 a 99 % ■ 100 %

Inicio de obra	100.0%	16/16	Infraestructura	100.0%	80/80
Instalación interior	100.0%	96/96	Recuperación tras Pladur	100.0%	16/16
Conexiones	100.0%	32/32	Cierre técnico	96.0%	36/40
Mecanismos	100.0%	32/32	Remates finales	100.0%	16/16
Remates exteriores	95.0%	14/16	Iluminación final	100.0%	16/16
Entrega	64.7%	19/32			

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 10 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Cuarto técnico Cierre técnico	80%	4/8	0
Aplicques y enchufes de terraza Remates exteriores	95%	14/16	0
Casquillos y bombillas Entrega	29%	3/16	9

CONDICIONANTES

No hay dependencias activas que frenen producción Sagarde.

PRÓXIMOS FRENTE

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Cuarto técnico Cierre técnico	4
Aplicques y enchufes de terraza Remates exteriores	2
Casquillos y bombillas Entrega	13

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO

OBRA: 2025 GERNIKA 32V | ÁMBITO: GARAJE
Datos: 28/09/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Kortezubi Bidea, Nº 1 - Amaiur, Nº 7, 48300 Gernika-Lumo (Bizkaia)

89.2%	89.2%	66/74	4	1
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **89.2%** de avance estimado y un **89.2%** terminado; avance de +2.8 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 4 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 1 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

Sin cuatro revisiones comparables; composición del último estado medido.



Terminado X: 66
En marcha M: 0
Iniciado /: 0
Pendiente: 8

DETALLE POR ZONA

Vestibulo / Portal 1 75% · 3/4	Vestibulo trasteros / Portal 2 75% · 3/4
Vestibulo1 / Portal 2 75% · 3/4	Instalaciones generales / vetibulo portal 1 81% · 13/16
Vial / portal 1 91% · 10/11	Vial /portal 2 91% · 10/11
Cuarto Achique / Bombas 100% · 8/8	Escalera 100% · 8/8
Rellano ESCALERA 100% · 4/4	Trasteros portal 1 100% · 2/2
Trasteros portal 2 100% · 2/2	

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: ■ menos de 50 % ■ 50 a 79 % ■ 80 a 99 % ■ 100 %

Instalación interior	100.0% 12/12	Instalación interior garaje	100.0% 4/4
Equipos	84.4% 27/32	Equipos garaje	100.0% 12/12
Cuadros	83.3% 5/6	Cuartos técnicos garaje	100.0% 2/2
Remates garaje	66.7% 4/6		

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 10 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Colocación alumbrado fijo (recintos) Equipos	33%	2/6	4
Colocación luminarias de emergencia (recintos) Equipos	86%	6/7	1
Rotulación de cuadro propio Cuadros	0%	0/1	1
Alimentación de cuadro de puerta de acceso Remates garaje	0%	0/2	2

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura (recintos) – 1ª mano Colocación alumbrado fijo (recintos)	3

PRÓXIMOS FRENTE

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Colocación alumbrado fijo (recintos) Equipos	1
Colocación luminarias de emergencia (recintos) Equipos	1
Rotulación de cuadro propio Cuadros	1
Alimentación de cuadro de puerta de acceso Remates garaje	2
