

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO

OBRA: 2025 GERNIKA 32V | ÁMBITO: RESUMEN GENERAL (2 PORTALES/BLOQUES)
Datos: 25/07/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Kortezubi Bidea, N° 1 - Amaiur, N° 7, 48300 Gernika-Lumo (Bizkaia).

RESUMEN EJECUTIVO

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **80.0%** de avance estimado y un **80.0%** terminado; avance de -3.3 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 2 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 2 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.




ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

No hay suficientes revisiones comparables para una tendencia fiable; se muestra la composición del último estado medido.



AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

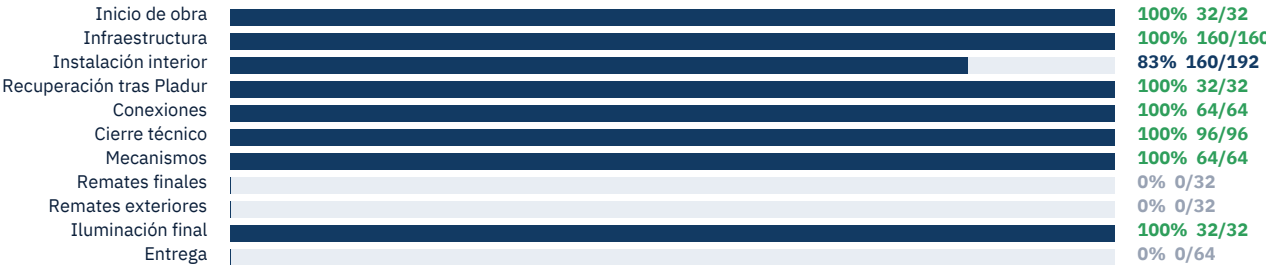

TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

Tajo Sagarde	Fase	Avance	Hecho	Pendiente
Termostatos	Instalación interior	0%	0/32	32
Placas y tapas	Remates finales	0%	0/32	32
Aplicques y enchufes de terraza	Remates exteriores	0%	0/32	32
Casquillos y bombillas	Entrega	0%	0/32	32
Iluminación de rellanos / ZZCC	Entrega	0%	0/32	32

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Termostatos Instalación interior	32
Aplicques y enchufes de terraza Remates exteriores	32

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Condicionante	Afecta
Pintura — segunda mano · OTRO GREMIO Casquillos y bombillas, Placas y tapas	64
Pintura de zonas comunes · OTRO GREMIO Iluminación de rellanos / ZZCC	32

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO

OBRA: 2025 GERNIKA 32V | ÁMBITO: BLOQUE: ZR1 — PORTAL: PORTAL 1
Datos: 25/07/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Kortezubi Bidea, N° 1 - Amaiur, N° 7, 48300 Gernika-Lumo (Bizkaia).

RESUMEN EJECUTIVO

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **80.0%** de avance estimado y un **80.0%** terminado; avance de -3.3 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 2 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 2 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

80.0%	80.0%	2	3	320 / 400
Avance eléctrico estimado	Terminado estricto (X)	Tajos Sagarde listos	Tajos condicionados	Celdas terminadas

ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

No hay suficientes revisiones comparables para una tendencia fiable; se muestra la composición del último estado medido.



Terminado X: 320 En marcha M: 0 Iniciado /: 0 Pendiente: 80

AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Inicio de obra	100% 16/16
Infraestructura	100% 80/80
Instalación interior	83% 80/96
Recuperación tras Pladur	100% 16/16
Conexiones	100% 32/32
Cierre técnico	100% 48/48
Mecanismos	100% 32/32
Remates finales	0% 0/16
Remates exteriores	0% 0/16
Iluminación final	100% 16/16
Entrega	0% 0/32

TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

Tajo Sagarde	Fase	Avance	Hecho	Pendiente
Termostatos	Instalación interior	0%	0/16	16
Placas y tapas	Remates finales	0%	0/16	16
Aplicques y enchufes de terraza	Remates exteriores	0%	0/16	16
Casquillos y bombillas	Entrega	0%	0/16	16
Iluminación de relanos / ZZCC	Entrega	0%	0/16	16

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Termostatos Instalación interior	16
Aplicques y enchufes de terraza Remates exteriores	16

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Condicionante	Afecta
Pintura — segunda mano · OTRO GREMIO Casquillos y bombillas, Placas y tapas	32
Pintura de zonas comunes · OTRO GREMIO Iluminación de relanos / ZZCC	16

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO

OBRA: 2025 GERNIKA 32V | ÁMBITO: BLOQUE: ZR1 — PORTAL: PORTAL 2
Datos: 25/07/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Kortezubi Bidea, Nº 1 - Amaiur, Nº 7, 48300 Gernika-Lumo (Bizkaia).

RESUMEN EJECUTIVO

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **80.0%** de avance estimado y un **80.0%** terminado; avance de -3.3 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 2 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 2 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

80.0%	80.0%	2	3	320 / 400
Avance eléctrico estimado	Terminado estricto (X)	Tajos Sagarde listos	Tajos condicionados	Celdas terminadas

ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

No hay suficientes revisiones comparables para una tendencia fiable; se muestra la composición del último estado medido.



Terminado X: 320 En marcha M: 0 Iniciado /: 0 Pendiente: 80

AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Inicio de obra	100% 16/16
Infraestructura	100% 80/80
Instalación interior	83% 80/96
Recuperación tras Pladur	100% 16/16
Conexiones	100% 32/32
Cierre técnico	100% 48/48
Mecanismos	100% 32/32
Remates finales	0% 0/16
Remates exteriores	0% 0/16
Iluminación final	100% 16/16
Entrega	0% 0/32

TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

Tajo Sagarde	Fase	Avance	Hecho	Pendiente
Termostatos	Instalación interior	0%	0/16	16
Placas y tapas	Remates finales	0%	0/16	16
Aplicques y enchufes de terraza	Remates exteriores	0%	0/16	16
Casquillos y bombillas	Entrega	0%	0/16	16
Iluminación de relanos / ZZCC	Entrega	0%	0/16	16

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Termostatos	16
Instalación interior	
Aplicques y enchufes de terraza	16
Remates exteriores	

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Condicionante	Afecta
Pintura — segunda mano · OTRO GREMIO	32
Casquillos y bombillas, Placas y tapas	
Pintura de zonas comunes · OTRO GREMIO	16
Iluminación de relanos / ZZCC	

CIERRE DE EXPEDIENTE

HITO	ESTADO	FECHA	NOTA
Ensayos instrumentales	PENDIENTE	—	—
Inspección OCA	PENDIENTE	—	—
CIE / Boletín eléctrico	PENDIENTE	—	—
Libro del Edificio	PENDIENTE	—	—
