


RESUMEN EJECUTIVO

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **84.1%** de avance estimado y un **80.9%** terminado; avance de +7.0 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 8 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 4 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

84.1% Avance eléctrico estimado	80.9% Terminado estricto (X)	8 Tajos Sagarde listos	5 Tajos condicionados	1252 / 1547 Celdas terminadas
---	--	----------------------------------	---------------------------------	---

EVOLUCIÓN DEL AVANCE ELÉCTRICO SAGARDE

Avance ponderado real de las últimas revisiones disponibles; cada punto usa únicamente tajos propios identificados en la base.



AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Inicio de obra	100% 62/62
Infraestructura	100% 310/310
Instalación interior	96% 357/372
Recuperación tras Pladur	99% 60/62
Conexiones	97% 120/124
Cierre técnico	66% 119/185
Mecanismos	99% 121/124
Remates finales	0% 0/61
Remates exteriores	51% 0/62
Iluminación final	99% 60/62
Entrega	44% 43/123

TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

Tajo Sagarde	Fase	Avance	Hecho	Pendiente
Termostatos	Instalación interior	76%	47/62	15
Doblar cajas	Recuperación tras Pladur	99%	60/62	0
Telembornado	Conexiones	94%	58/62	4
Cuadro mecanizado	Cierre técnico	97%	57/62	0
Cuarto técnico	Cierre técnico	0%	0/61	61
Telemecanizado	Mecanismos	98%	59/62	0
Placas y tapas	Remates finales	0%	0/61	61
Aplicques y enchufes de terraza	Remates exteriores	51%	0/62	9

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Termostatos Instalación interior	15
Doblar cajas Recuperación tras Pladur	2
Telembornado Conexiones	4
Cuadro mecanizado Cierre técnico	5
Cuarto técnico Cierre técnico	61

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Condicionante	Afecta
Pintura de zonas comunes · OTRO GREMIO Iluminación de rellanos / ZZCC	61
Pintura — segunda mano · OTRO GREMIO Casquillos y bombillas, Placas y tapas	56
Pintura — primera mano · OTRO GREMIO Telemecanizado	3
Techos de zonas comunes · OTRO GREMIO Agujeros de iluminación en ZZCC	2
Cuadro mecanizado · CADENA SAGARDE Placas y tapas	5


RESUMEN EJECUTIVO

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **84.7%** de avance estimado y un **80.0%** terminado; avance de +3.7 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 4 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 3 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.




EVOLUCIÓN DEL AVANCE ELÉCTRICO SAGARDE

Avance ponderado real de las últimas revisiones disponibles; cada punto usa únicamente tajos propios identificados en la base.



AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

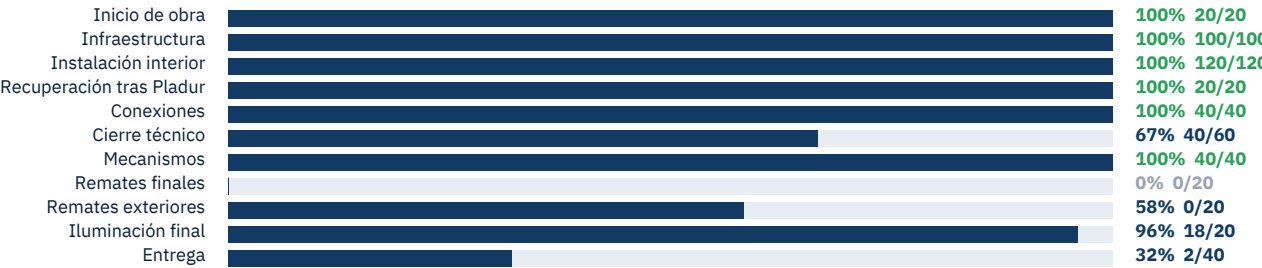

TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

Tajo Sagarde	Fase	Avance	Hecho	Pendiente
Cuarto técnico	Cierre técnico	0%	0/20	20
Placas y tapas	Remates finales	0%	0/20	20
Apliques y enchufes de terraza	Remates exteriores	58%	0/20	0
Agujeros de iluminación en ZZCC	Iluminación final	96%	18/20	0
Casquillos y bombillas	Entrega	64%	2/20	0
Iluminación de rellanos / ZZCC	Entrega	0%	0/20	20

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Cuarto técnico Cierre técnico	20
Placas y tapas Remates finales	12
Apliques y enchufes de terraza Remates exteriores	20
Casquillos y bombillas Entrega	12

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Condicionante	Afecta
Pintura de zonas comunes · OTRO GREMIO Iluminación de rellanos / ZZCC	20
Pintura — segunda mano · OTRO GREMIO Casquillos y bombillas, Placas y tapas	14
Techos de zonas comunes · OTRO GREMIO Agujeros de iluminación en ZZCC	2


RESUMEN EJECUTIVO

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **84.7%** de avance estimado y un **83.5%** terminado; avance de +2.4 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 3 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 2 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

84.7% Avance eléctrico estimado	83.5% Terminado estricto (X)	3 Tajos Sagarde listos	3 Tajos condicionados	355 / 425 Celdas terminadas
---	--	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

EVOLUCIÓN DEL AVANCE ELÉCTRICO SAGARDE

Avance ponderado real de las últimas revisiones disponibles; cada punto usa únicamente tajos propios identificados en la base.



AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Inicio de obra	100% 17/17
Infraestructura	100% 85/85
Instalación interior	99% 101/102
Recuperación tras Pladur	100% 17/17
Conexiones	100% 34/34
Cierre técnico	67% 34/51
Mecanismos	100% 34/34
Remates finales	0% 0/17
Remates exteriores	28% 0/17
Iluminación final	100% 17/17
Entrega	47% 16/34

TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

Tajo Sagarde	Fase	Avance	Hecho	Pendiente
Termostatos	Instalación interior	94%	16/17	1
Cuarto técnico	Cierre técnico	0%	0/17	17
Placas y tapas	Remates finales	0%	0/17	17
Aplicques y enchufes de terraza	Remates exteriores	28%	0/17	9
Casquillos y bombillas	Entrega	94%	16/17	1
Iluminación de rellanos / ZZCC	Entrega	0%	0/17	17

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Termostatos Instalación interior	1
Cuarto técnico Cierre técnico	17
Aplicques y enchufes de terraza Remates exteriores	17

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Condicionante	Afecta
Pintura — segunda mano · OTRO GREMIO Casquillos y bombillas, Placas y tapas	18
Pintura de zonas comunes · OTRO GREMIO Iluminación de rellanos / ZZCC	17

RESUMEN EJECUTIVO

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **83.3%** de avance estimado y un **79.9%** terminado; avance de +12.7 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 6 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 3 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

83.3% Avance eléctrico estimado	79.9% Terminado estricto (X)	6 Tajos Sagarde listos	3 Tajos condicionados	497 / 622 Celdas terminadas
---	--	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

EVOLUCIÓN DEL AVANCE ELÉCTRICO SAGARDE

Avance ponderado real de las últimas revisiones disponibles; cada punto usa únicamente tajos propios identificados en la base.



AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Inicio de obra	100% 25/25
Infraestructura	100% 125/125
Instalación interior	91% 136/150
Recuperación tras Pladur	97% 23/25
Conexiones	92% 46/50
Cierre técnico	65% 45/74
Mecanismos	98% 47/50
Remates finales	0% 0/24
Remates exteriores	60% 0/25
Iluminación final	100% 25/25
Entrega	51% 25/49

TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

Tajo Sagarde	Fase	Avance	Hecho	Pendiente
Termostatos	Instalación interior	44%	11/25	14
Doblar cajas	Recuperación tras Pladur	97%	23/25	0
Telembornado	Conexiones	84%	21/25	4
Cuadro mecanizado	Cierre técnico	92%	20/25	0
Cuarto técnico	Cierre técnico	0%	0/24	24
Telemecanizado	Mecanismos	95%	22/25	0
Placas y tapas	Remates finales	0%	0/24	24
Aplicques y enchufes de terraza	Remates exteriores	60%	0/25	0

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Termostatos Instalación interior	14
Doblar cajas Recuperación tras Pladur	2
Telembornado Conexiones	4
Cuadro mecanizado Cierre técnico	5
Cuarto técnico Cierre técnico	24

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Condicionante	Afecta
Pintura de zonas comunes · OTRO GREMIO Iluminación de rellanos / ZZCC	24
Pintura — segunda mano · OTRO GREMIO Placas y tapas	24
Pintura — primera mano · OTRO GREMIO Telemecanizado	3
Cuadro mecanizado · CADENA SAGARDE Placas y tapas	5
Telemecanizado · CADENA SAGARDE Placas y tapas	3

CIERRE DE EXPEDIENTE

HITO	ESTADO	FECHA	NOTA
Ensayos instrumentales	PENDIENTE	—	—
Inspección OCA	PENDIENTE	—	—
CIE / Boletín eléctrico	PENDIENTE	—	—
Libro del Edificio	PENDIENTE	—	—
