


RESUMEN EJECUTIVO

**Situación eléctrica:** Sagarde alcanza un **84.9%** de avance estimado y un **82.0%** terminado; avance de +0.9 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 7 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 2 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

|                                           |                                        |                                  |                                 |                                         |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>84.9%</b><br>Avance eléctrico estimado | <b>82.0%</b><br>Terminado estricto (X) | <b>7</b><br>Tajos Sagarde listos | <b>3</b><br>Tajos condicionados | <b>1268 / 1547</b><br>Celdas terminadas |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|

EVOLUCIÓN DEL AVANCE ELÉCTRICO SAGARDE

Avance ponderado real de las últimas revisiones disponibles; cada punto usa únicamente tajos propios identificados en la base.



AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Inicio de obra           | 100% 62/62   |
| Infraestructura          | 100% 310/310 |
| Instalación interior     | 97% 362/372  |
| Recuperación tras Pladur | 100% 62/62   |
| Conexiones               | 100% 124/124 |
| Cierre técnico           | 67% 124/185  |
| Mecanismos               | 99% 121/124  |
| Remates finales          | 0% 0/61      |
| Remates exteriores       | 51% 0/62     |
| Iluminación final        | 99% 60/62    |
| Entrega                  | 44% 43/123   |

TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

| Tajo Sagarde                    | Fase                 | Avance | Hecho | Pendiente |
|---------------------------------|----------------------|--------|-------|-----------|
| Termostatos                     | Instalación interior | 84%    | 52/62 | 10        |
| Cuarto técnico                  | Cierre técnico       | 0%     | 0/61  | 61        |
| Telemecanizado                  | Mecanismos           | 98%    | 59/62 | 0         |
| Placas y tapas                  | Remates finales      | 0%     | 0/61  | 61        |
| Aplicques y enchufes de terraza | Remates exteriores   | 51%    | 0/62  | 9         |
| Agujeros de iluminación en ZZCC | Iluminación final    | 99%    | 60/62 | 0         |
| Casquillos y bombillas          | Entrega              | 87%    | 43/62 | 1         |
| Iluminación de rellanos / ZZCC  | Entrega              | 0%     | 0/61  | 61        |

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

| Próximo tajo Sagarde                                  | Uds. |
|-------------------------------------------------------|------|
| Termostatos<br>Instalación interior                   | 10   |
| Cuarto técnico<br>Cierre técnico                      | 61   |
| Telemecanizado<br>Mecanismos                          | 3    |
| Placas y tapas<br>Remates finales                     | 20   |
| Aplicques y enchufes de terraza<br>Remates exteriores | 62   |

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

| Condicionante                                                                  | Afecta |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Pintura de zonas comunes · OTRO GREMIO<br>Iluminación de rellanos / ZZCC       | 61     |
| Pintura — segunda mano · OTRO GREMIO<br>Casquillos y bombillas, Placas y tapas | 42     |
| Telemecanizado · CADENA SAGARDE<br>Placas y tapas                              | 3      |


RESUMEN EJECUTIVO

**Situación eléctrica:** Sagarde alcanza un **84.7%** de avance estimado y un **80.0%** terminado; avance de +0.0 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 5 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 1 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.




EVOLUCIÓN DEL AVANCE ELÉCTRICO SAGARDE

Avance ponderado real de las últimas revisiones disponibles; cada punto usa únicamente tajos propios identificados en la base.



AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

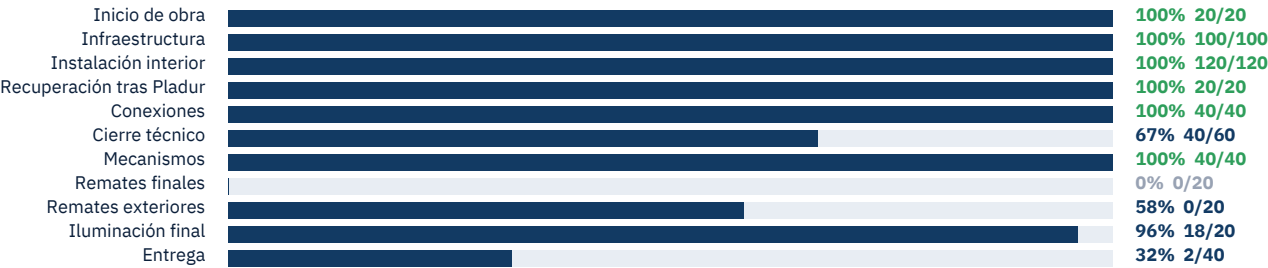

TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

| Tajo Sagarde                    | Fase               | Avance | Hecho | Pendiente |
|---------------------------------|--------------------|--------|-------|-----------|
| Cuarto técnico                  | Cierre técnico     | 0%     | 0/20  | 20        |
| Placas y tapas                  | Remates finales    | 0%     | 0/20  | 20        |
| Apliques y enchufes de terraza  | Remates exteriores | 58%    | 0/20  | 0         |
| Agujeros de iluminación en ZZCC | Iluminación final  | 96%    | 18/20 | 0         |
| Casquillos y bombillas          | Entrega            | 64%    | 2/20  | 0         |
| Iluminación de rellanos / ZZCC  | Entrega            | 0%     | 0/20  | 20        |

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

| Próximo tajo Sagarde                                 | Uds. |
|------------------------------------------------------|------|
| Cuarto técnico<br>Cierre técnico                     | 20   |
| Placas y tapas<br>Remates finales                    | 20   |
| Apliques y enchufes de terraza<br>Remates exteriores | 20   |
| Agujeros de iluminación en ZZCC<br>Iluminación final | 2    |
| Casquillos y bombillas<br>Entrega                    | 18   |

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

| Condicionante                                                            | Afecta |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| Pintura de zonas comunes - OTRO GREMIO<br>Iluminación de rellanos / ZZCC | 20     |


RESUMEN EJECUTIVO

**Situación eléctrica:** Sagarde alcanza un **84.7%** de avance estimado y un **83.5%** terminado; avance de +0.0 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 3 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 2 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

|                                           |                                        |                                  |                                 |                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>84.7%</b><br>Avance eléctrico estimado | <b>83.5%</b><br>Terminado estricto (X) | <b>3</b><br>Tajos Sagarde listos | <b>3</b><br>Tajos condicionados | <b>355 / 425</b><br>Celdas terminadas |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|

EVOLUCIÓN DEL AVANCE ELÉCTRICO SAGARDE

Avance ponderado real de las últimas revisiones disponibles; cada punto usa únicamente tajos propios identificados en la base.



AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Inicio de obra           | 100% 17/17  |
| Infraestructura          | 100% 85/85  |
| Instalación interior     | 99% 101/102 |
| Recuperación tras Pladur | 100% 17/17  |
| Conexiones               | 100% 34/34  |
| Cierre técnico           | 67% 34/51   |
| Mecanismos               | 100% 34/34  |
| Remates finales          | 0% 0/17     |
| Remates exteriores       | 28% 0/17    |
| Iluminación final        | 100% 17/17  |
| Entrega                  | 47% 16/34   |

TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

| Tajo Sagarde                    | Fase                 | Avance | Hecho | Pendiente |
|---------------------------------|----------------------|--------|-------|-----------|
| Termostatos                     | Instalación interior | 94%    | 16/17 | 1         |
| Cuarto técnico                  | Cierre técnico       | 0%     | 0/17  | 17        |
| Placas y tapas                  | Remates finales      | 0%     | 0/17  | 17        |
| Aplicques y enchufes de terraza | Remates exteriores   | 28%    | 0/17  | 9         |
| Casquillos y bombillas          | Entrega              | 94%    | 16/17 | 1         |
| Iluminación de rellanos / ZZCC  | Entrega              | 0%     | 0/17  | 17        |

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

| Próximo tajo Sagarde                                  | Uds. |
|-------------------------------------------------------|------|
| Termostatos<br>Instalación interior                   | 1    |
| Cuarto técnico<br>Cierre técnico                      | 17   |
| Aplicques y enchufes de terraza<br>Remates exteriores | 17   |

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

| Condicionante                                                                  | Afecta |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Pintura — segunda mano · OTRO GREMIO<br>Casquillos y bombillas, Placas y tapas | 18     |
| Pintura de zonas comunes · OTRO GREMIO<br>Iluminación de rellanos / ZZCC       | 17     |


**RESUMEN EJECUTIVO**

**Situación eléctrica:** Sagarde alcanza un **85.2%** de avance estimado y un **82.5%** terminado; avance de +2.3 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 4 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 2 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

|                                           |                                        |                                  |                                 |                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>85.2%</b><br>Avance eléctrico estimado | <b>82.5%</b><br>Terminado estricto (X) | <b>4</b><br>Tajos Sagarde listos | <b>2</b><br>Tajos condicionados | <b>513 / 622</b><br>Celdas terminadas |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|

**EVOLUCIÓN DEL AVANCE ELÉCTRICO SAGARDE**

Avance ponderado real de las últimas revisiones disponibles; cada punto usa únicamente tajos propios identificados en la base.



**AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE**

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Inicio de obra           | 100% 25/25   |
| Infraestructura          | 100% 125/125 |
| Instalación interior     | 94% 141/150  |
| Recuperación tras Pladur | 100% 25/25   |
| Conexiones               | 100% 50/50   |
| Cierre técnico           | 68% 50/74    |
| Mecanismos               | 98% 47/50    |
| Remates finales          | 0% 0/24      |
| Remates exteriores       | 60% 0/25     |
| Iluminación final        | 100% 25/25   |
| Entrega                  | 51% 25/49    |

**TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN**

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

| Tajo Sagarde                    | Fase                 | Avance | Hecho | Pendiente |
|---------------------------------|----------------------|--------|-------|-----------|
| Termostatos                     | Instalación interior | 64%    | 16/25 | 9         |
| Cuarto técnico                  | Cierre técnico       | 0%     | 0/24  | 24        |
| Telemecanizado                  | Mecanismos           | 95%    | 22/25 | 0         |
| Placas y tapas                  | Remates finales      | 0%     | 0/24  | 24        |
| Aplicques y enchufes de terraza | Remates exteriores   | 60%    | 0/25  | 0         |
| Iluminación de rellanos / ZZCC  | Entrega              | 0%     | 0/24  | 24        |

**PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN**

| Próximo tajo Sagarde                                  | Uds. |
|-------------------------------------------------------|------|
| Termostatos<br>Instalación interior                   | 9    |
| Cuarto técnico<br>Cierre técnico                      | 24   |
| Telemecanizado<br>Mecanismos                          | 3    |
| Aplicques y enchufes de terraza<br>Remates exteriores | 25   |

**CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE**

| Condicionante                                                            | Afecta |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| Pintura de zonas comunes · OTRO GREMIO<br>Iluminación de rellanos / ZZCC | 24     |
| Pintura — segunda mano · OTRO GREMIO<br>Placas y tapas                   | 24     |
| Telemecanizado · CADENA SAGARDE<br>Placas y tapas                        | 3      |

## CIERRE DE EXPEDIENTE

| HITO                    | ESTADO    | FECHA | NOTA |
|-------------------------|-----------|-------|------|
| Ensayos instrumentales  | PENDIENTE | —     | —    |
| Inspección OCA          | PENDIENTE | —     | —    |
| CIE / Boletín eléctrico | PENDIENTE | —     | —    |
| Libro del Edificio      | PENDIENTE | —     | —    |
