INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


OBRA: 2025 GERNIKA 32V | **ÁMBITO:** RESUMEN GENERAL (2 PORTALES/BLOQUES)
Datos: 05/10/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Kortezubi Bidea, Nº 1 - Amaiur, Nº 7, 48300 Gernika-Lumo (Bizkaia)

96.1%	95.1%	827/870	3	2	0/4
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados	Cierre de expediente

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **96.1%** de avance estimado y un **95.1%** terminado; las viviendas avanzan +0.5 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 3 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 1 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

EVOLUCIÓN (VIVIENDAS)

Cada punto muestra el avance ponderado de la revisión; el marcador final distingue el total de obra cuando existe garaje.

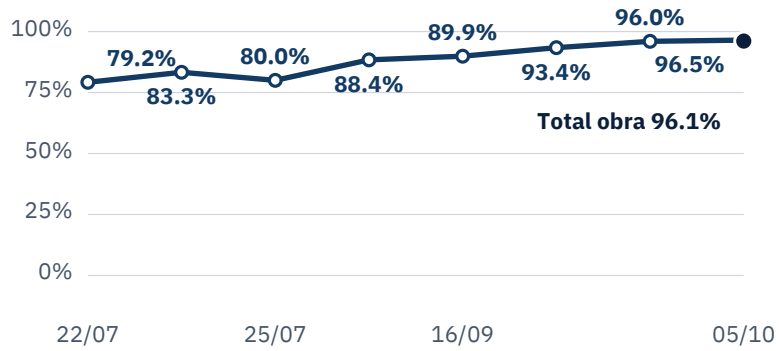

AVANCE POR BLOQUE

PORTAL 1	96.4% 382/400
PORTAL 2	96.5% 373/392
GARAJE	92.3% 72/78

CIERRE DE EXPEDIENTE

Ensayos instrumentales PENDIENTE	**Inspección OCA** PENDIENTE
CIE / Boletín eléctrico PENDIENTE	**Libro del Edificio** PENDIENTE

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % | 50 a 79 % | 80 a 99 % | 100 %

Inicio de obra	100.0% 32/32	Infraestructura	100.0% 160/160
Instalación interior	100.0% 204/204	Recuperación tras Pladur	100.0% 32/32
Conexiones	100.0% 64/64	Cierre técnico	98.2% 84/88
Mecanismos	100.0% 64/64	Remates finales	98.8% 31/32
Remates exteriores	93.8% 27/32	Iluminación final	100.0% 32/32
Entrega	62.6% 37/64	Instalación interior garaje	100.0% 4/4
Equipos	86.1% 31/36	Equipos garaje	100.0% 12/12
Cuadros	83.3% 5/6	Cuartos técnicos garaje	100.0% 2/2
Remates garaje	100.0% 6/6		

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 10 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Cuarto técnico Cierre técnico	93%	20/24	0
Placas y tapas Remates finales	99%	31/32	0
Apliques y enchufes de terraza Remates exteriores	94%	27/32	0
Casquillos y bombillas Entrega	25%	5/32	19
Colocación alumbrado fijo (recintos) Equipos	50%	4/8	4
Colocación luminarias de emergencia (recintos) Equipos	86%	6/7	1
Rotulación de cuadro propio Cuadros	0%	0/1	1

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura — segunda mano Casquillos y bombillas, Placas y tapas	8

PRÓXIMOS FRENTES

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Cuarto técnico Cierre técnico	4
Apliques y enchufes de terraza Remates exteriores	5
Casquillos y bombillas Entrega	20

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


OBRA: 2025 GERNIKA 32V | **ÁMBITO:** PORTAL 1
Datos: 05/10/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Kortezubi Bidea, Nº 1 - Amaiur, Nº 7, 48300 Gernika-Lumo (Bizkaia)

96.4%	95.5%	382/400	2	2
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados


Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **96.4%** de avance estimado y un **95.5%** terminado; avance de +0.9 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 2 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 1 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

EVOLUCIÓN DEL AVANCE

Cada punto muestra el avance ponderado de la revisión; el marcador final distingue el total de obra cuando existe garaje.

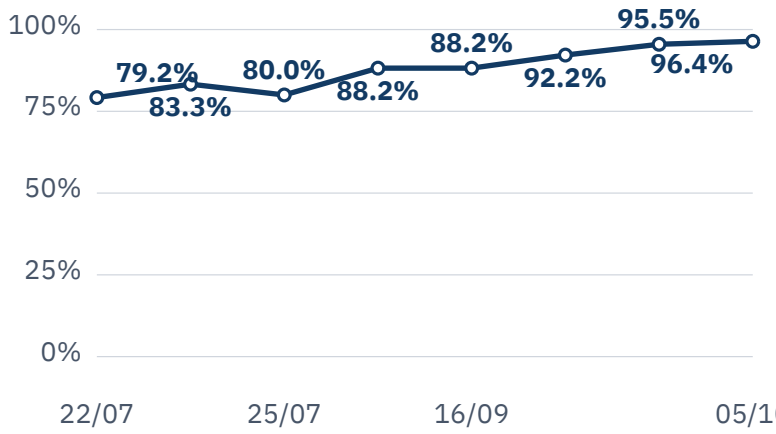

AVANCE POR PLANTA

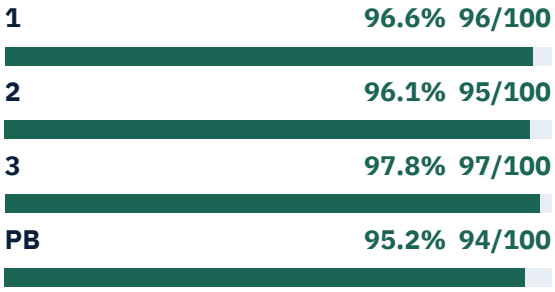

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % | 50 a 79 % | 80 a 99 % | 100 %

Inicio de obra	100.0%	16/16	
Instalación interior	100.0%	96/96	
Conexiones	100.0%	32/32	
Mecanismos	100.0%	32/32	
Remates exteriores	92.5%	13/16	
Entrega	60.5%	18/32	
Infraestructura	100.0%	80/80	
Recuperación tras Pladur	100.0%	16/16	
Cierre técnico	100.0%	48/48	
Remates finales	97.5%	15/16	
Iluminación final	100.0%	16/16	

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 10 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Placas y tapas Remates finales	98%	15/16	0
Apliques y enchufes de terraza Remates exteriores	92%	13/16	0
Casquillos y bombillas Entrega	21%	2/16	10

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura — segunda mano Casquillos y bombillas, Placas y tapas	8

PRÓXIMOS FRENTES

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Apliques y enchufes de terraza Remates exteriores	3
Casquillos y bombillas Entrega	7

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


OBRA: 2025 GERNIKA 32V | **ÁMBITO:** PORTAL 2
Datos: 05/10/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Kortezubi Bidea, Nº 1 - Amaiur, Nº 7, 48300 Gernika-Lumo (Bizkaia)

96.5%	95.2%	373/392	3	0
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados


Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **96.5%** de avance estimado y un **95.2%** terminado; avance de +0.0 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 3 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 0 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

EVOLUCIÓN DEL AVANCE

Cada punto muestra el avance ponderado de la revisión; el marcador final distingue el total de obra cuando existe garaje.

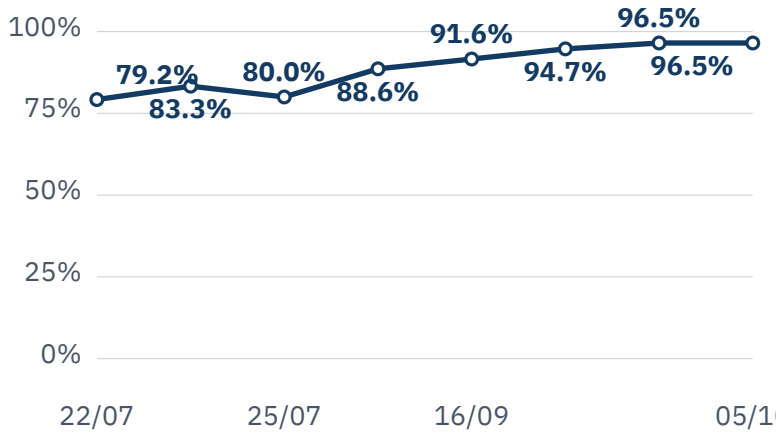

AVANCE POR PLANTA

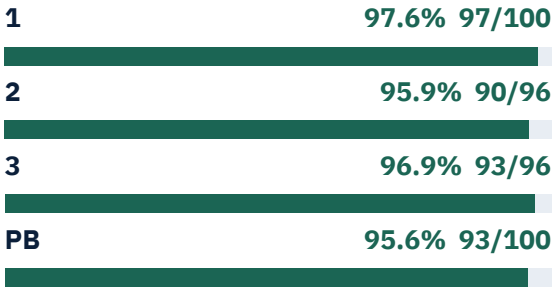

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % | 50 a 79 % | 80 a 99 % | 100 %

Inicio de obra	100.0%	16/16	
Instalación interior	100.0%	96/96	
Conexiones	100.0%	32/32	
Mecanismos	100.0%	32/32	
Remates exteriores	95.0%	14/16	
Entrega	64.7%	19/32	
Infraestructura	100.0%	80/80	
Recuperación tras Pladur	100.0%	16/16	
Cierre técnico	96.0%	36/40	
Remates finales	100.0%	16/16	
Iluminación final	100.0%	16/16	

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 10 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Cuarto técnico Cierre técnico	80%	4/8	0
Apliques y enchufes de terraza Remates exteriores	95%	14/16	0
Casquillos y bombillas Entrega	29%	3/16	9

CONDICIONANTES

No hay dependencias activas que frenen producción Sagarde.

PRÓXIMOS FRENTES

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Cuarto técnico Cierre técnico	4
Apliques y enchufes de terraza Remates exteriores	2
Casquillos y bombillas Entrega	13

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO

OBRA: 2025 GERNIKA 32V | **ÁMBITO:** GARAJE
Datos: 05/10/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Kortezubi Bidea, Nº 1 - Amaiur, Nº 7, 48300 Gernika-Lumo (Bizkaia)

92.3%	92.3%	72/78	3	1
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **92.3%** de avance estimado y un **92.3%** terminado; avance de +3.7 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 3 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 1 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

Sin cuatro revisiones comparables; composición del último estado medido.



DETALLE POR ZONA

- **Vestibulo / Portal 1** — 75% · 3/4
- **Vestibulo trasteros / Portal 2** — 75% · 3/4
- **Vestibulo1 / Portal 2** — 75% · 3/4
- **Instalaciones generales / vetibulo portal 1** — 81% · 13/16
- **Cuarto Achique / Bombas** — 100% · 8/8
- **Escalera** — 100% · 8/8
- **Rellano ESCALERA** — 100% · 4/4
- **Trasteros portal 1** — 100% · 4/4
- **Trasteros portal 2** — 100% · 4/4
- **Vial / portal 1** — 100% · 11/11
- **Vial /portal 2** — 100% · 11/11

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % | 50 a 79 % | 80 a 99 % | 100 %

Instalación interior	100.0% 12/12	Instalación interior garaje	100.0% 4/4
Equipos	86.1% 31/36	Equipos garaje	100.0% 12/12
Cuadros	83.3% 5/6	Cuartos técnicos garaje	100.0% 2/2
Remates garaje	100.0% 6/6		

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 10 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Colocación alumbrado fijo (recintos) Equipos	50%	4/8	4
Colocación luminarias de emergencia (recintos) Equipos	86%	6/7	1
Rotulación de cuadro propio Cuadros	0%	0/1	1

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura (recintos) — 1ª mano Colocación alumbrado fijo (recintos)	3

PRÓXIMOS FRENTES

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Colocación alumbrado fijo (recintos) Equipos	1
Colocación luminarias de emergencia (recintos) Equipos	1
Rotulación de cuadro propio Cuadros	1

Fuente: base viva de la obra + catálogo de tajos y dependencias · Datos 05/10/2026 · Generado 01/11/2026 23:24

Montajes Eléctricos Sagarde, S.L.
