# INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


**OBRA:** 2025 GERNIKA 32V | **ÁMBITO:** RESUMEN GENERAL (2 PORTALES/BLOQUES)
**Datos:** 05/11/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Kortezubi Bidea, Nº 1 - Amaiur, Nº 7, 48300 Gernika-Lumo (Bizkaia)

| 96.8% | 96.1% | 836/870 | 3 | 0 | 0/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Avance estimado | Terminado estricto | Celdas terminadas | Tajos listos | Tajos condicionados | Cierre de expediente |

**Situación eléctrica:** Sagarde alcanza un **96.8%** de avance estimado y un **96.1%** terminado; las viviendas avanzan +0.1 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 3 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 0 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

## EVOLUCIÓN (VIVIENDAS)

Cada punto muestra el avance ponderado de la revisión; el marcador final distingue el total de obra cuando existe garaje.

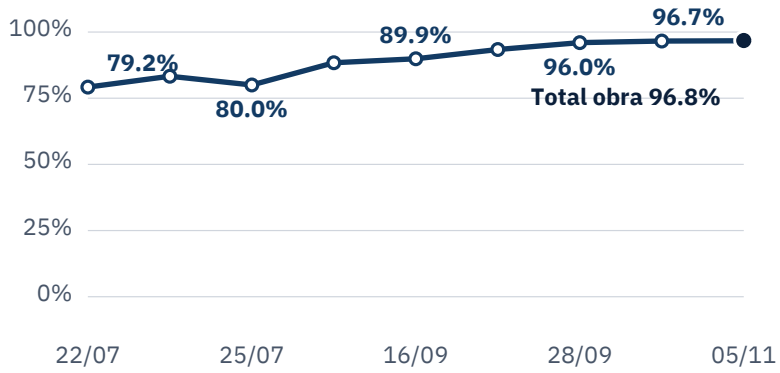


## AVANCE POR BLOQUE

| | | |
|---|---|---|
| **PORTAL 1** | 96.7% | 385/400 |
| **PORTAL 2** | 96.7% | 375/392 |
| **GARAJE** | 97.4% | 76/78 |

## CIERRE DE EXPEDIENTE

| | |
|---|---|
| **Ensayos instrumentales** PENDIENTE | **Inspección OCA** PENDIENTE |
| **CIE / Boletín eléctrico** PENDIENTE | **Libro del Edificio** PENDIENTE |

## FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % | 50 a 79 % | 80 a 99 % | 100 %

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inicio de obra | 100.0% | 32/32 | |
| Instalación interior | 100.0% | 204/204 | |
| Conexiones | 100.0% | 64/64 | |
| Mecanismos | 100.0% | 64/64 | |
| Remates exteriores | 98.8% | 31/32 | |
| Entrega | 62.6% | 37/64 | |
| Equipos | 97.2% | 35/36 | |
| Cuadros | 83.3% | 5/6 | |
| Remates garaje | 100.0% | 6/6 | |
| Infraestructura | 100.0% | 160/160 | |
| Recuperación tras Pladur | 100.0% | 32/32 | |
| Cierre técnico | 98.2% | 84/88 | |
| Remates finales | 100.0% | 32/32 | |
| Iluminación final | 100.0% | 32/32 | |
| Instalación interior garaje | 100.0% | 4/4 | |
| Equipos garaje | 100.0% | 12/12 | |
| Cuartos técnicos garaje | 100.0% | 2/2 | |

## TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 10 filas, en el orden de ejecución de la base.

| Tajo Sagarde / fase | Avance | Hecho | Pend. |
|---|---|---|---|
| **Cuarto técnico** Cierre técnico | 93% | 20/24 | 0 |
| **Apliques y enchufes de terraza** Remates exteriores | 99% | 31/32 | 0 |
| **Casquillos y bombillas** Entrega | 25% | 5/32 | 19 |
| **Colocación luminarias de emergencia (recintos)** Equipos | 86% | 6/7 | 1 |
| **Rotulación de cuadro propio** Cuadros | 0% | 0/1 | 1 |

## CONDICIONANTES

*No hay dependencias activas que frenen producción Sagarde.*

## PRÓXIMOS FRENTES

| Próximo tajo Sagarde | Uds. |
|---|---|
| **Cuarto técnico** Cierre técnico | 4 |
| **Apliques y enchufes de terraza** Remates exteriores | 1 |
| **Casquillos y bombillas** Entrega | 27 |

Fuente: base viva de la obra + catálogo de tajos y dependencias · Datos 05/11/2026 · Generado 05/11/2026 12:38

**Montajes Eléctricos Sagarde, S.L.**

# INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


**OBRA:** 2025 GERNIKA 32V | **ÁMBITO:** PORTAL 1
**Datos:** 05/11/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Kortezubi Bidea, Nº 1 - Amaiur, Nº 7, 48300 Gernika-Lumo (Bizkaia)

| 96.7% | 96.2% | 385/400 | 2 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Avance estimado | Terminado estricto | Celdas terminadas | Tajos listos | Tajos condicionados |


**Situación eléctrica:** Sagarde alcanza un **96.7%** de avance estimado y un **96.2%** terminado; avance de +0.4 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 2 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 0 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

## EVOLUCIÓN DEL AVANCE

Cada punto muestra el avance ponderado de la revisión; el marcador final distingue el total de obra cuando existe garaje.

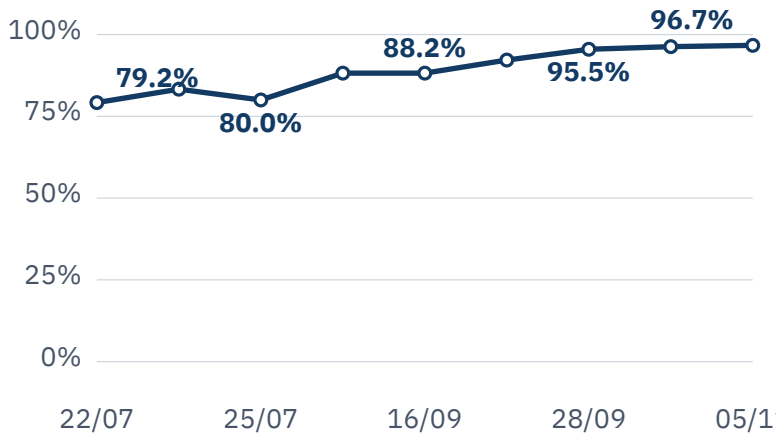


## AVANCE POR PLANTA

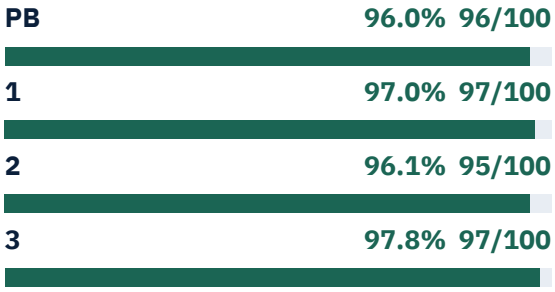


## FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % | 50 a 79 % | 80 a 99 % | 100 %

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inicio de obra | 100.0% | 16/16 | |
| Instalación interior | 100.0% | 96/96 | |
| Conexiones | 100.0% | 32/32 | |
| Mecanismos | 100.0% | 32/32 | |
| Remates exteriores | 97.5% | 15/16 | |
| Entrega | 60.5% | 18/32 | |
| Infraestructura | 100.0% | 80/80 | |
| Recuperación tras Pladur | 100.0% | 16/16 | |
| Cierre técnico | 100.0% | 48/48 | |
| Remates finales | 100.0% | 16/16 | |
| Iluminación final | 100.0% | 16/16 | |

## TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 10 filas, en el orden de ejecución de la base.

| Tajo Sagarde / fase | Avance | Hecho | Pend. |
|---|---|---|---|
| **Apliques y enchufes de terraza**<br>Remates exteriores | 98% | 15/16 | 0 |
| **Casquillos y bombillas**<br>Entrega | 21% | 2/16 | 10 |

## CONDICIONANTES

*No hay dependencias activas que frenen producción Sagarde.*

## PRÓXIMOS FRENTES

| Próximo tajo Sagarde | Uds. |
|---|---|
| **Apliques y enchufes de terraza**<br>Remates exteriores | 1 |
| **Casquillos y bombillas**<br>Entrega | 14 |

Fuente: base viva de la obra + catálogo de tajos y dependencias · Datos 05/11/2026 · Generado 05/11/2026 12:38

**Montajes Eléctricos Sagarde, S.L.**

# INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


**OBRA:** 2025 GERNIKA 32V | **ÁMBITO:** PORTAL 2
**Datos:** 05/11/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Kortezubi Bidea, Nº 1 - Amaiur, Nº 7, 48300 Gernika-Lumo (Bizkaia)

| 96.7% | 95.7% | 375/392 | 2 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Avance estimado | Terminado estricto | Celdas terminadas | Tajos listos | Tajos condicionados |


**Situación eléctrica:** Sagarde alcanza un **96.7%** de avance estimado y un **95.7%** terminado; avance de -0.1 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 2 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 0 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

## EVOLUCIÓN DEL AVANCE

Cada punto muestra el avance ponderado de la revisión; el marcador final distingue el total de obra cuando existe garaje.

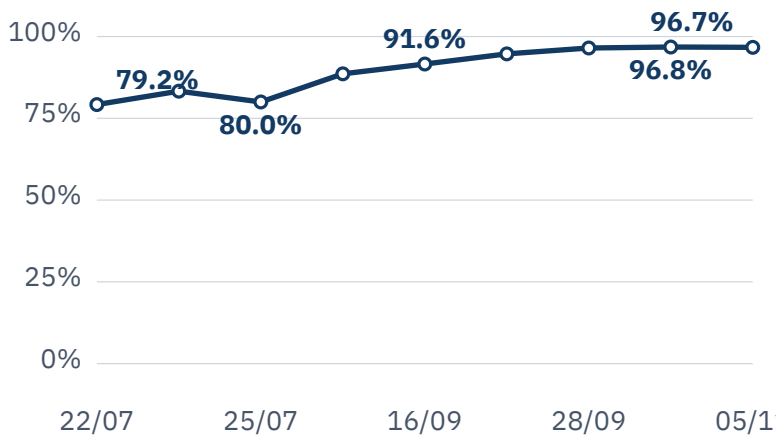


## AVANCE POR PLANTA

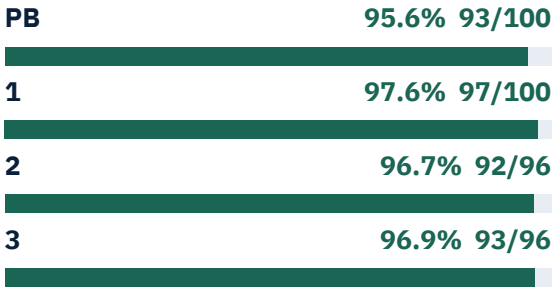


## FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % | 50 a 79 % | 80 a 99 % | 100 %

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inicio de obra | 100.0% | 16/16 | |
| Instalación interior | 100.0% | 96/96 | |
| Conexiones | 100.0% | 32/32 | |
| Mecanismos | 100.0% | 32/32 | |
| Remates exteriores | 100.0% | 16/16 | |
| Entrega | 64.7% | 19/32 | |
| Infraestructura | 100.0% | 80/80 | |
| Recuperación tras Pladur | 100.0% | 16/16 | |
| Cierre técnico | 96.0% | 36/40 | |
| Remates finales | 100.0% | 16/16 | |
| Iluminación final | 100.0% | 16/16 | |

## TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 10 filas, en el orden de ejecución de la base.

| Tajo Sagarde / fase | Avance | Hecho | Pend. |
|---|---|---|---|
| **Cuarto técnico**<br>Cierre técnico | **80%** | 4/8 | 0 |
| **Casquillos y bombillas**<br>Entrega | **29%** | 3/16 | 9 |

## CONDICIONANTES

*No hay dependencias activas que frenen producción Sagarde.*

## PRÓXIMOS FRENTES

| Próximo tajo Sagarde | Uds. |
|---|---|
| **Cuarto técnico**<br>Cierre técnico | **4** |
| **Casquillos y bombillas**<br>Entrega | **13** |

Fuente: base viva de la obra + catálogo de tajos y dependencias · Datos 05/11/2026 · Generado 05/11/2026 12:38

**Montajes Eléctricos Sagarde, S.L.**

# INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


**OBRA:** 2025 GERNIKA 32V | **ÁMBITO:** GARAJE
**Datos:** 05/11/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Kortezubi Bidea, Nº 1 - Amaiur, Nº 7, 48300 Gernika-Lumo (Bizkaia)

| 97.4% | 97.4% | 76/78 | 2 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Avance estimado | Terminado estricto | Celdas terminadas | Tajos listos | Tajos condicionados |

**Situación eléctrica:** Sagarde alcanza un **97.4%** de avance estimado y un **97.4%** terminado; avance de +6.7 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 2 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 0 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

## EVOLUCIÓN DEL AVANCE

Cada punto muestra el avance ponderado de la revisión; el marcador final distingue el total de obra cuando existe garaje.

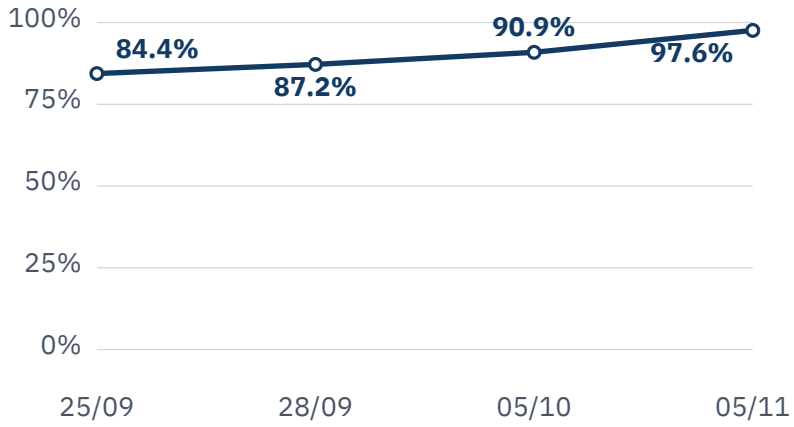


## DETALLE POR ZONA

| | |
|---|---|
| **Instalaciones generales / vetibulo portal 1** 88% · 14/16 | **Cuarto Achique / Bombas** 100% · 8/8 |
| **Escalera** 100% · 8/8 | **Rellano ESCALERA** 100% · 4/4 |
| **Trasteros portal 1** 100% · 4/4 | **Trasteros portal 2** 100% · 4/4 |
| **Vestibulo / Portal 1** 100% · 4/4 | **Vestibulo trasteros / Portal 2** 100% · 4/4 |
| **Vestibulo1 / Portal 2** 100% · 4/4 | **Vial / portal 1** 100% · 11/11 |
| **Vial /portal 2** 100% · 11/11 | |

## FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % | 50 a 79 % | 80 a 99 % | 100 %

| | | | |
|---|---|---|---|
| Instalación interior | 100.0% 12/12 | Instalación interior garaje | 100.0% 4/4 |
| Equipos | 97.2% 35/36 | Equipos garaje | 100.0% 12/12 |
| Cuadros | 83.3% 5/6 | Cuartos técnicos garaje | 100.0% 2/2 |
| Remates garaje | 100.0% 6/6 | | |

## TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 10 filas, en el orden de ejecución de la base.

| Tajo Sagarde / fase | Avance | Hecho | Pend. |
|---|---|---|---|
| **Colocación luminarias de emergencia (recintos)** Equipos | 86% | 6/7 | 1 |
| **Rotulación de cuadro propio** Cuadros | 0% | 0/1 | 1 |

## CONDICIONANTES

*No hay dependencias activas que frenen producción Sagarde.*

## PRÓXIMOS FRENTES

| Próximo tajo Sagarde | Uds. |
|---|---|
| **Colocación luminarias de emergencia (recintos)** Equipos | 1 |
| **Rotulación de cuadro propio** Cuadros | 1 |
