INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


OBRA: 2026 BOLUETA ACR | **ÁMBITO:** RESUMEN GENERAL
Datos: 27/10/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Neinor Península, S.L.U · Parcela RE A4, Bolueta, 48004 Bilbao (Bizkaia)

73.6%	68.5%	1683/2458	19	35	0/4
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados	Cierre de expediente

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **73.6%** de avance estimado y un **68.5%** terminado; las viviendas avanzan +1.9 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 19 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 11 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

EVOLUCIÓN (VIVIENDAS)

Cada punto muestra el avance ponderado de la revisión; el marcador final distingue el total de obra cuando existe garaje.

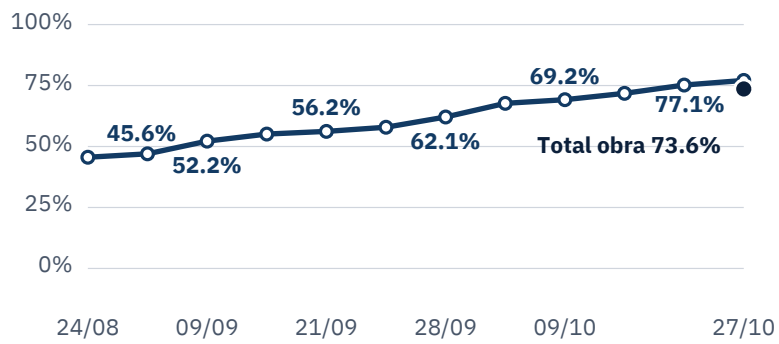

AVANCE POR BLOQUE

BOLUETA	77.1%	1650/2289
GARAJE	43.5%	29/72
ZONAS ESPECIALES	14.0%	4/97

CIERRE DE EXPEDIENTE

Ensayos instrumentales PENDIENTE	**Inspección OCA** PENDIENTE
CIE / Boletín eléctrico PENDIENTE	**Libro del Edificio** PENDIENTE

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % | 50 a 79 % | 80 a 99 % | 100 %

Inicio de obra	94.8% 92/97	Infraestructura	93.9% 412/478
Instalación interior	92.2% 562/616	Recuperación tras Pladur	96.8% 92/95
Conexiones	65.1% 102/190	Cierre técnico	58.3% 104/190
Mecanismos	69.7% 129/190	Remates finales	8.4% 8/95
Remates exteriores	0.0% 0/95	Iluminación final	90.1% 82/95
Entrega	61.1% 75/190	Cubierta — Antena/pararrayos	7.1% 0/7
Instalación interior garaje	100.0% 4/4	Equipos	10.3% 4/58
Equipos garaje	100.0% 12/12	Cuadros	21.1% 4/42
Cuartos técnicos garaje	0.0% 0/1	Remates garaje	53.3% 1/3

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 6 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Rozas de timbres Inicio de obra	95%	92/97	5
Montante eléctrica Infraestructura	97%	92/97	0
Montante de telecomunicaciones Infraestructura	97%	92/97	0
Montante de servicios comunes Infraestructura	75%	39/95	0
Cuadros presentados Instalación interior	97%	94/97	3
Tubeado interior Instalación interior	99%	92/95	0
+42 más · continúan en el mismo orden de ejecución			

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura — segunda mano Casquillos y bombillas, Placas y tapas	143
Fachada terminada Apliques y enchufes de terraza	95
Pintura de zonas comunes Iluminación de rellanos / ZZCC	41
+30 más	

PRÓXIMOS FRENTES

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Rozas de timbres Inicio de obra	5
Montante eléctrica Infraestructura	5
+17 más	

Fuente: base viva de la obra + catálogo de tajos y dependencias · Datos 27/10/2026 · Generado 10/11/2026 06:36

Montajes Eléctricos Sagarde, S.L.

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


OBRA: 2026 BOLUETA ACR | **ÁMBITO:** GARAJE
Datos: 27/10/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Neinor Península, S.L.U · Parcela RE A4, Bolueta, 48004 Bilbao (Bizkaia)

43.5%	40.3%	29/72	4	13
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **43.5%** de avance estimado y un **40.3%** terminado; avance de +3.7 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 4 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 3 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

Sin cuatro revisiones comparables; composición del último estado medido.



Terminado X: 29 · En marcha M: 1 · Iniciado /: 7 · Pendiente: 35

DETALLE POR ZONA

Escalera Principal 2% · 0/12	**Escalera 2** 4% · 0/12
Trasteros -1 25% · 0/4	**Cuadro General Garaje** 27% · 4/15
bombas de achique 67% · 4/6	**planta -1** 86% · 8/10
planta -2 100% · 9/9	**Trasteros -2** 100% · 4/4

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % · 50 a 79 % · 80 a 99 % · 100 %

Instalación interior	43.8%	6/16	Instalación interior garaje	100.0%	4/4
Equipos	17.6%	4/27	Equipos garaje	100.0%	12/12
Cuadros	22.2%	2/9	Cuartos técnicos garaje	0.0%	0/1
Remates garaje	53.3%	1/3			

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 10 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Tubeado visto Instalación interior	47%	3/8	2
Cableado visto Instalación interior	41%	3/8	4
Colocación alumbrado fijo (recintos) Equipos	18%	1/7	5
Colocación alumbrado temporizado (recintos) Equipos	0%	0/1	1
Colocación luminarias de emergencia (recintos) Equipos	5%	0/5	4
Colocación de enchufe de cuarto técnico Equipos	0%	0/1	1
Tubeado y cableado hasta cuadro secundario Cuadros	50%	1/2	1
Colocación y mecanizado de cuadro propio Cuadros	0%	0/2	2
Embornado de cuadro propio Cuadros	0%	0/1	1
Rotulación de cuadro propio Cuadros	0%	0/2	2
+7 más · continúan en el mismo orden de ejecución			

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura (recintos) — 1ª mano Colocación alumbrado fijo (recintos), Col...	15
Pintura (recintos) — 2ª mano Embornado alumbrado fijo (recintos), Embo...	11
Lucido Tubeado visto	5
Colocación alumbrado fijo (recintos) Embornado alumbrado fijo (recintos)	5
+6 más	

PRÓXIMOS FRENTES

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Tubeado y cableado hasta cuadro secundario Cuadros	1
Derivación de tierra de cuarto técnico Cuartos técnicos garaje	1
Alimentación de cuadro de puerta de acceso Remates garaje	1
Preinstalación vehículo eléctrico (IRVE) Remates garaje	1

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO

OBRA: 2026 BOLUETA ACR | **ÁMBITO:** ZONAS ESPECIALES
Datos: 27/10/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Neinor Península, S.L.U · Parcela RE A4, Bolueta, 48004 Bilbao (Bizkaia)

14.0%	4.1%	4/97	6	18
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **14.0%** de avance estimado y un **4.1%** terminado; sin comparación histórica suficiente. **Producción:** 6 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 4 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

Sin cuatro revisiones comparables; composición del último estado medido.



Terminado X: 4 · En marcha M: 13 · Iniciado /: 7 · Pendiente: 73

DETALLE POR ZONA

- **Basuras** — **0%** · 0/8
- **Cuarto Aerotermia** — **0%** · 0/13
- **Instalaciones generales** — **0%** · 0/13
- **Sala de calderas** — **7%** · 0/9
- **Cubierta** — **7%** · 0/7
- **Cuarto RITI / Teleco** — **11%** · 0/11
- **Centralización de contadores** — **15%** · 1/11
- **Centralización de contadores P24** — **23%** · 0/12
- **Cuarto RITS P24** — **53%** · 3/13

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % · 50 a 79 % · 80 a 99 % · 100 %

Cubierta — Antena/pararrayos	7.1%	0/7	Instalación interior	19.2%	2/26
Equipos	3.9%	0/31	Cuadros	20.8%	2/33

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 10 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Colocación de soporte de antena Cubierta — Antena/pararrayos	**25%**	0/1	0
Colocación de soporte de pararrayos Cubierta — Antena/pararrayos	**25%**	0/1	0
Instalación de antena Cubierta — Antena/pararrayos	**0%**	0/1	1
Instalación de pararrayos Cubierta — Antena/pararrayos	**0%**	0/1	1
Cableado de antena Cubierta — Antena/pararrayos	**0%**	0/1	1
Cableado de pararrayos Cubierta — Antena/pararrayos	**0%**	0/1	1
Tierra de antena Cubierta — Antena/pararrayos	**0%**	0/1	1
Tubeado empotrado Instalación interior	**26%**	0/7	4
Cableado empotrado Instalación interior	**17%**	0/7	5
Tubeado visto Instalación interior	**17%**	1/6	5
+10 más · continúan en el mismo orden de ejecución			

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura (recintos) — 1ª mano Colocación alumbrado fijo (recintos), Col...	22
Pintura (recintos) — 2ª mano Embornado alumbrado fijo (recintos), Embo...	21
Tabicado (zona común) Tubeado empotrado, Tubeado y cableado has...	5
Lucido Tubeado visto	3
+12 más	

PRÓXIMOS FRENTES

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Colocación de soporte de antena Cubierta — Antena/pararrayos	1
Colocación de soporte de pararrayos Cubierta — Antena/pararrayos	1
Tubeado empotrado Instalación interior	4
Tubeado visto Instalación interior	2
+2 más	
