INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


OBRA: 2026 BOLUETA ACR | **ÁMBITO:** RESUMEN GENERAL
Datos: 12/11/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Neinor Península, S.L.U · Parcela RE A4, Bolueta, 48004 Bilbao (Bizkaia)

80.1%	72.5%	1775/2448	22	32	0/4
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados	Cierre de expediente

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **80.1%** de avance estimado y un **72.5%** terminado; las viviendas avanzan +6.4 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 22 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 10 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

EVOLUCIÓN (VIVIENDAS)

Cada punto muestra el avance ponderado de la revisión; el marcador final distingue el total de obra cuando existe garaje.

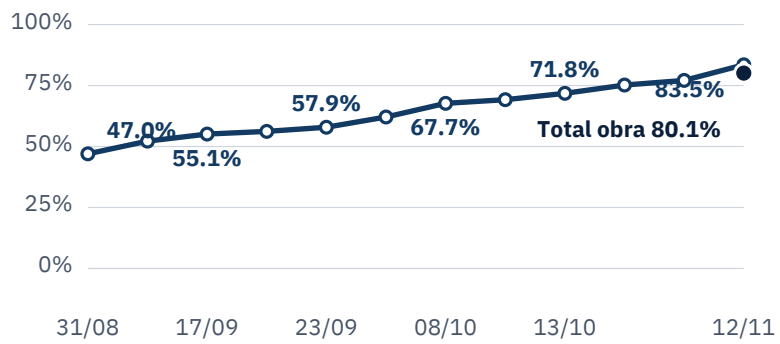

AVANCE POR BLOQUE

BOLUETA 83.5% 1739/2285

GARAJE 43.5% 29/72

ZONAS ESPECIALES 22.9% 7/91

CIERRE DE EXPEDIENTE

Ensayos instrumentales PENDIENTE	**Inspección OCA** PENDIENTE
CIE / Boletín eléctrico PENDIENTE	**Libro del Edificio** PENDIENTE

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % | 50 a 79 % | 80 a 99 % | 100 %

Inicio de obra	97.9% 92/94	Infraestructura	94.7% 418/478
Instalación interior	93.4% 564/611	Recuperación tras Pladur	96.8% 92/95
Conexiones	68.0% 102/190	Cierre técnico	82.7% 151/190
Mecanismos	86.6% 161/190	Remates finales	8.4% 8/95
Remates exteriores	54.6% 0/95	Iluminación final	90.1% 82/95
Entrega	62.6% 79/190	Cubierta — Antena/pararrayos	21.4% 1/7
Instalación interior garaje	100.0% 4/4	Equipos	10.3% 4/58
Equipos garaje	100.0% 12/12	Cuadros	31.4% 4/40
Cuartos técnicos garaje	0.0% 0/1	Remates garaje	53.3% 1/3

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 6 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Rozas de timbres Inicio de obra	98%	92/94	2
Montante eléctrica Infraestructura	99%	95/97	0
Montante de telecomunicaciones Infraestructura	99%	95/97	0
Montante de servicios comunes Infraestructura	75%	39/95	0
Cuadros presentados Instalación interior	98%	94/96	2
Tubeado interior Instalación interior	99%	92/95	0
+41 más · continúan en el mismo orden de ejecución			

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura — segunda mano Casquillos y bombillas, Placas y tapas	135
Fachada terminada Apliques y enchufes de terraza	95
Pintura de zonas comunes Iluminación de rellanos / ZZCC	37
+27 más	

PRÓXIMOS FRENTES

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Rozas de timbres Inicio de obra	2
Montante eléctrica Infraestructura	2
+20 más	

Fuente: base viva de la obra + catálogo de tajos y dependencias · Datos 12/11/2026 · Generado 12/11/2026 13:07

Montajes Eléctricos Sagarde, S.L.

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


OBRA: 2026 BOLUETA ACR | **ÁMBITO:** GARAJE
Datos: 12/11/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Neinor Península, S.L.U · Parcela RE A4, Bolueta, 48004 Bilbao (Bizkaia)

43.5%	40.3%	29/72	4	13
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **43.5%** de avance estimado y un **40.3%** terminado; avance de +3.7 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 4 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 3 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

Sin cuatro revisiones comparables; composición del último estado medido.



Terminado X: 29 · En marcha M: 1 · Iniciado /: 7 · Pendiente: 35

DETALLE POR ZONA

Escalera Principal 2% · 0/12	**Escalera 2** 4% · 0/12
Trasteros -1 25% · 0/4	**Cuadro General Garaje** 27% · 4/15
bombas de achique 67% · 4/6	**planta -1** 86% · 8/10
planta -2 100% · 9/9	**Trasteros -2** 100% · 4/4

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % · 50 a 79 % · 80 a 99 % · 100 %

Instalación interior	43.8%	6/16	
Equipos	17.6%	4/27	
Cuadros	22.2%	2/9	
Remates garaje	53.3%	1/3	
Instalación interior garaje	100.0%	4/4	
Equipos garaje	100.0%	12/12	
Cuartos técnicos garaje	0.0%	0/1	

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 10 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Tubeado visto Instalación interior	47%	3/8	2
Cableado visto Instalación interior	41%	3/8	4
Colocación alumbrado fijo (recintos) Equipos	18%	1/7	5
Colocación alumbrado temporizado (recintos) Equipos	0%	0/1	1
Colocación luminarias de emergencia (recintos) Equipos	5%	0/5	4
Colocación de enchufe de cuarto técnico Equipos	0%	0/1	1
Tubeado y cableado hasta cuadro secundario Cuadros	50%	1/2	1
Colocación y mecanizado de cuadro propio Cuadros	0%	0/2	2
Embornado de cuadro propio Cuadros	0%	0/1	1
Rotulación de cuadro propio Cuadros	0%	0/2	2
+7 más · continúan en el mismo orden de ejecución			

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura (recintos) — 1ª mano Colocación alumbrado fijo (recintos), Col...	15
Pintura (recintos) — 2ª mano Embornado alumbrado fijo (recintos), Embo...	11
Lucido Tubeado visto	5
Colocación alumbrado fijo (recintos) Embornado alumbrado fijo (recintos)	5
+6 más	

PRÓXIMOS FRENTES

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Tubeado y cableado hasta cuadro secundario Cuadros	1
Derivación de tierra de cuarto técnico Cuartos técnicos garaje	1
Alimentación de cuadro de puerta de acceso Remates garaje	1
Preinstalación vehículo eléctrico (IRVE) Remates garaje	1

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


OBRA: 2026 BOLUETA ACR | **ÁMBITO:** ZONAS ESPECIALES
Datos: 12/11/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Neinor Península, S.L.U · Parcela RE A4, Bolueta, 48004 Bilbao (Bizkaia)

22.9%	7.7%	7/91	7	17
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **22.9%** de avance estimado y un **7.7%** terminado; sin comparación histórica suficiente. **Producción:** 7 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 4 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

Sin cuatro revisiones comparables; composición del último estado medido.



DETALLE POR ZONA

Cuarto Aerotermia **0%** · 0/12	**Instalaciones generales** **9%** · 0/13
Cuarto RITI / Teleco **11%** · 0/11	**Sala de calderas** **15%** · 0/8
Basuras **17%** · 1/6	**Cubierta** **21%** · 1/7
Centralización de contadores **37%** · 2/11	**Centralización de contadores P24** **38%** · 0/10
Cuarto RITS P24 **53%** · 3/13	

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % | 50 a 79 % | 80 a 99 % | 100 %

Cubierta — Antena/pararrayos	21.4%	1/7	Instalación interior	34.5%	4/22
Equipos	3.9%	0/31	Cuadros	34.0%	2/31

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 10 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Colocación de soporte de antena Cubierta — Antena/pararrayos	25%	0/1	0
Colocación de soporte de pararrayos Cubierta — Antena/pararrayos	25%	0/1	0
Instalación de antena Cubierta — Antena/pararrayos	0%	0/1	1
Instalación de pararrayos Cubierta — Antena/pararrayos	0%	0/1	1
Cableado de antena Cubierta — Antena/pararrayos	0%	0/1	1
Tierra de antena Cubierta — Antena/pararrayos	0%	0/1	1
Tubeado empotrado Instalación interior	63%	2/7	1
Cableado empotrado Instalación interior	17%	0/7	5
Tubeado visto Instalación interior	25%	1/4	3
Cableado visto Instalación interior	25%	1/4	3
+9 más · continúan en el mismo orden de ejecución			

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura (recintos) — 2ª mano Embornado alumbrado fijo (recintos), Embo...	21
Pintura (recintos) — 1ª mano Colocación alumbrado fijo (recintos), Col...	20
Tabicado (zona común) Tubeado empotrado, Tubeado y cableado has...	2
Lucido Tubeado visto	1
+11 más	

PRÓXIMOS FRENTES

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Colocación de soporte de antena Cubierta — Antena/pararrayos	1
Colocación de soporte de pararrayos Cubierta — Antena/pararrayos	1
Tubeado empotrado Instalación interior	4
Cableado empotrado Instalación interior	2
Tubeado visto Instalación interior	2
+2 más	
