INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


OBRA: 2026 MUNGIA ACR NEINOR | **ÁMBITO:** RESUMEN GENERAL (3 PORTALES/BLOQUES)
Datos: 15/10/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Neinor Península, S.L.U · Parcelas ZR1.1 y ZR1.2 del PEOU U-41, 48100 Mungia (Bizkaia)

88.8%	86.2%	1336/1550	5	2	0/4
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados	Cierre de expediente

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **88.8%** de avance estimado y un **86.2%** terminado; avance de -1.7 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 5 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 2 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

EVOLUCIÓN DEL AVANCE

Cada punto muestra el avance ponderado de la revisión; el marcador final distingue el total de obra cuando existe garaje.

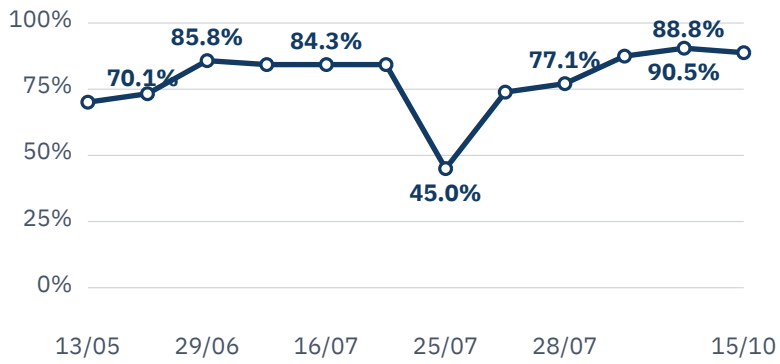

AVANCE POR BLOQUE

ZR1.1	91.2%	438/500
ZR1.2	88.4%	371/425
ZR2.1	87.2%	527/625

CIERRE DE EXPEDIENTE

Ensayos instrumentales PENDIENTE	**Inspección OCA** PENDIENTE
CIE / Boletín eléctrico PENDIENTE	**Libro del Edificio** PENDIENTE

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % | 50 a 79 % | 80 a 99 % | 100 %

Inicio de obra	100.0%	62/62	
Instalación interior	97.3%	362/372	
Conexiones	100.0%	124/124	
Mecanismos	100.0%	124/124	
Remates exteriores	50.7%	0/62	
Entrega	53.2%	61/124	
Infraestructura	100.0%	310/310	
Recuperación tras Pladur	100.0%	62/62	
Cierre técnico	66.7%	124/186	
Remates finales	80.6%	47/62	
Iluminación final	98.7%	60/62	

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 10 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Termostatos Instalación interior	84%	52/62	10
Cuarto técnico Cierre técnico	0%	0/62	62
Placas y tapas Remates finales	81%	47/62	10
Apliques y enchufes de terraza Remates exteriores	51%	0/62	9
Agujeros de iluminación en ZZCC Iluminación final	99%	60/62	0
Casquillos y bombillas Entrega	98%	61/62	1
Iluminación de rellanos / ZZCC Entrega	8%	0/62	42

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura de zonas comunes Iluminación de rellanos / ZZCC	44
Pintura — segunda mano Placas y tapas	15

PRÓXIMOS FRENTES

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Termostatos Instalación interior	10
Apliques y enchufes de terraza Remates exteriores	62
Agujeros de iluminación en ZZCC Iluminación final	2
Casquillos y bombillas Entrega	1
Iluminación de rellanos / ZZCC Entrega	18

Fuente: base viva de la obra + catálogo de tajos y dependencias · Datos 15/10/2026 · Generado 12/11/2026 13:07

Montajes Eléctricos Sagarde, S.L.

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


OBRA: 2026 MUNGIA ACR NEINOR | **ÁMBITO:** ZR1.1
Datos: 15/10/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Neinor Península, S.L.U · Parcelas ZR1.1 y ZR1.2 del PEOU U-41, 48100 Mungia (Bizkaia)

91.2%	87.6%	438/500	3	1
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados


Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **91.2%** de avance estimado y un **87.6%** terminado; avance de -3.8 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 3 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 1 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

EVOLUCIÓN DEL AVANCE

Cada punto muestra el avance ponderado de la revisión; el marcador final distingue el total de obra cuando existe garaje.

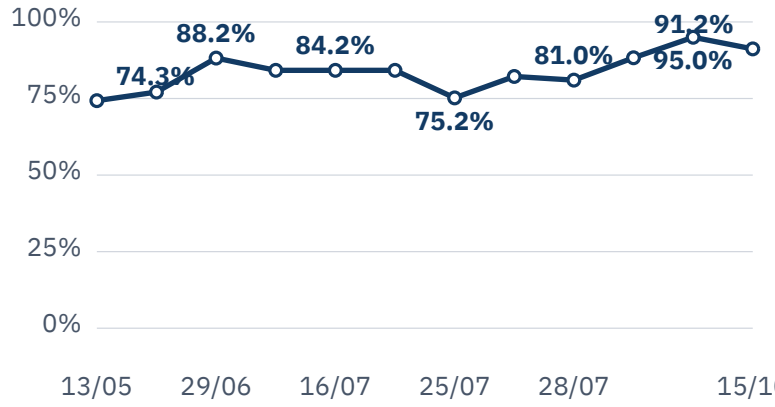


AVANCE POR PLANTA

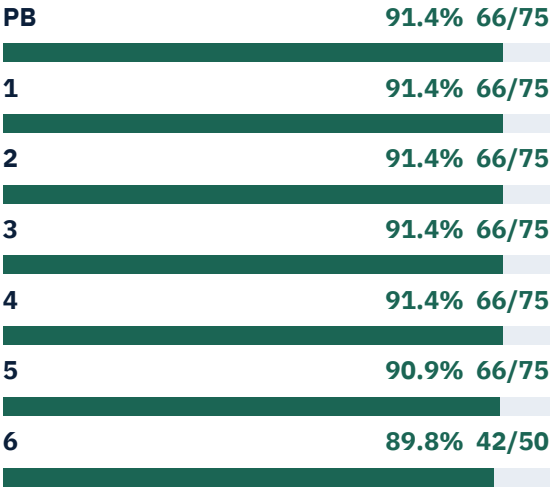

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % · 50 a 79 % · 80 a 99 % · 100 %

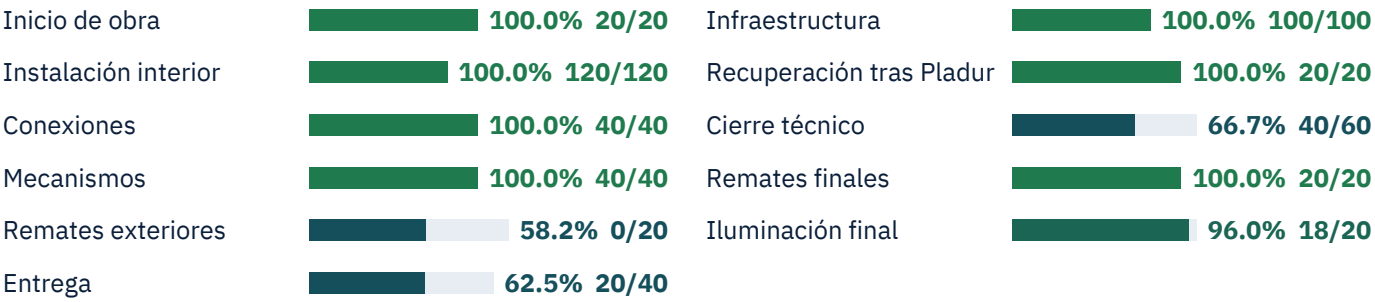

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 10 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Cuarto técnico Cierre técnico	0%	0/20	20
Apliques y enchufes de terraza Remates exteriores	58%	0/20	0
Agujeros de iluminación en ZZCC Iluminación final	96%	18/20	0
Iluminación de rellanos / ZZCC Entrega	25%	0/20	0

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura de zonas comunes Iluminación de rellanos / ZZCC	2

PRÓXIMOS FRENTES

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Apliques y enchufes de terraza Remates exteriores	20
Agujeros de iluminación en ZZCC Iluminación final	2
Iluminación de rellanos / ZZCC Entrega	18

Fuente: base viva de la obra + catálogo de tajos y dependencias · Datos 15/10/2026 ·
Generado 12/11/2026 13:07

Montajes Eléctricos Sagarde, S.L.

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


OBRA: 2026 MUNGIA ACR NEINOR | **ÁMBITO:** ZR1.2
Datos: 15/10/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Neinor Península, S.L.U · Parcelas ZR1.1 y ZR1.2 del PEOU U-41, 48100 Mungia (Bizkaia)

88.4%	87.3%	371/425	3	2
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados


Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **88.4%** de avance estimado y un **87.3%** terminado; avance de +0.2 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 3 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 2 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

EVOLUCIÓN DEL AVANCE

Cada punto muestra el avance ponderado de la revisión; el marcador final distingue el total de obra cuando existe garaje.

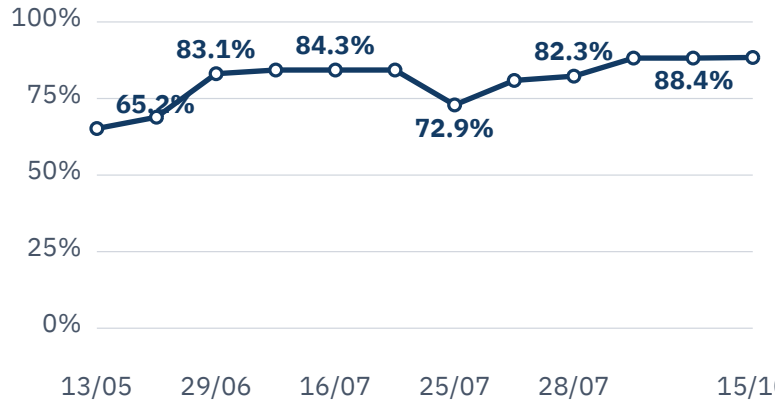


AVANCE POR PLANTA

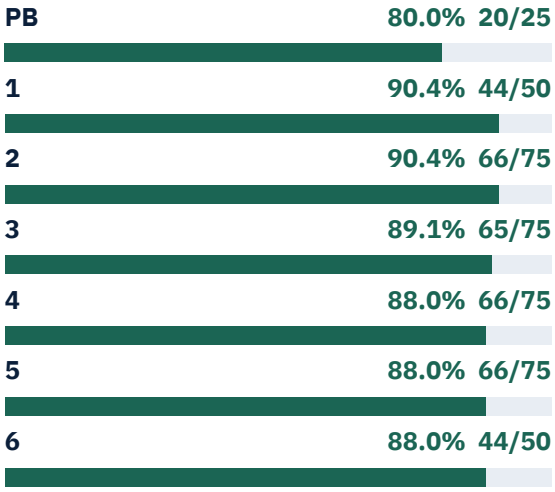

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % · 50 a 79 % · 80 a 99 % · 100 %

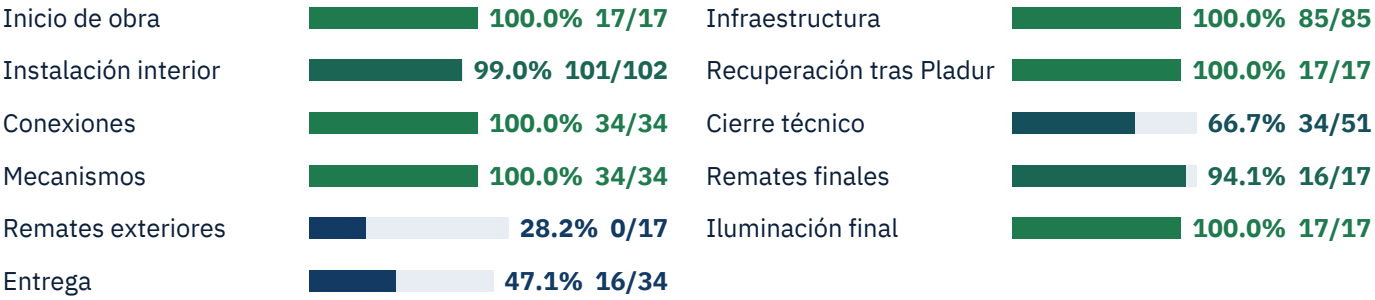

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 10 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Termostatos Instalación interior	94%	16/17	1
Cuarto técnico Cierre técnico	0%	0/17	17
Placas y tapas Remates finales	94%	16/17	1
Apliques y enchufes de terraza Remates exteriores	28%	0/17	9
Casquillos y bombillas Entrega	94%	16/17	1
Iluminación de rellanos / ZZCC Entrega	0%	0/17	17

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura de zonas comunes Iluminación de rellanos / ZZCC	17
Pintura — segunda mano Placas y tapas	1

PRÓXIMOS FRENTES

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Termostatos Instalación interior	1
Apliques y enchufes de terraza Remates exteriores	17
Casquillos y bombillas Entrega	1

Fuente: base viva de la obra + catálogo de tajos y dependencias · Datos 15/10/2026 · Generado 12/11/2026 13:07

Montajes Eléctricos Sagarde, S.L.

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


OBRA: 2026 MUNGIA ACR NEINOR | **ÁMBITO:** ZR2.1
Datos: 15/10/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Neinor Península, S.L.U · Parcelas ZR1.1 y ZR1.2 del PEOU U-41, 48100 Mungia (Bizkaia)

87.2%	84.3%	527/625	2	2
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados


Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **87.2%** de avance estimado y un **84.3%** terminado; avance de -1.3 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 2 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 2 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

EVOLUCIÓN DEL AVANCE

Cada punto muestra el avance ponderado de la revisión; el marcador final distingue el total de obra cuando existe garaje.

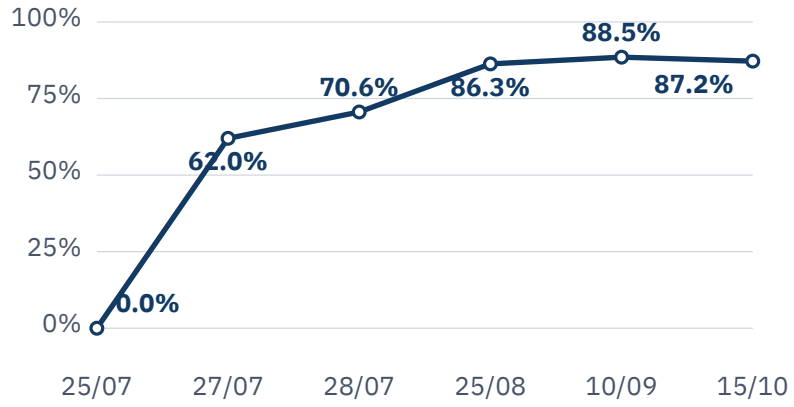

AVANCE POR PLANTA

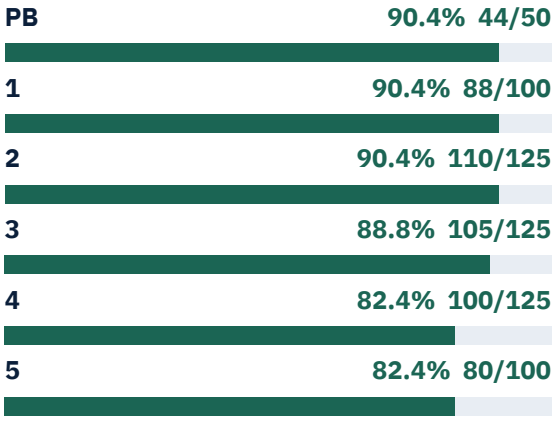

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % | 50 a 79 % | 80 a 99 % | 100 %

Inicio de obra	100.0% 25/25	Infraestructura	100.0% 125/125
Instalación interior	94.0% 141/150	Recuperación tras Pladur	100.0% 25/25
Conexiones	100.0% 50/50	Cierre técnico	66.7% 50/75
Mecanismos	100.0% 50/50	Remates finales	56.0% 11/25
Remates exteriores	60.0% 0/25	Iluminación final	100.0% 25/25
Entrega	50.0% 25/50		

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 10 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Termostatos Instalación interior	64%	16/25	9
Cuarto técnico Cierre técnico	0%	0/25	25
Placas y tapas Remates finales	56%	11/25	9
Apliques y enchufes de terraza Remates exteriores	60%	0/25	0
Iluminación de rellanos / ZZCC Entrega	0%	0/25	25

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura de zonas comunes Iluminación de rellanos / ZZCC	25
Pintura — segunda mano Placas y tapas	14

PRÓXIMOS FRENTES

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Termostatos Instalación interior	9
Apliques y enchufes de terraza Remates exteriores	25

Fuente: base viva de la obra + catálogo de tajos y dependencias · Datos 15/10/2026 · Generado 12/11/2026 13:07

Montajes Eléctricos Sagarde, S.L.
