INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


OBRA: 2026 OLABEAGA BILBAO | **ÁMBITO:** RESUMEN GENERAL (3 PORTALES/BLOQUES)
Datos: 11/11/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
GRUPO EIBAR · Camino de la Ventosa nº 3, Barrio Olabeaga (Basurto-Zorroza), 48013 Bilbao (Bizkaia)...

12.4%	10.3%	121/1171	20	47	0/4
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados	Cierre de expediente

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **12.4%** de avance estimado y un **10.3%** terminado; las viviendas avanzan +0.5 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 20 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 12 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

EVOLUCIÓN (VIVIENDAS)

Cada punto muestra el avance ponderado de la revisión; el marcador final distingue el total de obra cuando existe garaje.

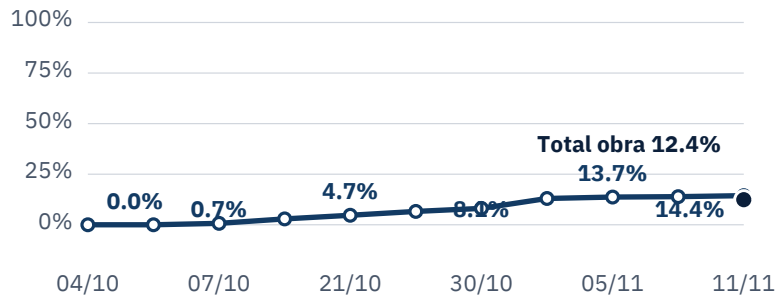

AVANCE POR BLOQUE

PORTAL 1	1.8%	3/238
PORTAL 2	9.1%	14/290
PORTAL 3	30.2%	83/288
GARAJE	11.8%	20/205
ZONAS ESPECIALES	2.2%	1/150

CIERRE DE EXPEDIENTE

Ensayos instrumentales PENDIENTE	**Inspección OCA** PENDIENTE
CIE / Boletín eléctrico PENDIENTE	**Libro del Edificio** PENDIENTE

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % · 50 a 79 % · 80 a 99 % · 100 %

Inicio de obra	50.0%	16/32	
Instalación interior	14.3%	33/293	
Conexiones	0.0%	0/70	
Mecanismos	0.0%	0/70	
Remates exteriores	0.0%	0/32	
Entrega	0.0%	0/70	
Cubierta — Antena/pararrayos	0.0%	0/7	
Equipos	0.0%	0/151	
Cuadros	3.0%	0/61	
Remates garaje	55.0%	1/4	
Infraestructura	35.8%	52/175	
Recuperación tras Pladur	0.0%	0/32	
Cierre técnico	0.0%	0/64	
Remates finales	0.0%	0/35	
Iluminación final	0.0%	0/35	
Cubierta — Fotovoltaica	0.0%	0/6	
Instalación interior garaje	65.6%	5/8	
Equipos garaje	67.2%	14/23	
Cuartos técnicos garaje	0.0%	0/3	

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 6 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Rozas de timbres Inicio de obra	50%	16/32	16
Montante eléctrica Infraestructura	51%	14/35	12
Montante de telecomunicaciones Infraestructura	47%	14/35	14
Montante de servicios comunes Infraestructura	39%	12/35	17
Tubeado de zonas comunes Infraestructura	41%	12/35	19
Cableado de zonas comunes Infraestructura	1%	0/35	34
+59 más · continúan en el mismo orden de ejecución			

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura — primera mano Mecanizado eléctrico, Telemecanizado	70
Pintura — segunda mano Casquillos y bombillas, Placas y tapas	70
+38 más	

PRÓXIMOS FRENTES

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Rozas de timbres Inicio de obra	14
Montante eléctrica Infraestructura	17
+18 más	

Fuente: base viva de la obra + catálogo de tajos y dependencias · Datos 11/11/2026 · Generado 12/11/2026 13:07

Montajes Eléctricos Sagarde, S.L.

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


OBRA: 2026 OLABEAGA BILBAO | **ÁMBITO:** PORTAL 1
Datos: 11/11/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
GRUPO EIBAR · Camino de la Ventosa nº 3, Barrio Olabeaga (Basurto-Zorroza), 48013 Bilbao (Bizkaia)...

1.5%	1.0%	3/291	11	41
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **1.5%** de avance estimado y un **1.0%** terminado; las viviendas avanzan +0.0 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 11 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 12 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

EVOLUCIÓN (VIVIENDAS)

Cada punto muestra el avance ponderado de la revisión; el marcador final distingue el total de obra cuando existe garaje.

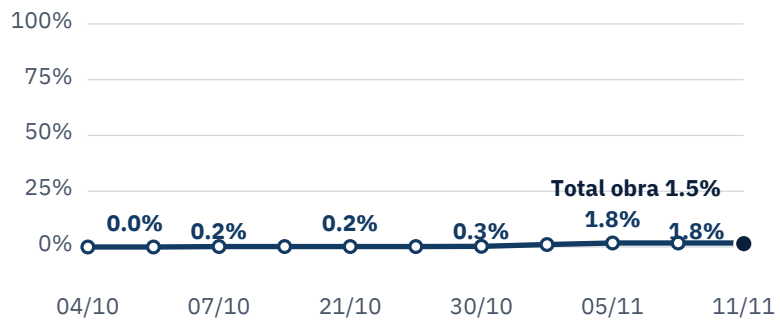

AVANCE POR PLANTA

PB	0.0%	0/46
1ª	8.5%	3/48
2ª	0.5%	0/48
3ª	0.0%	0/48
4ª	0.0%	0/48
Zonas especiales	0.0%	0/53

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % | 50 a 79 % | 80 a 99 % | 100 %

Inicio de obra	0.0%	0/8	Infraestructura	1.5%	0/50
Instalación interior	4.7%	3/76	Recuperación tras Pladur	0.0%	0/10
Conexiones	0.0%	0/20	Cierre técnico	0.0%	0/20
Mecanismos	0.0%	0/20	Remates finales	0.0%	0/10
Remates exteriores	0.0%	0/10	Iluminación final	0.0%	0/10
Entrega	0.0%	0/20	Cubierta — Fotovoltaica	0.0%	0/6
Equipos	0.0%	0/16	Cuadros	0.0%	0/15

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 6 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Rozas de timbres Inicio de obra	0%	0/8	8
Montante eléctrica Infraestructura	5%	0/10	8
Montante de telecomunicaciones Infraestructura	0%	0/10	10
Montante de servicios comunes Infraestructura	0%	0/10	10
Tubeado de zonas comunes Infraestructura	0%	0/10	10
Cableado de zonas comunes Infraestructura	2%	0/10	9
+37 más · continúan en el mismo orden de ejecución			

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura — primera mano Mecanizado eléctrico, Telemecanizado	20
Pintura — segunda mano Casquillos y bombillas, Placas y tapas	20
Pintura (recintos) — 1ª mano Colocación alumbrado fijo (recintos), Col...	11
+32 más	

PRÓXIMOS FRENTES

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Rozas de timbres Inicio de obra	8
Montante eléctrica Infraestructura	8
Montante de telecomunicaciones Infraestructura	8
+8 más	

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


OBRA: 2026 OLABEAGA BILBAO | **ÁMBITO:** PORTAL 2
Datos: 11/11/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
GRUPO EIBAR · Camino de la Ventosa nº 3, Barrio Olabeaga (Basurto-Zorroza), 48013 Bilbao (Bizkaia)...

7.5%	3.8%	14/370	13	42
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **7.5%** de avance estimado y un **3.8%** terminado; las viviendas avanzan +0.0 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 13 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 12 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

EVOLUCIÓN (VIVIENDAS)

Cada punto muestra el avance ponderado de la revisión; el marcador final distingue el total de obra cuando existe garaje.

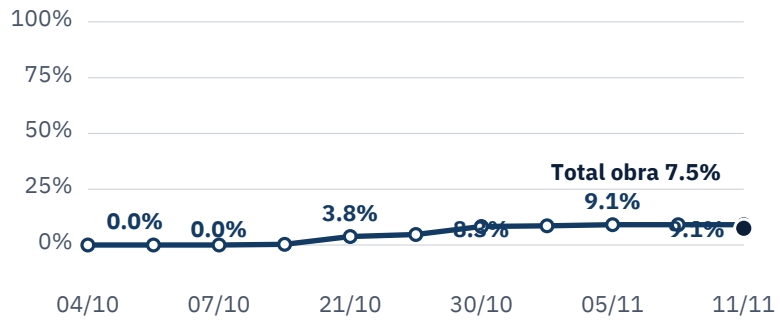

AVANCE POR PLANTA

PB	5.1%	0/50
1ª	26.1%	7/48
2ª	20.6%	7/48
3ª	3.1%	0/48
4ª	0.0%	0/48
DUPLX ATICO	0.0%	0/48
Zonas especiales	1.4%	0/80

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % | 50 a 79 % | 80 a 99 % | 100 %

Inicio de obra	33.3%	4/12	Infraestructura	21.3%	4/65
Instalación interior	10.5%	6/93	Recuperación tras Pladur	0.0%	0/10
Conexiones	0.0%	0/26	Cierre técnico	0.0%	0/20
Mecanismos	0.0%	0/26	Remates finales	0.0%	0/13
Remates exteriores	0.0%	0/10	Iluminación final	0.0%	0/13
Entrega	0.0%	0/26	Cubierta — Antena/pararrayos	0.0%	0/7
Equipos	0.0%	0/24	Cuadros	0.0%	0/25

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 6 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Rozas de timbres Inicio de obra	33%	4/12	8
Montante eléctrica Infraestructura	42%	2/13	4
Montante de telecomunicaciones Infraestructura	34%	2/13	4
Montante de servicios comunes Infraestructura	12%	0/13	7
Tubeado de zonas comunes Infraestructura	18%	0/13	9
Cableado de zonas comunes Infraestructura	0%	0/13	13
+38 más · continúan en el mismo orden de ejecución			

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura — primera mano Mecanizado eléctrico, Telemecanizado	26
Pintura — segunda mano Casquillos y bombillas, Placas y tapas	26
Pintura (recintos) — 1ª mano Colocación alumbrado fijo (recintos), Col...	17
+32 más	

PRÓXIMOS FRENTES

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Rozas de timbres Inicio de obra	6
Montante eléctrica Infraestructura	9
Montante de telecomunicaciones Infraestructura	9
+10 más	

Fuente: base viva de la obra + catálogo de tajos y dependencias · Datos 11/11/2026 · Generado 12/11/2026 13:07

Montajes Eléctricos Sagarde, S.L.

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


OBRA: 2026 OLABEAGA BILBAO | **ÁMBITO:** PORTAL 3
Datos: 11/11/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
GRUPO EIBAR · Camino de la Ventosa nº 3, Barrio Olabeaga (Basurto-Zorroza), 48013 Bilbao (Bizkaia)...

29.2%	27.5%	84/305	12	27
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **29.2%** de avance estimado y un **27.5%** terminado; las viviendas avanzan +1.5 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 12 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 12 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

EVOLUCIÓN (VIVIENDAS)

Cada punto muestra el avance ponderado de la revisión; el marcador final distingue el total de obra cuando existe garaje.

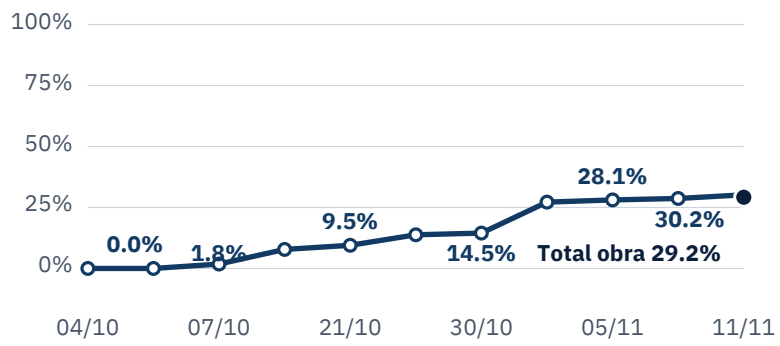

AVANCE POR PLANTA

1ª	44.2%	30/72
2ª	28.1%	20/72
3ª	27.5%	18/72
4ª	20.8%	15/72
Zonas especiales	12.9%	1/17

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % | 50 a 79 % | 80 a 99 % | 100 %

Inicio de obra	100.0%	12/12	
Instalación interior	35.6%	24/80	
Conexiones	0.0%	0/24	
Mecanismos	0.0%	0/24	
Remates exteriores	0.0%	0/12	
Entrega	0.0%	0/24	
Cuadros	30.0%	0/2	
Infraestructura	80.0%	48/60	
Recuperación tras Pladur	0.0%	0/12	
Cierre técnico	0.0%	0/24	
Remates finales	0.0%	0/12	
Iluminación final	0.0%	0/12	
Equipos	0.0%	0/7	

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 6 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Cableado de zonas comunes Infraestructura	0%	0/12	12
Cuadros presentados Instalación interior	75%	9/12	3
Tubeado interior Instalación interior	59%	5/12	3
Cableado eléctrico Instalación interior	25%	3/12	9
Telecableado Instalación interior	25%	3/12	9
Portero / videoportero Instalación interior	25%	3/12	9
+23 más · continúan en el mismo orden de ejecución			

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura — primera mano Mecanizado eléctrico, Telemecanizado	24
Pintura — segunda mano Casquillos y bombillas, Placas y tapas	24
Fachada terminada Apliques y enchufes de terraza	12
+23 más	

PRÓXIMOS FRENTES

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Cableado de zonas comunes Infraestructura	12
Cuadros presentados Instalación interior	1
Tubeado interior Instalación interior	4
+9 más	

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


OBRA: 2026 OLABEAGA BILBAO | **ÁMBITO:** GARAJE
Datos: 11/11/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
GRUPO EIBAR · Camino de la Ventosa nº 3, Barrio Olabeaga (Basurto-Zorroza), 48013 Bilbao (Bizkaia)...

11.8%	9.8%	20/205	4	25
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **11.8%** de avance estimado y un **9.8%** terminado; avance de +3.0 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 4 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 6 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

EVOLUCIÓN DEL AVANCE

Cada punto muestra el avance ponderado de la revisión; el marcador final distingue el total de obra cuando existe garaje.

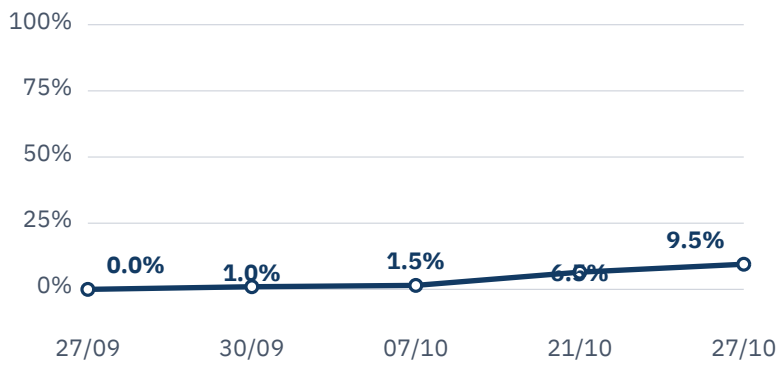

DETALLE POR ZONA

Basuras 2 **0%** · 0/12	**Basuras P1** **0%** · 0/12
Cuadro General Garaje P1 **0%** · 0/18	**Cuarto Ventilacion P3** **0%** · 0/18
Escalera Garaje P2 **0%** · 0/16	**Portal 1** **0%** · 0/16
Portal 2 **0%** · 0/16	**Portal 3** **0%** · 0/16
Rampa -1 **0%** · 0/8	**Sala Hidraulica** **0%** · 0/18
Trasteros -1 **0%** · 0/10	**Trasteros -2** **0%** · 0/10

+4 más

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % | 50 a 79 % | 80 a 99 % | 100 %

Instalación interior	0.0%	0/44	
Equipos	0.0%	0/104	
Cuadros	6.3%	0/19	
Remates garaje	55.0%	1/4	
Instalación interior garaje	65.6%	5/8	
Equipos garaje	67.2%	14/23	
Cuartos técnicos garaje	0.0%	0/3	

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 6 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Tubeado empotrado Instalación interior	0%	0/13	13
Cableado empotrado Instalación interior	0%	0/13	13
Tubeado visto Instalación interior	0%	0/9	9
Cableado visto Instalación interior	0%	0/9	9
Tubeado de viales Instalación interior garaje	75%	3/4	1
Cableado de viales Instalación interior garaje	56%	2/4	1
+22 más · continúan en el mismo orden de ejecución			

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura (recintos) — 2ª mano Embornado alumbrado fijo (recintos), Embo...	56
Pintura (recintos) — 1ª mano Colocación alumbrado fijo (recintos), Col...	55
Tabicado (zona común) Derivación de tierra de cuarto técnico, T...	20
+16 más	

PRÓXIMOS FRENTES

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Tubeado de viales Instalación interior garaje	1
Cableado de viales Instalación interior garaje	1
Alimentación de cuadro de puerta de acceso Remates garaje	1
+1 más	

Fuente: base viva de la obra + catálogo de tajos y dependencias · Datos 11/11/2026 · Generado 12/11/2026 13:07

Montajes Eléctricos Sagarde, S.L.

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO

OBRA: 2026 OLABEAGA BILBAO | **ÁMBITO:** ZONAS ESPECIALES
Datos: 11/11/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
GRUPO EIBAR · Camino de la Ventosa nº 3, Barrio Olabeaga (Basurto-Zorroza), 48013 Bilbao (Bizkaia)...

2.2%	0.7%	1/150	4	23
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **2.2%** de avance estimado y un **0.7%** terminado; sin comparación histórica suficiente. **Producción:** 4 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 4 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

Sin cuatro revisiones comparables; composición del último estado medido.



DETALLE POR ZONA

Bicicletas
0% · 0/8

Bicicletas (2/3)
0% · 0/8

Centralización de contadores (P1)
0% · 0/13

CUADRO E/A (P1)
0% · 0/13

CUADRO E/A (P2/3)
0% · 0/13

CUADRO SERVICIOS GENERALES
0% · 0/13

Cubierta
0% · 0/6

Cubierta
0% · 0/7

Sala de calderas (P2/3)
0% · 0/13

Cuarto RITI / Teleco (2/3)
2% · 0/13

Cuarto RITIS/ Teleco
2% · 0/13

Centralización de contadores (P2/3)
5% · 0/13

+2 más

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % | 50 a 79 % | 80 a 99 % | 100 %

Cubierta — Fotovoltaica	0.0% 0/6	Cubierta — Antena/pararrayos	0.0% 0/7
Instalación interior	5.6% 1/48	Equipos	0.0% 0/47
Cuadros	1.4% 0/42		

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 6 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Instalación de paneles fotovoltaicos Cubierta — Fotovoltaica	**0%**	0/1	1
Cableado de paneles fotovoltaicos Cubierta — Fotovoltaica	**0%**	0/1	1
Tierra de paneles fotovoltaicos Cubierta — Fotovoltaica	**0%**	0/1	1
Cableado de strings hasta equipos Cubierta — Fotovoltaica	**0%**	0/1	1
Instalación de equipos y protecciones Cubierta — Fotovoltaica	**0%**	0/1	1
Puesta en marcha de fotovoltaica Cubierta — Fotovoltaica	**0%**	0/1	1
+20 más · continúan en el mismo orden de ejecución			

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura (recintos) — 2ª mano Embornado alumbrado fijo (recintos), Embo...	32
Pintura (recintos) — 1ª mano Colocación alumbrado fijo (recintos), Col...	31
Tabicado (zona común) Tubeado empotrado, Tubeado y cableado has...	20
+18 más	

PRÓXIMOS FRENTES

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Instalación de paneles fotovoltaicos Cubierta — Fotovoltaica	1
Colocación de soporte de antena Cubierta — Antena/pararrayos	1
+2 más	

Fuente: base viva de la obra + catálogo de tajos y dependencias · Datos 11/11/2026 · Generado 12/11/2026 13:07

Montajes Eléctricos Sagarde, S.L.
