# INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


**OBRA:** 2026 MUNGIA ACR NEINOR | **ÁMBITO:** RESUMEN GENERAL (3 PORTALES/BLOQUES)
**Datos:** 15/10/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Neinor Península, S.L.U · Parcelas ZR1.1 y ZR1.2 del PEOU U-41, 48100 Mungia (Bizkaia)

| 88.8% | 86.2% | 1336/1550 | 5 | 2 | 0/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Avance estimado | Terminado estricto | Celdas terminadas | Tajos listos | Tajos condicionados | Cierre de expediente |

**Situación eléctrica:** Sagarde alcanza un **88.8%** de avance estimado y un **86.2%** terminado; avance de -1.7 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 5 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 2 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

## EVOLUCIÓN DEL AVANCE

Cada punto muestra el avance ponderado de la revisión; el marcador final distingue el total de obra cuando existe garaje.

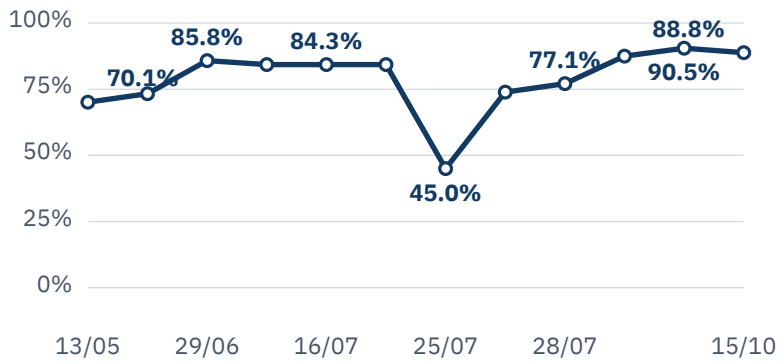


## AVANCE POR BLOQUE

| | | |
|---|---|---|
| ZR1.1 | 91.2% | 438/500 |
| ZR1.2 | 88.4% | 371/425 |
| ZR2.1 | 87.2% | 527/625 |

## CIERRE DE EXPEDIENTE

| | |
|---|---|
| **Ensayos instrumentales** PENDIENTE | **Inspección OCA** PENDIENTE |
| **CIE / Boletín eléctrico** PENDIENTE | **Libro del Edificio** PENDIENTE |

## FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % | 50 a 79 % | 80 a 99 % | 100 %

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inicio de obra | 100.0% | 62/62 | |
| Instalación interior | 97.3% | 362/372 | |
| Conexiones | 100.0% | 124/124 | |
| Mecanismos | 100.0% | 124/124 | |
| Remates exteriores | 50.7% | 0/62 | |
| Entrega | 53.2% | 61/124 | |
| Infraestructura | 100.0% | 310/310 | |
| Recuperación tras Pladur | 100.0% | 62/62 | |
| Cierre técnico | 66.7% | 124/186 | |
| Remates finales | 80.6% | 47/62 | |
| Iluminación final | 98.7% | 60/62 | |

## TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 10 filas, en el orden de ejecución de la base.

| Tajo Sagarde / fase | Avance | Hecho | Pend. |
|---|---|---|---|
| **Termostatos** Instalación interior | 84% | 52/62 | 10 |
| **Cuarto técnico** Cierre técnico | 0% | 0/62 | 62 |
| **Placas y tapas** Remates finales | 81% | 47/62 | 10 |
| **Apliques y enchufes de terraza** Remates exteriores | 51% | 0/62 | 9 |
| **Agujeros de iluminación en ZZCC** Iluminación final | 99% | 60/62 | 0 |
| **Casquillos y bombillas** Entrega | 98% | 61/62 | 1 |
| **Iluminación de rellanos / ZZCC** Entrega | 8% | 0/62 | 42 |

## CONDICIONANTES

| Condicionante | Afecta |
|---|---|
| **Pintura de zonas comunes** Iluminación de rellanos / ZZCC | 44 |
| **Pintura — segunda mano** Placas y tapas | 15 |

## PRÓXIMOS FRENTES

| Próximo tajo Sagarde | Uds. |
|---|---|
| **Termostatos** Instalación interior | 10 |
| **Apliques y enchufes de terraza** Remates exteriores | 62 |
| **Agujeros de iluminación en ZZCC** Iluminación final | 2 |
| **Casquillos y bombillas** Entrega | 1 |
| **Iluminación de rellanos / ZZCC** Entrega | 18 |

Fuente: base viva de la obra + catálogo de tajos y dependencias · Datos 15/10/2026 · Generado 10/11/2026 22:26

**Montajes Eléctricos Sagarde, S.L.**

# INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


**OBRA:** 2026 MUNGIA ACR NEINOR | **ÁMBITO:** ZR1.1
**Datos:** 15/10/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Neinor Península, S.L.U · Parcelas ZR1.1 y ZR1.2 del PEOU U-41, 48100 Mungia (Bizkaia)

| 91.2% | 87.6% | 438/500 | 3 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| Avance estimado | Terminado estricto | Celdas terminadas | Tajos listos | Tajos condicionados |


**Situación eléctrica:** Sagarde alcanza un **91.2%** de avance estimado y un **87.6%** terminado; avance de -3.8 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 3 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 1 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

## EVOLUCIÓN DEL AVANCE

Cada punto muestra el avance ponderado de la revisión; el marcador final distingue el total de obra cuando existe garaje.

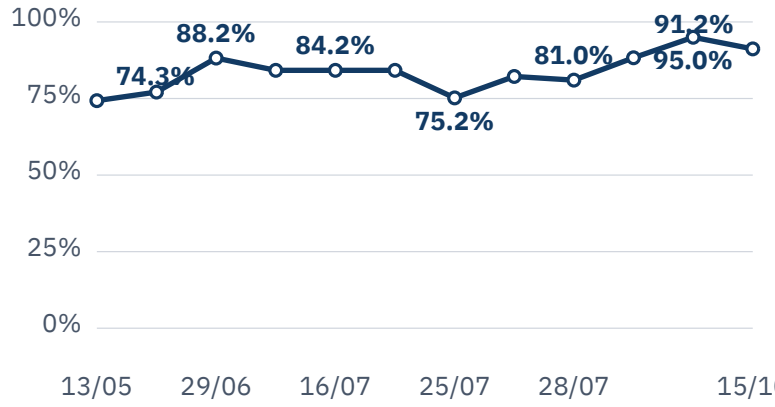



## AVANCE POR PLANTA

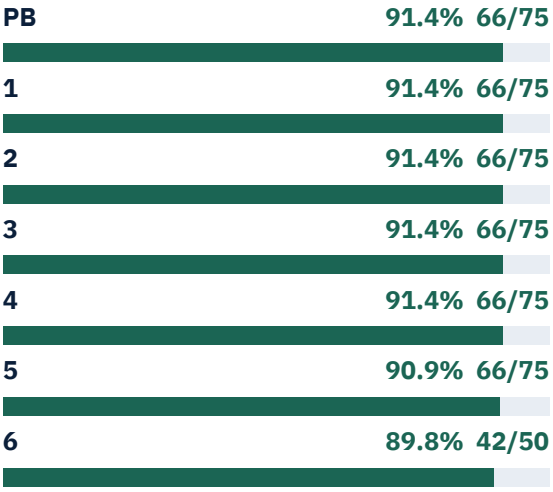


## FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % · 50 a 79 % · 80 a 99 % · 100 %

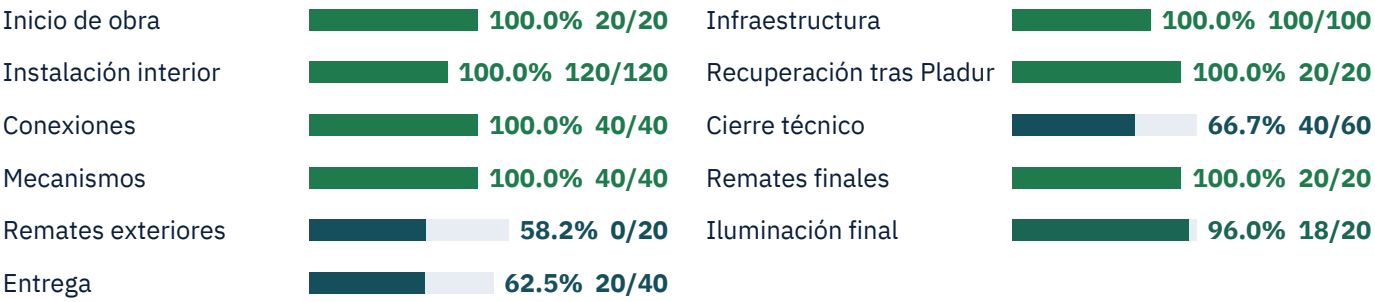


## TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 10 filas, en el orden de ejecución de la base.

| Tajo Sagarde / fase | Avance | Hecho | Pend. |
|---|---|---|---|
| **Cuarto técnico**<br>Cierre técnico | 0% | 0/20 | 20 |
| **Apliques y enchufes de terraza**<br>Remates exteriores | 58% | 0/20 | 0 |
| **Agujeros de iluminación en ZZCC**<br>Iluminación final | 96% | 18/20 | 0 |
| **Iluminación de rellanos / ZZCC**<br>Entrega | 25% | 0/20 | 0 |

## CONDICIONANTES

| Condicionante | Afecta |
|---|---|
| **Pintura de zonas comunes**<br>Iluminación de rellanos / ZZCC | 2 |

## PRÓXIMOS FRENTES

| Próximo tajo Sagarde | Uds. |
|---|---|
| **Apliques y enchufes de terraza**<br>Remates exteriores | 20 |
| **Agujeros de iluminación en ZZCC**<br>Iluminación final | 2 |
| **Iluminación de rellanos / ZZCC**<br>Entrega | 18 |

Fuente: base viva de la obra + catálogo de tajos y dependencias · Datos 15/10/2026 ·
Generado 10/11/2026 22:26

**Montajes Eléctricos Sagarde, S.L.**

# INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


**OBRA:** 2026 MUNGIA ACR NEINOR | **ÁMBITO:** ZR1.2
**Datos:** 15/10/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Neinor Península, S.L.U · Parcelas ZR1.1 y ZR1.2 del PEOU U-41, 48100 Mungia (Bizkaia)

| 88.4% | 87.3% | 371/425 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| Avance estimado | Terminado estricto | Celdas terminadas | Tajos listos | Tajos condicionados |


**Situación eléctrica:** Sagarde alcanza un **88.4%** de avance estimado y un **87.3%** terminado; avance de +0.2 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 3 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 2 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

## EVOLUCIÓN DEL AVANCE

Cada punto muestra el avance ponderado de la revisión; el marcador final distingue el total de obra cuando existe garaje.

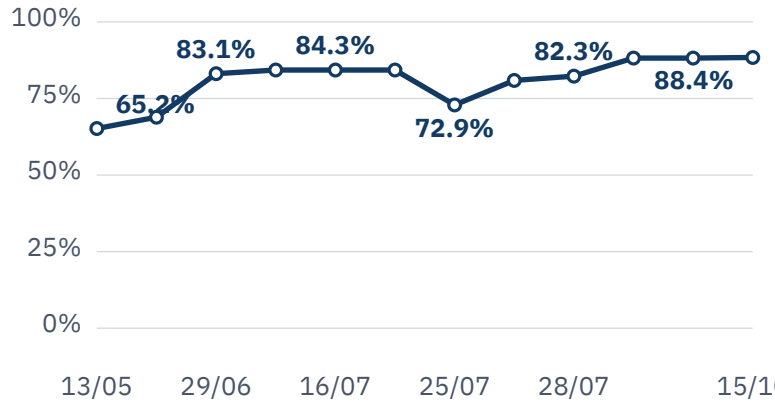



## AVANCE POR PLANTA

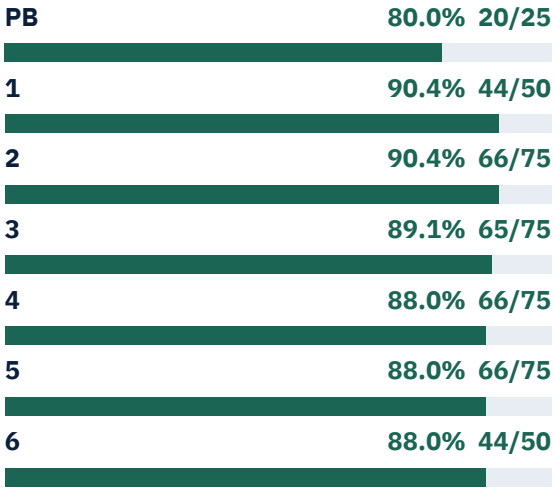


## FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % · 50 a 79 % · 80 a 99 % · 100 %

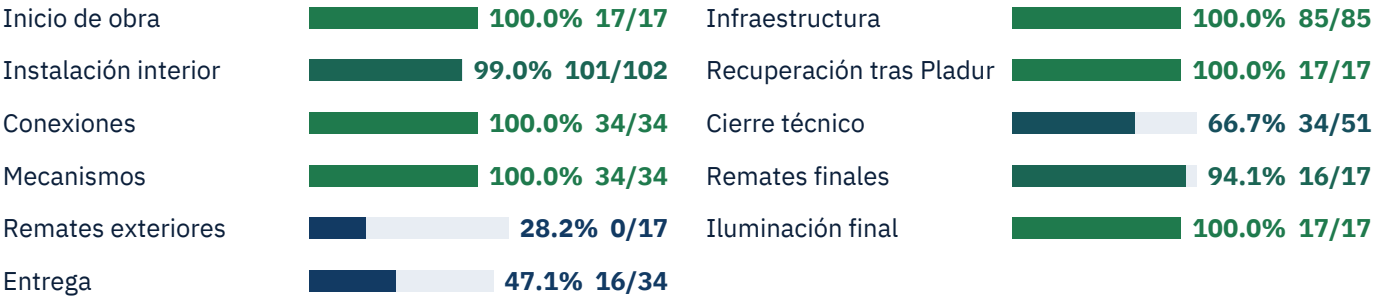


## TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 10 filas, en el orden de ejecución de la base.

| Tajo Sagarde / fase | Avance | Hecho | Pend. |
|---|---|---|---|
| **Termostatos**<br>Instalación interior | 94% | 16/17 | 1 |
| **Cuarto técnico**<br>Cierre técnico | 0% | 0/17 | 17 |
| **Placas y tapas**<br>Remates finales | 94% | 16/17 | 1 |
| **Apliques y enchufes de terraza**<br>Remates exteriores | 28% | 0/17 | 9 |
| **Casquillos y bombillas**<br>Entrega | 94% | 16/17 | 1 |
| **Iluminación de rellanos / ZZCC**<br>Entrega | 0% | 0/17 | 17 |

## CONDICIONANTES

| Condicionante | Afecta |
|---|---|
| **Pintura de zonas comunes**<br>Iluminación de rellanos / ZZCC | 17 |
| **Pintura — segunda mano**<br>Placas y tapas | 1 |

## PRÓXIMOS FRENTES

| Próximo tajo Sagarde | Uds. |
|---|---|
| **Termostatos**<br>Instalación interior | 1 |
| **Apliques y enchufes de terraza**<br>Remates exteriores | 17 |
| **Casquillos y bombillas**<br>Entrega | 1 |

Fuente: base viva de la obra + catálogo de tajos y dependencias · Datos 15/10/2026 · Generado 10/11/2026 22:26

**Montajes Eléctricos Sagarde, S.L.**

# INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


**OBRA:** 2026 MUNGIA ACR NEINOR | **ÁMBITO:** ZR2.1
**Datos:** 15/10/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Neinor Península, S.L.U · Parcelas ZR1.1 y ZR1.2 del PEOU U-41, 48100 Mungia (Bizkaia)

| 87.2% | 84.3% | 527/625 | 2 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| Avance estimado | Terminado estricto | Celdas terminadas | Tajos listos | Tajos condicionados |


**Situación eléctrica:** Sagarde alcanza un **87.2%** de avance estimado y un **84.3%** terminado; avance de -1.3 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 2 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 2 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

## EVOLUCIÓN DEL AVANCE

Cada punto muestra el avance ponderado de la revisión; el marcador final distingue el total de obra cuando existe garaje.

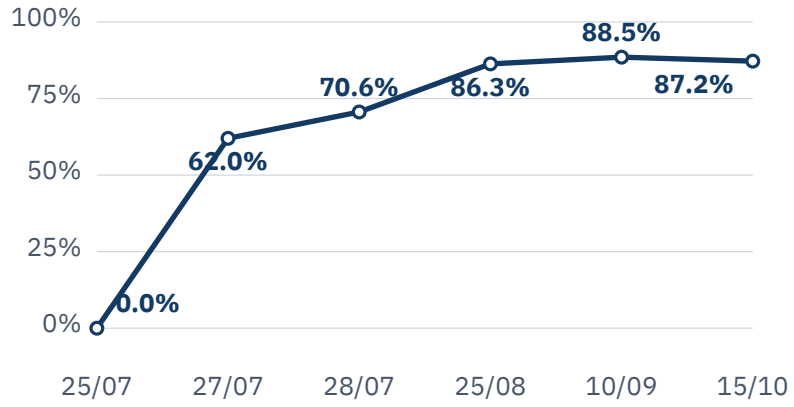


## AVANCE POR PLANTA

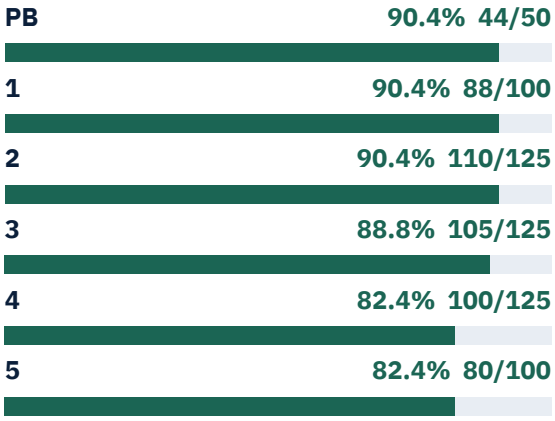


## FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % | 50 a 79 % | 80 a 99 % | 100 %

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inicio de obra | 100.0% 25/25 | Infraestructura | 100.0% 125/125 |
| Instalación interior | 94.0% 141/150 | Recuperación tras Pladur | 100.0% 25/25 |
| Conexiones | 100.0% 50/50 | Cierre técnico | 66.7% 50/75 |
| Mecanismos | 100.0% 50/50 | Remates finales | 56.0% 11/25 |
| Remates exteriores | 60.0% 0/25 | Iluminación final | 100.0% 25/25 |
| Entrega | 50.0% 25/50 | | |

## TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 10 filas, en el orden de ejecución de la base.

| Tajo Sagarde / fase | Avance | Hecho | Pend. |
|---|---|---|---|
| **Termostatos**<br>Instalación interior | 64% | 16/25 | 9 |
| **Cuarto técnico**<br>Cierre técnico | 0% | 0/25 | 25 |
| **Placas y tapas**<br>Remates finales | 56% | 11/25 | 9 |
| **Apliques y enchufes de terraza**<br>Remates exteriores | 60% | 0/25 | 0 |
| **Iluminación de rellanos / ZZCC**<br>Entrega | 0% | 0/25 | 25 |

## CONDICIONANTES

| Condicionante | Afecta |
|---|---|
| **Pintura de zonas comunes**<br>Iluminación de rellanos / ZZCC | 25 |
| **Pintura — segunda mano**<br>Placas y tapas | 14 |

## PRÓXIMOS FRENTES

| Próximo tajo Sagarde | Uds. |
|---|---|
| **Termostatos**<br>Instalación interior | 9 |
| **Apliques y enchufes de terraza**<br>Remates exteriores | 25 |

Fuente: base viva de la obra + catálogo de tajos y dependencias · Datos 15/10/2026 · Generado 10/11/2026 22:26

**Montajes Eléctricos Sagarde, S.L.**
