INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


OBRA: 2026 OLABEAGA BILBAO | **ÁMBITO:** RESUMEN GENERAL (3 PORTALES/BLOQUES)
Datos: 14/10/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Camino de la Ventosa nº 3, Barrio Olabeaga (Basurto-Zorroza), 48013 Bilbao (Bizkaia)

2.3%	0.3%	4/1215	9	47	0/4
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados	Cierre de expediente

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **2.3%** de avance estimado y un **0.3%** terminado; las viviendas avanzan +2.2 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 9 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 12 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

EVOLUCIÓN (VIVIENDAS)

Cada punto muestra el avance ponderado de la revisión; el marcador final distingue el total de obra cuando existe garaje.

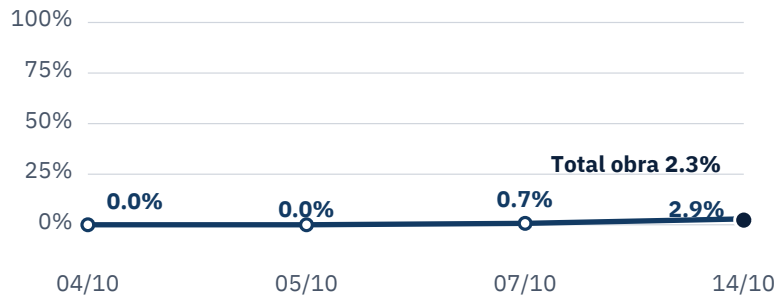

AVANCE POR BLOQUE

PORTAL 1	**0.2% 0/240**
PORTAL 2	**0.3% 0/312**
PORTAL 3	**7.8% 4/288**
GARAJE	**1.5% 0/221**
ZONAS ESPECIALES	**0.0% 0/154**

CIERRE DE EXPEDIENTE

Ensayos instrumentales PENDIENTE	**Inspección OCA** PENDIENTE
CIE / Boletín eléctrico PENDIENTE	**Libro del Edificio** PENDIENTE

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % | 50 a 79 % | 80 a 99 % | 100 %

Inicio de obra	**14.9% 4/35**	Infraestructura	**10.8% 0/175**
Instalación interior	**0.0% 0/306**	Recuperación tras Pladur	**0.0% 0/35**
Conexiones	**0.0% 0/70**	Cierre técnico	**0.0% 0/70**
Mecanismos	**0.0% 0/70**	Remates finales	**0.0% 0/35**
Remates exteriores	**0.0% 0/35**	Iluminación final	**0.0% 0/35**
Entrega	**0.0% 0/70**	Cubierta — Fotovoltaica	**0.0% 0/6**
Cubierta — Antena/pararrayos	**0.0% 0/7**	Instalación interior garaje	**10.6% 0/8**
Equipos	**0.0% 0/156**	Equipos garaje	**7.7% 0/24**
Cuadros	**0.0% 0/65**	Cuartos técnicos garaje	**0.0% 0/4**
Remates garaje	**6.7% 0/9**		

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 6 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Rozas de timbres Inicio de obra	**15%**	4/35	29
Montante eléctrica Infraestructura	**17%**	0/35	20
Montante de telecomunicaciones Infraestructura	**12%**	0/35	26
Montante de servicios comunes Infraestructura	**9%**	0/35	26
Tubeado de zonas comunes Infraestructura	**15%**	0/35	26
Cableado de zonas comunes Infraestructura	**0%**	0/35	35
+60 más · continúan en el mismo orden de ejecución			

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Tabicado Cuadros presentados, Montante de servicio...	114
Pintura — primera mano Mecanizado eléctrico, Telemecanizado	70
+38 más	

PRÓXIMOS FRENTES

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Rozas de timbres Inicio de obra	**12**
Montante eléctrica Infraestructura	**16**
+7 más	

Fuente: base viva de la obra + catálogo de tajos y dependencias · Datos 14/10/2026 · Generado 20/10/2026 20:01

Montajes Eléctricos Sagarde, S.L.

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


OBRA: 2026 OLABEAGA BILBAO | **ÁMBITO:** PORTAL 1
Datos: 14/10/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Camino de la Ventosa nº 3, Barrio Olabeaga (Basurto-Zorroza), 48013 Bilbao (Bizkaia)

0.2%	0.0%	0/306	7	42
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **0.2%** de avance estimado y un **0.0%** terminado; las viviendas avanzan +0.0 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 7 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 12 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

EVOLUCIÓN (VIVIENDAS)

Cada punto muestra el avance ponderado de la revisión; el marcador final distingue el total de obra cuando existe garaje.

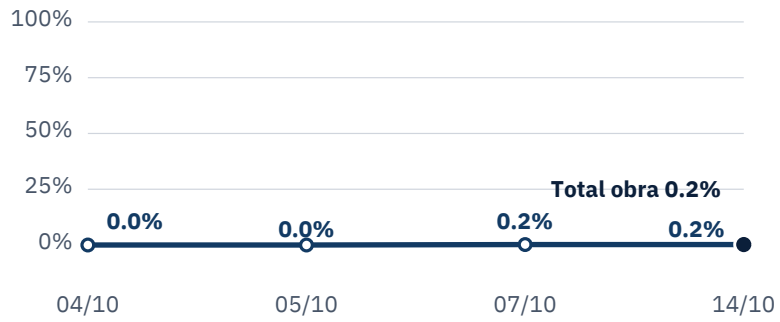

AVANCE POR PLANTA

1ª	1.0%	0/48
2ª	0.0%	0/48
3ª	0.0%	0/48
4ª	0.0%	0/48
PB	0.0%	0/48
Zonas especiales	0.0%	0/66

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % | 50 a 79 % | 80 a 99 % | 100 %

Inicio de obra	0.0%	0/10	Infraestructura	1.0%	0/50
Instalación interior	0.0%	0/80	Recuperación tras Pladur	0.0%	0/10
Conexiones	0.0%	0/20	Cierre técnico	0.0%	0/20
Mecanismos	0.0%	0/20	Remates finales	0.0%	0/10
Remates exteriores	0.0%	0/10	Iluminación final	0.0%	0/10
Entrega	0.0%	0/20	Cubierta — Fotovoltaica	0.0%	0/6
Equipos	0.0%	0/20	Cuadros	0.0%	0/20

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 6 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Rozas de timbres Inicio de obra	0%	0/10	10
Montante eléctrica Infraestructura	5%	0/10	8
Montante de telecomunicaciones Infraestructura	0%	0/10	10
Montante de servicios comunes Infraestructura	0%	0/10	10
Tubeado de zonas comunes Infraestructura	0%	0/10	10
Cableado de zonas comunes Infraestructura	0%	0/10	10
+37 más · continúan en el mismo orden de ejecución			

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura — primera mano Mecanizado eléctrico, Telemecanizado	20
Pintura — segunda mano Casquillos y bombillas, Placas y tapas	20
Pintura (recintos) — 1ª mano Colocación alumbrado fijo (recintos), Col...	14
+32 más	

PRÓXIMOS FRENTES

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Rozas de timbres Inicio de obra	8
Montante eléctrica Infraestructura	8
Montante de telecomunicaciones Infraestructura	8
+4 más	

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


OBRA: 2026 OLABEAGA BILBAO | **ÁMBITO:** PORTAL 2
Datos: 14/10/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Camino de la Ventosa nº 3, Barrio Olabeaga (Basurto-Zorroza), 48013 Bilbao (Bizkaia)

0.3%	0.0%	0/379	2	42
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **0.3%** de avance estimado y un **0.0%** terminado; las viviendas avanzan +0.3 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 2 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 12 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

EVOLUCIÓN (VIVIENDAS)

Cada punto muestra el avance ponderado de la revisión; el marcador final distingue el total de obra cuando existe garaje.

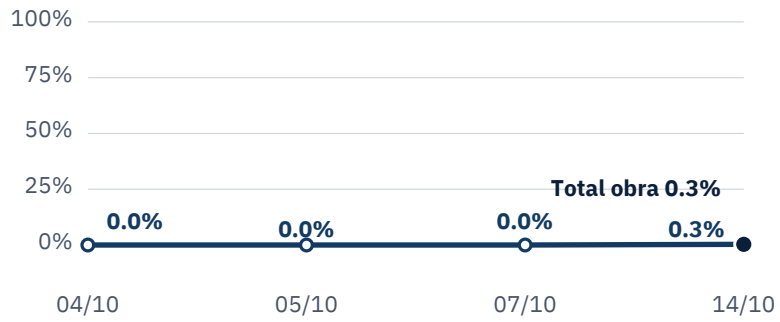

AVANCE POR PLANTA

1ª	1.0%	0/48
2ª	1.0%	0/48
3ª	0.0%	0/48
4ª	0.0%	0/48
DUPLX ATICO	0.0%	0/48
PB	0.0%	0/72
Zonas especiales	0.0%	0/67

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % | 50 a 79 % | 80 a 99 % | 100 %

Inicio de obra	0.0%	0/13	Infraestructura	1.5%	0/65
Instalación interior	0.0%	0/98	Recuperación tras Pladur	0.0%	0/13
Conexiones	0.0%	0/26	Cierre técnico	0.0%	0/26
Mecanismos	0.0%	0/26	Remates finales	0.0%	0/13
Remates exteriores	0.0%	0/13	Iluminación final	0.0%	0/13
Entrega	0.0%	0/26	Cubierta — Antena/pararrayos	0.0%	0/7
Equipos	0.0%	0/20	Cuadros	0.0%	0/20

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 8 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Rozas de timbres Inicio de obra	0%	0/13	13
Montante eléctrica Infraestructura	8%	0/13	9
Montante de telecomunicaciones Infraestructura	0%	0/13	13
Montante de servicios comunes Infraestructura	0%	0/13	13
Tubeado de zonas comunes Infraestructura	0%	0/13	13
Cableado de zonas comunes Infraestructura	0%	0/13	13
Cuadros presentados Instalación interior	0%	0/13	13
Tubeado interior Instalación interior	0%	0/13	13
+36 más · continúan en el mismo orden de ejecución			

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Tabicado Cuadros presentados, Montante de servicio...	78
Pintura — primera mano Mecanizado eléctrico, Telemecanizado	26
Pintura — segunda mano Casquillos y bombillas, Placas y tapas	26
Pintura (recintos) — 1ª mano Colocación alumbrado fijo (recintos), Col...	14
+31 más	

PRÓXIMOS FRENTES

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Colocación de soporte de antena Cubierta — Antena/pararrayos	1
Colocación de soporte de pararrayos Cubierta — Antena/pararrayos	1

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


OBRA: 2026 OLABEAGA BILBAO | **ÁMBITO:** PORTAL 3
Datos: 14/10/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Camino de la Ventosa nº 3, Barrio Olabeaga (Basurto-Zorroza), 48013 Bilbao (Bizkaia)

7.3%	1.3%	4/309	6	37
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **7.3%** de avance estimado y un **1.3%** terminado; las viviendas avanzan +6.0 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 6 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 12 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

EVOLUCIÓN (VIVIENDAS)

Cada punto muestra el avance ponderado de la revisión; el marcador final distingue el total de obra cuando existe garaje.

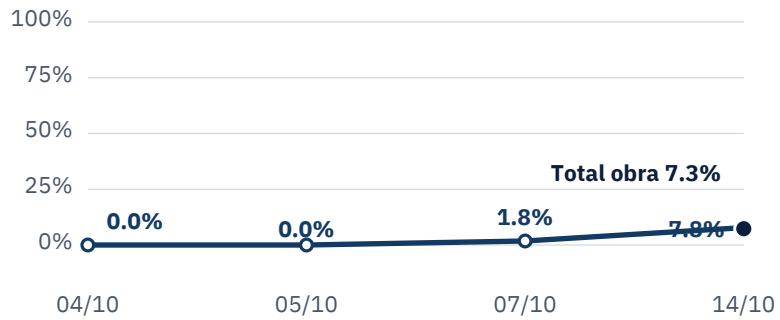

AVANCE POR PLANTA

1ª	12.8%	2/72
2ª	11.3%	2/72
3ª	7.3%	0/72
4ª	0.0%	0/72
Zonas especiales	0.0%	0/21

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % | 50 a 79 % | 80 a 99 % | 100 %

Inicio de obra	43.3%	4/12	Infraestructura	29.0%	0/60
Instalación interior	0.0%	0/80	Recuperación tras Pladur	0.0%	0/12
Conexiones	0.0%	0/24	Cierre técnico	0.0%	0/24
Mecanismos	0.0%	0/24	Remates finales	0.0%	0/12
Remates exteriores	0.0%	0/12	Iluminación final	0.0%	0/12
Entrega	0.0%	0/24	Equipos	0.0%	0/8
Cuadros	0.0%	0/5			

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 6 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Rozas de timbres Inicio de obra	43%	4/12	6
Montante eléctrica Infraestructura	36%	0/12	3
Montante de telecomunicaciones Infraestructura	36%	0/12	3
Montante de servicios comunes Infraestructura	27%	0/12	3
Tubeado de zonas comunes Infraestructura	45%	0/12	3
Cableado de zonas comunes Infraestructura	0%	0/12	12
+31 más · continúan en el mismo orden de ejecución			

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura — primera mano Mecanizado eléctrico, Telemecanizado	24
Pintura — segunda mano Casquillos y bombillas, Placas y tapas	24
Tabicado Cuadros presentados, Montante de servicio...	24
+27 más	

PRÓXIMOS FRENTES

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Rozas de timbres Inicio de obra	4
Montante eléctrica Infraestructura	8
Montante de telecomunicaciones Infraestructura	8
+3 más	

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO

OBRA: 2026 OLABEAGA BILBAO | **ÁMBITO:** GARAJE
Datos: 14/10/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Camino de la Ventosa nº 3, Barrio Olabeaga (Basurto-Zorroza), 48013 Bilbao (Bizkaia)

1.5%	0.0%	0/221	1	28
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **1.5%** de avance estimado y un **0.0%** terminado; avance de +0.5 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 1 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 6 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

Sin cuatro revisiones comparables; composición del último estado medido.



DETALLE POR ZONA

Basuras 2 **0%** · 0/12	**Basuras P1** **0%** · 0/12
Bombas de Achique **0%** · 0/18	**Cuadro General Garaje P1** **0%** · 0/18
Cuarto Ventilacion P3 **0%** · 0/18	**Escalera Garaje P2** **0%** · 0/16
Planta -1 **0%** · 0/10	**Portal 1** **0%** · 0/16
Portal 2 **0%** · 0/16	**Portal 3** **0%** · 0/16
Rampa -1 **0%** · 0/11	**Rampa -2** **0%** · 0/11

+4 más

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % · 50 a 79 % · 80 a 99 % · 100 %

Instalación interior	0.0%	0/48	
Equipos	0.0%	0/108	
Cuadros	0.0%	0/20	
Remates garaje	6.7%	0/9	
Instalación interior garaje	10.6%	0/8	
Equipos garaje	7.7%	0/24	
Cuartos técnicos garaje	0.0%	0/4	

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 10 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Tubeado empotrado Instalación interior	0%	0/14	14
Cableado empotrado Instalación interior	0%	0/14	14
Tubeado visto Instalación interior	0%	0/10	10
Cableado visto Instalación interior	0%	0/10	10
Tubeado de viales Instalación interior garaje	15%	0/4	3
Cableado de viales Instalación interior garaje	6%	0/4	3
Colocación alumbrado fijo (recintos) Equipos	0%	0/16	16
Colocación alumbrado fijo (viales) Equipos garaje	15%	0/4	3
Colocación alumbrado temporizado (recintos) Equipos	0%	0/16	16
Colocación alumbrado temporizado (viales) Equipos garaje	6%	0/4	3
+19 más · continúan en el mismo orden de ejecución			

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura (recintos) — 1ª mano Colocación alumbrado fijo (recintos), Col...	58
Pintura (recintos) — 2ª mano Embornado alumbrado fijo (recintos), Embo...	58
Tabicado (zona común) Derivación de tierra de cuarto técnico, T...	22
Pintura de garaje (viales) — 1ª mano Colocación alumbrado fijo (viales), Coloc...	12
Pintura de garaje (viales) — 2ª mano Embornado alumbrado fijo (viales), Emborn...	12
+14 más	

PRÓXIMOS FRENTES

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Tubeado de viales Instalación interior garaje	4

Fuente: base viva de la obra + catálogo de tajos y dependencias · Datos 14/10/2026 · Generado 20/10/2026 20:01

Montajes Eléctricos Sagarde, S.L.

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO

OBRA: 2026 OLABEAGA BILBAO | **ÁMBITO:** ZONAS ESPECIALES
Datos: 14/10/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Camino de la Ventosa nº 3, Barrio Olabeaga (Basurto-Zorroza), 48013 Bilbao (Bizkaia)

0.0%	0.0%	0/154	3	23
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **0.0%** de avance estimado y un **0.0%** terminado; sin comparación histórica suficiente. **Producción:** 3 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 4 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

Sin cuatro revisiones comparables; composición del último estado medido.



DETALLE POR ZONA

ASEO PISCINAS CUBIERTA
0% · 0/8

Bicicletas
0% · 0/8

Bicicletas (2/3)
0% · 0/8

Centralización de contadores (P1)
0% · 0/13

Centralización de contadores (P2/3)
0% · 0/13

CUADRO E/A (P1)
0% · 0/13

CUADRO E/A (P2/3)
0% · 0/13

CUADRO PISCINA
0% · 0/13

CUADRO SERVICIOS GENERALES
0% · 0/13

Cuarto RITI / Teleco
0% · 0/13

Cuarto RITI / Teleco (2/3)
0% · 0/13

Cubierta
0% · 0/6

+2 más

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % | 50 a 79 % | 80 a 99 % | 100 %

Cubierta — Fotovoltaica	0.0% 0/6	Cubierta — Antena/pararrayos	0.0% 0/7
Instalación interior	0.0% 0/48	Equipos	0.0% 0/48
Cuadros	0.0% 0/45		

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 6 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Instalación de paneles fotovoltaicos Cubierta — Fotovoltaica	0%	0/1	1
Cableado de paneles fotovoltaicos Cubierta — Fotovoltaica	0%	0/1	1
Tierra de paneles fotovoltaicos Cubierta — Fotovoltaica	0%	0/1	1
Cableado de strings hasta equipos Cubierta — Fotovoltaica	0%	0/1	1
Instalación de equipos y protecciones Cubierta — Fotovoltaica	0%	0/1	1
Puesta en marcha de fotovoltaica Cubierta — Fotovoltaica	0%	0/1	1
+20 más · continúan en el mismo orden de ejecución			

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura (recintos) — 1ª mano Colocación alumbrado fijo (recintos), Col...	33
Pintura (recintos) — 2ª mano Embornado alumbrado fijo (recintos), Embo...	33
Tabicado (zona común) Tubeado empotrado, Tubeado y cableado has...	21
+18 más	

PRÓXIMOS FRENTES

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Instalación de paneles fotovoltaicos Cubierta — Fotovoltaica	1
Colocación de soporte de antena Cubierta — Antena/pararrayos	1
Colocación de soporte de pararrayos Cubierta — Antena/pararrayos	1
