# INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


**OBRA:** 2026 BOLUETA ACR | **ÁMBITO:** RESUMEN GENERAL
**Datos:** 27/10/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Neinor Península, S.L.U · Parcela RE A4, Bolueta, 48004 Bilbao (Bizkaia)

| 73.6% | 68.5% | 1683/2458 | 19 | 35 | 0/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Avance estimado | Terminado estricto | Celdas terminadas | Tajos listos | Tajos condicionados | Cierre de expediente |

**Situación eléctrica:** Sagarde alcanza un **73.6%** de avance estimado y un **68.5%** terminado; las viviendas avanzan +1.9 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 19 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 11 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

## EVOLUCIÓN (VIVIENDAS)

Cada punto muestra el avance ponderado de la revisión; el marcador final distingue el total de obra cuando existe garaje.

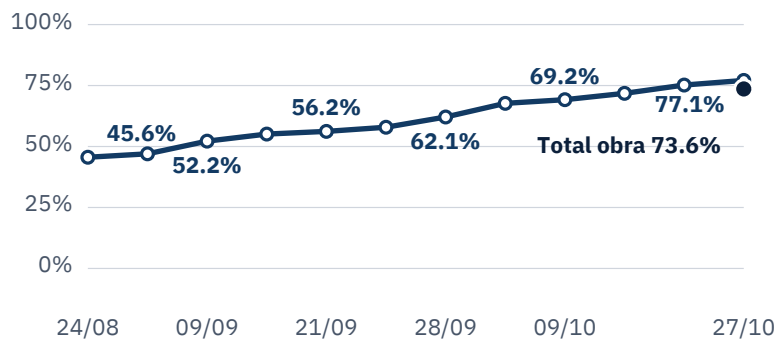


## AVANCE POR BLOQUE

| | |
|---|---|
| **BOLUETA** | **77.1% 1650/2289** |
| **GARAJE** | **43.5% 29/72** |
| **ZONAS ESPECIALES** | **14.0% 4/97** |

## CIERRE DE EXPEDIENTE

| | |
|---|---|
| **Ensayos instrumentales** PENDIENTE | **Inspección OCA** PENDIENTE |
| **CIE / Boletín eléctrico** PENDIENTE | **Libro del Edificio** PENDIENTE |

## FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % | 50 a 79 % | 80 a 99 % | 100 %

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inicio de obra | 94.8% 92/97 | Infraestructura | 93.9% 412/478 |
| Instalación interior | 92.2% 562/616 | Recuperación tras Pladur | 96.8% 92/95 |
| Conexiones | 65.1% 102/190 | Cierre técnico | 58.3% 104/190 |
| Mecanismos | 69.7% 129/190 | Remates finales | 8.4% 8/95 |
| Remates exteriores | 0.0% 0/95 | Iluminación final | 90.1% 82/95 |
| Entrega | 61.1% 75/190 | Cubierta — Antena/pararrayos | 7.1% 0/7 |
| Instalación interior garaje | 100.0% 4/4 | Equipos | 10.3% 4/58 |
| Equipos garaje | 100.0% 12/12 | Cuadros | 21.1% 4/42 |
| Cuartos técnicos garaje | 0.0% 0/1 | Remates garaje | 53.3% 1/3 |

## TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 6 filas, en el orden de ejecución de la base.

| Tajo Sagarde / fase | Avance | Hecho | Pend. |
|---|---|---|---|
| **Rozas de timbres** Inicio de obra | 95% | 92/97 | 5 |
| **Montante eléctrica** Infraestructura | 97% | 92/97 | 0 |
| **Montante de telecomunicaciones** Infraestructura | 97% | 92/97 | 0 |
| **Montante de servicios comunes** Infraestructura | 75% | 39/95 | 0 |
| **Cuadros presentados** Instalación interior | 97% | 94/97 | 3 |
| **Tubeado interior** Instalación interior | 99% | 92/95 | 0 |
| **+42 más · continúan en el mismo orden de ejecución** | | | |

## CONDICIONANTES

| Condicionante | Afecta |
|---|---|
| **Pintura — segunda mano** Casquillos y bombillas, Placas y tapas | 143 |
| **Fachada terminada** Apliques y enchufes de terraza | 95 |
| **Pintura de zonas comunes** Iluminación de rellanos / ZZCC | 41 |
| **+30 más** | |

## PRÓXIMOS FRENTES

| Próximo tajo Sagarde | Uds. |
|---|---|
| **Rozas de timbres** Inicio de obra | 5 |
| **Montante eléctrica** Infraestructura | 5 |
| **+17 más** | |

Fuente: base viva de la obra + catálogo de tajos y dependencias · Datos 27/10/2026 · Generado 01/11/2026 08:17

**Montajes Eléctricos Sagarde, S.L.**

# INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


**OBRA:** 2026 BOLUETA ACR | **ÁMBITO:** GARAJE
**Datos:** 27/10/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Neinor Península, S.L.U · Parcela RE A4, Bolueta, 48004 Bilbao (Bizkaia)

| 43.5% | 40.3% | 29/72 | 4 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Avance estimado | Terminado estricto | Celdas terminadas | Tajos listos | Tajos condicionados |

**Situación eléctrica:** Sagarde alcanza un **43.5%** de avance estimado y un **40.3%** terminado; avance de +3.7 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 4 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 3 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

## ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

Sin cuatro revisiones comparables; composición del último estado medido.



Terminado X: 29 · En marcha M: 1 · Iniciado /: 7 · Pendiente: 35

## DETALLE POR ZONA

| | |
|---|---|
| **Escalera Principal** 2% · 0/12 | **Escalera 2** 4% · 0/12 |
| **Trasteros -1** 25% · 0/4 | **Cuadro General Garaje** 27% · 4/15 |
| **bombas de achique** 67% · 4/6 | **planta -1** 86% · 8/10 |
| **planta -2** 100% · 9/9 | **Trasteros -2** 100% · 4/4 |

## FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % · 50 a 79 % · 80 a 99 % · 100 %

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Instalación interior | 43.8% | 6/16 | Instalación interior garaje | 100.0% | 4/4 |
| Equipos | 17.6% | 4/27 | Equipos garaje | 100.0% | 12/12 |
| Cuadros | 22.2% | 2/9 | Cuartos técnicos garaje | 0.0% | 0/1 |
| Remates garaje | 53.3% | 1/3 | | | |

## TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 10 filas, en el orden de ejecución de la base.

| Tajo Sagarde / fase | Avance | Hecho | Pend. |
|---|---|---|---|
| **Tubeado visto** Instalación interior | 47% | 3/8 | 2 |
| **Cableado visto** Instalación interior | 41% | 3/8 | 4 |
| **Colocación alumbrado fijo (recintos)** Equipos | 18% | 1/7 | 5 |
| **Colocación alumbrado temporizado (recintos)** Equipos | 0% | 0/1 | 1 |
| **Colocación luminarias de emergencia (recintos)** Equipos | 5% | 0/5 | 4 |
| **Colocación de enchufe de cuarto técnico** Equipos | 0% | 0/1 | 1 |
| **Tubeado y cableado hasta cuadro secundario** Cuadros | 50% | 1/2 | 1 |
| **Colocación y mecanizado de cuadro propio** Cuadros | 0% | 0/2 | 2 |
| **Embornado de cuadro propio** Cuadros | 0% | 0/1 | 1 |
| **Rotulación de cuadro propio** Cuadros | 0% | 0/2 | 2 |
| **+7 más · continúan en el mismo orden de ejecución** | | | |

## CONDICIONANTES

| Condicionante | Afecta |
|---|---|
| **Pintura (recintos) — 1ª mano** Colocación alumbrado fijo (recintos), Col... | 15 |
| **Pintura (recintos) — 2ª mano** Embornado alumbrado fijo (recintos), Embo... | 11 |
| **Lucido** Tubeado visto | 5 |
| **Colocación alumbrado fijo (recintos)** Embornado alumbrado fijo (recintos) | 5 |
| **+6 más** | |

## PRÓXIMOS FRENTES

| Próximo tajo Sagarde | Uds. |
|---|---|
| **Tubeado y cableado hasta cuadro secundario** Cuadros | 1 |
| **Derivación de tierra de cuarto técnico** Cuartos técnicos garaje | 1 |
| **Alimentación de cuadro de puerta de acceso** Remates garaje | 1 |
| **Preinstalación vehículo eléctrico (IRVE)** Remates garaje | 1 |

# INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO

**OBRA:** 2026 BOLUETA ACR | **ÁMBITO:** ZONAS ESPECIALES
**Datos:** 27/10/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Neinor Península, S.L.U · Parcela RE A4, Bolueta, 48004 Bilbao (Bizkaia)

| 14.0% | 4.1% | 4/97 | 6 | 18 |
|---|---|---|---|---|
| Avance estimado | Terminado estricto | Celdas terminadas | Tajos listos | Tajos condicionados |

**Situación eléctrica:** Sagarde alcanza un **14.0%** de avance estimado y un **4.1%** terminado; sin comparación histórica suficiente. **Producción:** 6 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 4 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

## ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

Sin cuatro revisiones comparables; composición del último estado medido.




## DETALLE POR ZONA

- **Basuras** — 0% · 0/8
- **Cuarto Aerotermia** — 0% · 0/13
- **Instalaciones generales** — 0% · 0/13
- **Sala de calderas** — 7% · 0/9
- **Cubierta** — 7% · 0/7
- **Cuarto RITI / Teleco** — 11% · 0/11
- **Centralización de contadores** — 15% · 1/11
- **Centralización de contadores P24** — 23% · 0/12
- **Cuarto RITS P24** — 53% · 3/13

## FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % | 50 a 79 % | 80 a 99 % | 100 %

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cubierta — Antena/pararrayos | 7.1% | 0/7 | Instalación interior | 19.2% | 2/26 |
| Equipos | 3.9% | 0/31 | Cuadros | 20.8% | 2/33 |

## TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 10 filas, en el orden de ejecución de la base.

| Tajo Sagarde / fase | Avance | Hecho | Pend. |
|---|---|---|---|
| **Colocación de soporte de antena** Cubierta — Antena/pararrayos | 25% | 0/1 | 0 |
| **Colocación de soporte de pararrayos** Cubierta — Antena/pararrayos | 25% | 0/1 | 0 |
| **Instalación de antena** Cubierta — Antena/pararrayos | 0% | 0/1 | 1 |
| **Instalación de pararrayos** Cubierta — Antena/pararrayos | 0% | 0/1 | 1 |
| **Cableado de antena** Cubierta — Antena/pararrayos | 0% | 0/1 | 1 |
| **Cableado de pararrayos** Cubierta — Antena/pararrayos | 0% | 0/1 | 1 |
| **Tierra de antena** Cubierta — Antena/pararrayos | 0% | 0/1 | 1 |
| **Tubeado empotrado** Instalación interior | 26% | 0/7 | 4 |
| **Cableado empotrado** Instalación interior | 17% | 0/7 | 5 |
| **Tubeado visto** Instalación interior | 17% | 1/6 | 5 |
| **+10 más · continúan en el mismo orden de ejecución** | | | |

## CONDICIONANTES

| Condicionante | Afecta |
|---|---|
| **Pintura (recintos) — 1ª mano** Colocación alumbrado fijo (recintos), Col... | 22 |
| **Pintura (recintos) — 2ª mano** Embornado alumbrado fijo (recintos), Embo... | 21 |
| **Tabicado (zona común)** Tubeado empotrado, Tubeado y cableado has... | 5 |
| **Lucido** Tubeado visto | 3 |
| **+12 más** | |

## PRÓXIMOS FRENTES

| Próximo tajo Sagarde | Uds. |
|---|---|
| **Colocación de soporte de antena** Cubierta — Antena/pararrayos | 1 |
| **Colocación de soporte de pararrayos** Cubierta — Antena/pararrayos | 1 |
| **Tubeado empotrado** Instalación interior | 4 |
| **Tubeado visto** Instalación interior | 2 |
| **+2 más** | |
