INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


OBRA: 2026 OLABEAGA BILBAO | **ÁMBITO:** RESUMEN GENERAL (3 PORTALES/BLOQUES)
Datos: 27/10/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
GRUPO EIBAR · Camino de la Ventosa nº 3, Barrio Olabeaga (Basurto-Zorroza), 48013 Bilbao (Bizkaia)...

6.6%	4.0%	47/1181	13	47	0/4
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados	Cierre de expediente

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **6.6%** de avance estimado y un **4.0%** terminado; las viviendas avanzan +1.9 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 13 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 12 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

EVOLUCIÓN (VIVIENDAS)

Cada punto muestra el avance ponderado de la revisión; el marcador final distingue el total de obra cuando existe garaje.

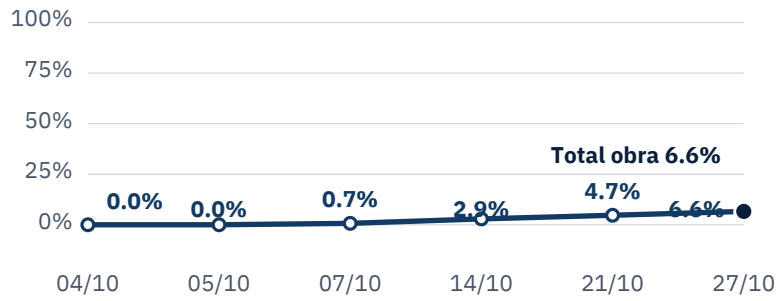

AVANCE POR BLOQUE

PORTAL 1	0.2% 0/240
PORTAL 2	4.7% 4/294
PORTAL 3	13.8% 23/288
GARAJE	11.8% 20/205
ZONAS ESPECIALES	0.0% 0/154

CIERRE DE EXPEDIENTE

Ensayos instrumentales PENDIENTE	**Inspección OCA** PENDIENTE
CIE / Boletín eléctrico PENDIENTE	**Libro del Edificio** PENDIENTE

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % · 50 a 79 % · 80 a 99 % · 100 %

Inicio de obra	33.1% 8/35	Infraestructura	17.8% 10/175
Instalación interior	3.9% 9/293	Recuperación tras Pladur	0.0% 0/32
Conexiones	0.0% 0/70	Cierre técnico	0.0% 0/64
Mecanismos	0.0% 0/70	Remates finales	0.0% 0/35
Remates exteriores	0.0% 0/35	Iluminación final	0.0% 0/35
Entrega	0.0% 0/70	Cubierta — Fotovoltaica	0.0% 0/6
Cubierta — Antena/pararrayos	0.0% 0/7	Instalación interior garaje	65.6% 5/8
Equipos	0.0% 0/152	Equipos garaje	67.2% 14/23
Cuadros	1.9% 0/64	Cuartos técnicos garaje	0.0% 0/3
Remates garaje	55.0% 1/4		

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 6 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Rozas de timbres Inicio de obra	33%	8/35	21
Montante eléctrica Infraestructura	28%	5/35	18
Montante de telecomunicaciones Infraestructura	26%	5/35	20
Montante de servicios comunes Infraestructura	12%	0/35	22
Tubeado de zonas comunes Infraestructura	22%	0/35	22
Cableado de zonas comunes Infraestructura	0%	0/35	35
+59 más · continúan en el mismo orden de ejecución			

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Tabicado Cuadros presentados, Montante de servicio...	74
Pintura — primera mano Mecanizado eléctrico, Telemecanizado	70
+38 más	

PRÓXIMOS FRENTES

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Rozas de timbres Inicio de obra	16
Montante eléctrica Infraestructura	18
+11 más	

Fuente: base viva de la obra + catálogo de tajos y dependencias · Datos 27/10/2026 · Generado 01/11/2026 08:17

Montajes Eléctricos Sagarde, S.L.

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


OBRA: 2026 OLABEAGA BILBAO | **ÁMBITO:** PORTAL 1
Datos: 27/10/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
GRUPO EIBAR · Camino de la Ventosa nº 3, Barrio Olabeaga (Basurto-Zorroza), 48013 Bilbao (Bizkaia)...

0.2%	0.0%	0/306	8	42
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **0.2%** de avance estimado y un **0.0%** terminado; las viviendas avanzan +0.0 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 8 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 12 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

EVOLUCIÓN (VIVIENDAS)

Cada punto muestra el avance ponderado de la revisión; el marcador final distingue el total de obra cuando existe garaje.

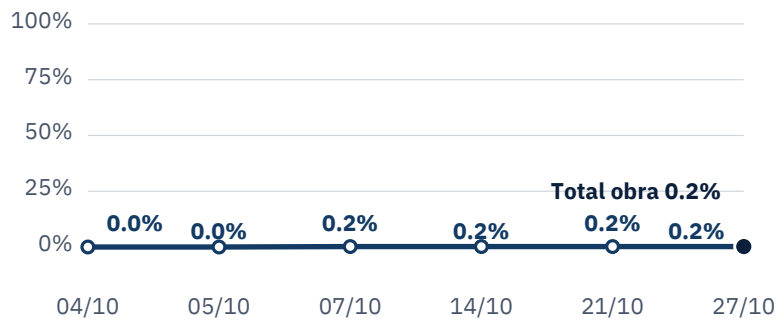

AVANCE POR PLANTA

1ª	1.0%	0/48
2ª	0.0%	0/48
3ª	0.0%	0/48
4ª	0.0%	0/48
PB	0.0%	0/48
Zonas especiales	0.0%	0/66

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % | 50 a 79 % | 80 a 99 % | 100 %

Inicio de obra	0.0%	0/10	Infraestructura	1.0%	0/50
Instalación interior	0.0%	0/80	Recuperación tras Pladur	0.0%	0/10
Conexiones	0.0%	0/20	Cierre técnico	0.0%	0/20
Mecanismos	0.0%	0/20	Remates finales	0.0%	0/10
Remates exteriores	0.0%	0/10	Iluminación final	0.0%	0/10
Entrega	0.0%	0/20	Cubierta — Fotovoltaica	0.0%	0/6
Equipos	0.0%	0/20	Cuadros	0.0%	0/20

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 6 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Rozas de timbres Inicio de obra	0%	0/10	10
Montante eléctrica Infraestructura	5%	0/10	8
Montante de telecomunicaciones Infraestructura	0%	0/10	10
Montante de servicios comunes Infraestructura	0%	0/10	10
Tubeado de zonas comunes Infraestructura	0%	0/10	10
Cableado de zonas comunes Infraestructura	0%	0/10	10
+37 más · continúan en el mismo orden de ejecución			

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura — primera mano Mecanizado eléctrico, Telemecanizado	20
Pintura — segunda mano Casquillos y bombillas, Placas y tapas	20
Pintura (recintos) — 1ª mano Colocación alumbrado fijo (recintos), Col...	14
+32 más	

PRÓXIMOS FRENTES

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Rozas de timbres Inicio de obra	8
Montante eléctrica Infraestructura	8
Montante de telecomunicaciones Infraestructura	8
+5 más	

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


OBRA: 2026 OLABEAGA BILBAO | **ÁMBITO:** PORTAL 2
Datos: 27/10/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
GRUPO EIBAR · Camino de la Ventosa nº 3, Barrio Olabeaga (Basurto-Zorroza), 48013 Bilbao (Bizkaia)...

3.8%	1.1%	4/361	10	42
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **3.8%** de avance estimado y un **1.1%** terminado; las viviendas avanzan +0.9 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 10 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 12 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

EVOLUCIÓN (VIVIENDAS)

Cada punto muestra el avance ponderado de la revisión; el marcador final distingue el total de obra cuando existe garaje.

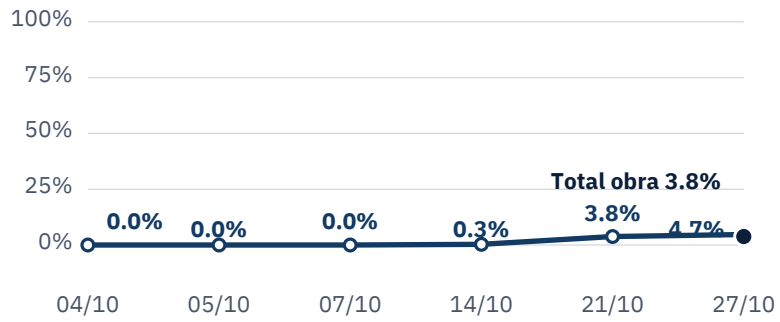

AVANCE POR PLANTA

1ª	12.1%	0/48
2ª	14.4%	4/48
3ª	2.1%	0/48
4ª	0.0%	0/48
DUPLX ATICO	0.0%	0/48
PB	0.0%	0/54
Zonas especiales	0.0%	0/67

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % | 50 a 79 % | 80 a 99 % | 100 %

Inicio de obra	18.5%	0/13	
Instalación interior	0.6%	0/89	
Conexiones	0.0%	0/26	
Mecanismos	0.0%	0/26	
Remates exteriores	0.0%	0/13	
Entrega	0.0%	0/26	
Equipos	0.0%	0/20	
Infraestructura	16.6%	4/65	
Recuperación tras Pladur	0.0%	0/10	
Cierre técnico	0.0%	0/20	
Remates finales	0.0%	0/13	
Iluminación final	0.0%	0/13	
Cubierta — Antena/pararrayos	0.0%	0/7	
Cuadros	0.0%	0/20	

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 6 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Rozas de timbres Inicio de obra	18%	0/13	9
Montante eléctrica Infraestructura	28%	2/13	7
Montante de telecomunicaciones Infraestructura	28%	2/13	7
Montante de servicios comunes Infraestructura	8%	0/13	9
Tubeado de zonas comunes Infraestructura	18%	0/13	9
Cableado de zonas comunes Infraestructura	0%	0/13	13
+38 más · continúan en el mismo orden de ejecución			

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Tabicado Cuadros presentados, Montante de servicio...	40
Pintura — primera mano Mecanizado eléctrico, Telemecanizado	26
Pintura — segunda mano Casquillos y bombillas, Placas y tapas	26
+32 más	

PRÓXIMOS FRENTES

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Rozas de timbres Inicio de obra	6
Montante eléctrica Infraestructura	5
Montante de telecomunicaciones Infraestructura	5
+7 más	

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


OBRA: 2026 OLABEAGA BILBAO | **ÁMBITO:** PORTAL 3
Datos: 27/10/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
GRUPO EIBAR · Camino de la Ventosa nº 3, Barrio Olabeaga (Basurto-Zorroza), 48013 Bilbao (Bizkaia)...

12.9%	7.4%	23/309	10	37
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **12.9%** de avance estimado y un **7.4%** terminado; las viviendas avanzan +4.3 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 10 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 12 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

EVOLUCIÓN (VIVIENDAS)

Cada punto muestra el avance ponderado de la revisión; el marcador final distingue el total de obra cuando existe garaje.

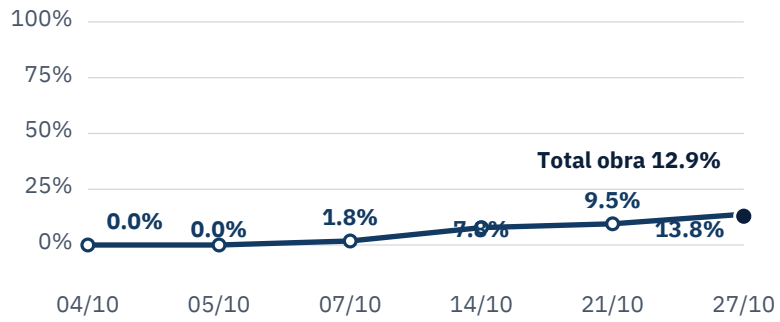

AVANCE POR PLANTA

1ª	32.5%	18/72
2ª	12.7%	3/72
3ª	7.3%	0/72
4ª	2.8%	2/72
Zonas especiales	0.0%	0/21

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % | 50 a 79 % | 80 a 99 % | 100 %

Inicio de obra	76.7%	8/12	Infraestructura	33.0%	6/60
Instalación interior	13.5%	9/80	Recuperación tras Pladur	0.0%	0/12
Conexiones	0.0%	0/24	Cierre técnico	0.0%	0/24
Mecanismos	0.0%	0/24	Remates finales	0.0%	0/12
Remates exteriores	0.0%	0/12	Iluminación final	0.0%	0/12
Entrega	0.0%	0/24	Equipos	0.0%	0/8
Cuadros	0.0%	0/5			

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 6 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Rozas de timbres Inicio de obra	77%	8/12	2
Montante eléctrica Infraestructura	46%	3/12	3
Montante de telecomunicaciones Infraestructura	46%	3/12	3
Montante de servicios comunes Infraestructura	27%	0/12	3
Tubeado de zonas comunes Infraestructura	45%	0/12	3
Cableado de zonas comunes Infraestructura	0%	0/12	12
+31 más · continúan en el mismo orden de ejecución			

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura — primera mano Mecanizado eléctrico, Telemecanizado	24
Pintura — segunda mano Casquillos y bombillas, Placas y tapas	24
Tabicado Cuadros presentados, Montante de servicio...	22
+27 más	

PRÓXIMOS FRENTES

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Rozas de timbres Inicio de obra	2
Montante eléctrica Infraestructura	5
Montante de telecomunicaciones Infraestructura	5
+7 más	

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


OBRA: 2026 OLABEAGA BILBAO | **ÁMBITO:** GARAJE
Datos: 27/10/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
GRUPO EIBAR · Camino de la Ventosa nº 3, Barrio Olabeaga (Basurto-Zorroza), 48013 Bilbao (Bizkaia)...

11.8%	9.8%	20/205	4	25
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **11.8%** de avance estimado y un **9.8%** terminado; avance de +3.0 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 4 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 6 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

EVOLUCIÓN DEL AVANCE

Cada punto muestra el avance ponderado de la revisión; el marcador final distingue el total de obra cuando existe garaje.

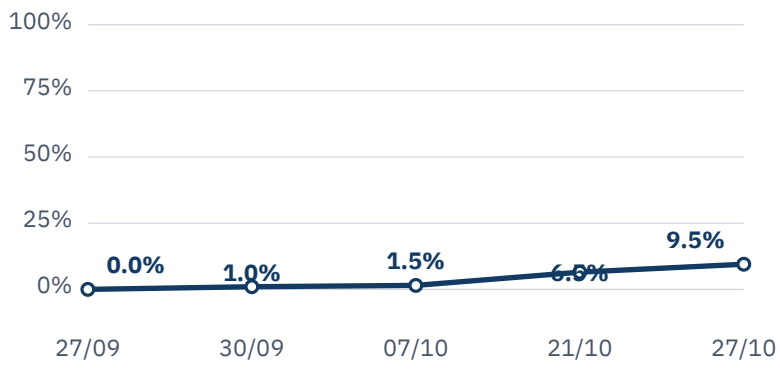

DETALLE POR ZONA

Basuras 2 **0%** · 0/12	**Basuras P1** **0%** · 0/12
Cuadro General Garaje P1 **0%** · 0/18	**Cuarto Ventilacion P3** **0%** · 0/18
Escalera Garaje P2 **0%** · 0/16	**Portal 1** **0%** · 0/16
Portal 2 **0%** · 0/16	**Portal 3** **0%** · 0/16
Rampa -1 **0%** · 0/8	**Sala Hidraulica** **0%** · 0/18
Trasteros -1 **0%** · 0/10	**Trasteros -2** **0%** · 0/10

+4 más

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % | 50 a 79 % | 80 a 99 % | 100 %

Instalación interior	0.0%	0/44	
Equipos	0.0%	0/104	
Cuadros	6.3%	0/19	
Remates garaje	55.0%	1/4	
Instalación interior garaje	65.6%	5/8	
Equipos garaje	67.2%	14/23	
Cuartos técnicos garaje	0.0%	0/3	

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 6 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Tubeado empotrado Instalación interior	0%	0/13	13
Cableado empotrado Instalación interior	0%	0/13	13
Tubeado visto Instalación interior	0%	0/9	9
Cableado visto Instalación interior	0%	0/9	9
Tubeado de viales Instalación interior garaje	75%	3/4	1
Cableado de viales Instalación interior garaje	56%	2/4	1
+22 más · continúan en el mismo orden de ejecución			

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura (recintos) — 2ª mano Embornado alumbrado fijo (recintos), Embo...	56
Pintura (recintos) — 1ª mano Colocación alumbrado fijo (recintos), Col...	55
Tabicado (zona común) Derivación de tierra de cuarto técnico, T...	20
+16 más	

PRÓXIMOS FRENTES

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Tubeado de viales Instalación interior garaje	1
Cableado de viales Instalación interior garaje	1
Alimentación de cuadro de puerta de acceso Remates garaje	1
+1 más	

Fuente: base viva de la obra + catálogo de tajos y dependencias · Datos 27/10/2026 · Generado 01/11/2026 08:17

Montajes Eléctricos Sagarde, S.L.

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO

OBRA: 2026 OLABEAGA BILBAO | **ÁMBITO:** ZONAS ESPECIALES
Datos: 27/10/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
GRUPO EIBAR · Camino de la Ventosa nº 3, Barrio Olabeaga (Basurto-Zorroza), 48013 Bilbao (Bizkaia)...

0.0%	0.0%	0/154	3	23
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **0.0%** de avance estimado y un **0.0%** terminado; sin comparación histórica suficiente. **Producción:** 3 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 4 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

Sin cuatro revisiones comparables; composición del último estado medido.



DETALLE POR ZONA

ASEO PISCINAS CUBIERTA
0% · 0/8

Bicicletas
0% · 0/8

Bicicletas (2/3)
0% · 0/8

Centralización de contadores (P1)
0% · 0/13

Centralización de contadores (P2/3)
0% · 0/13

CUADRO E/A (P1)
0% · 0/13

CUADRO E/A (P2/3)
0% · 0/13

CUADRO PISCINA
0% · 0/13

CUADRO SERVICIOS GENERALES
0% · 0/13

Cuarto RITI / Teleco
0% · 0/13

Cuarto RITI / Teleco (2/3)
0% · 0/13

Cubierta
0% · 0/6

+2 más

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % | 50 a 79 % | 80 a 99 % | 100 %

Cubierta — Fotovoltaica	0.0% 0/6	Cubierta — Antena/pararrayos	0.0% 0/7
Instalación interior	0.0% 0/48	Equipos	0.0% 0/48
Cuadros	0.0% 0/45		

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 6 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Instalación de paneles fotovoltaicos Cubierta — Fotovoltaica	0%	0/1	1
Cableado de paneles fotovoltaicos Cubierta — Fotovoltaica	0%	0/1	1
Tierra de paneles fotovoltaicos Cubierta — Fotovoltaica	0%	0/1	1
Cableado de strings hasta equipos Cubierta — Fotovoltaica	0%	0/1	1
Instalación de equipos y protecciones Cubierta — Fotovoltaica	0%	0/1	1
Puesta en marcha de fotovoltaica Cubierta — Fotovoltaica	0%	0/1	1
+20 más · continúan en el mismo orden de ejecución			

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura (recintos) — 1ª mano Colocación alumbrado fijo (recintos), Col...	33
Pintura (recintos) — 2ª mano Embornado alumbrado fijo (recintos), Embo...	33
Tabicado (zona común) Tubeado empotrado, Tubeado y cableado has...	21
+18 más	

PRÓXIMOS FRENTES

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Instalación de paneles fotovoltaicos Cubierta — Fotovoltaica	1
Colocación de soporte de antena Cubierta — Antena/pararrayos	1
Colocación de soporte de pararrayos Cubierta — Antena/pararrayos	1
