INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


OBRA: 2026 OLABEAGA BILBAO | **ÁMBITO:** RESUMEN GENERAL (3 PORTALES/BLOQUES)
Datos: 21/10/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
GRUPO EIBAR · Camino de la Ventosa nº 3, Barrio Olabeaga (Basurto-Zorroza), 48013 Bilbao (Bizkaia)...

4.7%	2.0%	24/1198	11	47	0/4
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados	Cierre de expediente

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **4.7%** de avance estimado y un **2.0%** terminado; las viviendas avanzan +1.8 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 11 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 12 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

EVOLUCIÓN (VIVIENDAS)

Cada punto muestra el avance ponderado de la revisión; el marcador final distingue el total de obra cuando existe garaje.

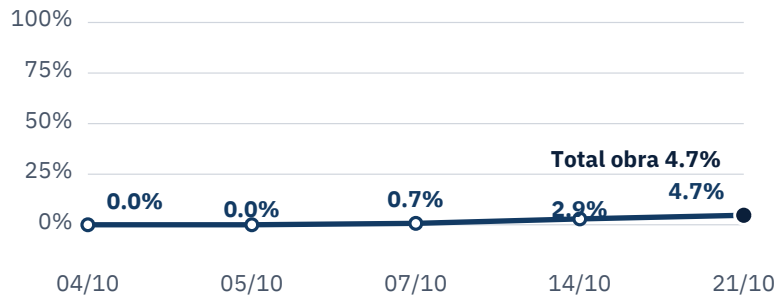

AVANCE POR BLOQUE

PORTAL 1	**0.2% 0/240**
PORTAL 2	**3.8% 4/312**
PORTAL 3	**9.5% 8/288**
GARAJE	**7.8% 12/204**
ZONAS ESPECIALES	**0.0% 0/154**

CIERRE DE EXPEDIENTE

Ensayos instrumentales PENDIENTE	**Inspección OCA** PENDIENTE
CIE / Boletín eléctrico PENDIENTE	**Libro del Edificio** PENDIENTE

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % · 50 a 79 % · 80 a 99 % · 100 %

Inicio de obra	**33.1% 8/35**	Infraestructura	**15.7% 4/175**
Instalación interior	**0.2% 0/302**	Recuperación tras Pladur	**0.0% 0/35**
Conexiones	**0.0% 0/70**	Cierre técnico	**0.0% 0/70**
Mecanismos	**0.0% 0/70**	Remates finales	**0.0% 0/35**
Remates exteriores	**0.0% 0/35**	Iluminación final	**0.0% 0/35**
Entrega	**0.0% 0/70**	Cubierta — Fotovoltaica	**0.0% 0/6**
Cubierta — Antena/pararrayos	**0.0% 0/7**	Instalación interior garaje	**51.2% 3/8**
Equipos	**0.0% 0/152**	Equipos garaje	**41.3% 9/23**
Cuadros	**1.9% 0/64**	Cuartos técnicos garaje	**0.0% 0/3**
Remates garaje	**40.0% 0/3**		

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 6 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Rozas de timbres Inicio de obra	**33%**	8/35	21
Montante eléctrica Infraestructura	**24%**	2/35	18
Montante de telecomunicaciones Infraestructura	**23%**	2/35	20
Montante de servicios comunes Infraestructura	**12%**	0/35	22
Tubeado de zonas comunes Infraestructura	**19%**	0/35	24
Cableado de zonas comunes Infraestructura	**0%**	0/35	35
+59 más · continúan en el mismo orden de ejecución			

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Tabicado Cuadros presentados, Montante de servicio...	74
Pintura — primera mano Mecanizado eléctrico, Telemecanizado	70
+38 más	

PRÓXIMOS FRENTES

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Rozas de timbres Inicio de obra	16
Montante eléctrica Infraestructura	21
+9 más	

Fuente: base viva de la obra + catálogo de tajos y dependencias · Datos 21/10/2026 · Generado 27/10/2026 17:41

Montajes Eléctricos Sagarde, S.L.

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


OBRA: 2026 OLABEAGA BILBAO | **ÁMBITO:** PORTAL 1
Datos: 21/10/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
GRUPO EIBAR · Camino de la Ventosa nº 3, Barrio Olabeaga (Basurto-Zorroza), 48013 Bilbao (Bizkaia)...

0.2%	0.0%	0/306	7	42
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **0.2%** de avance estimado y un **0.0%** terminado; las viviendas avanzan +0.0 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 7 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 12 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

EVOLUCIÓN (VIVIENDAS)

Cada punto muestra el avance ponderado de la revisión; el marcador final distingue el total de obra cuando existe garaje.

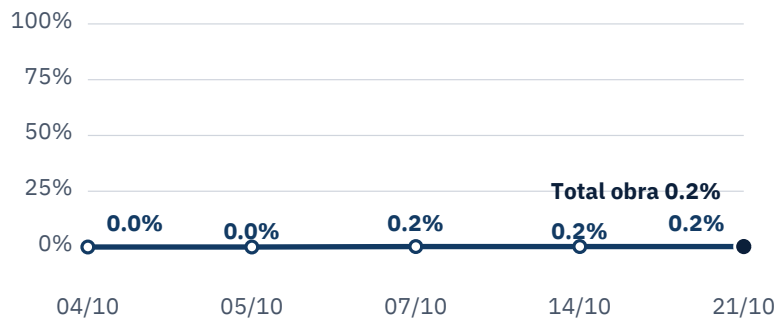

AVANCE POR PLANTA

1ª	1.0%	0/48
2ª	0.0%	0/48
3ª	0.0%	0/48
4ª	0.0%	0/48
PB	0.0%	0/48
Zonas especiales	0.0%	0/66

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % | 50 a 79 % | 80 a 99 % | 100 %

Inicio de obra	0.0%	0/10	Infraestructura	1.0%	0/50
Instalación interior	0.0%	0/80	Recuperación tras Pladur	0.0%	0/10
Conexiones	0.0%	0/20	Cierre técnico	0.0%	0/20
Mecanismos	0.0%	0/20	Remates finales	0.0%	0/10
Remates exteriores	0.0%	0/10	Iluminación final	0.0%	0/10
Entrega	0.0%	0/20	Cubierta — Fotovoltaica	0.0%	0/6
Equipos	0.0%	0/20	Cuadros	0.0%	0/20

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 6 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Rozas de timbres Inicio de obra	0%	0/10	10
Montante eléctrica Infraestructura	5%	0/10	8
Montante de telecomunicaciones Infraestructura	0%	0/10	10
Montante de servicios comunes Infraestructura	0%	0/10	10
Tubeado de zonas comunes Infraestructura	0%	0/10	10
Cableado de zonas comunes Infraestructura	0%	0/10	10
+37 más · continúan en el mismo orden de ejecución			

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura — primera mano Mecanizado eléctrico, Telemecanizado	20
Pintura — segunda mano Casquillos y bombillas, Placas y tapas	20
Pintura (recintos) — 1ª mano Colocación alumbrado fijo (recintos), Col...	14
+32 más	

PRÓXIMOS FRENTES

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Rozas de timbres Inicio de obra	8
Montante eléctrica Infraestructura	8
Montante de telecomunicaciones Infraestructura	8
+4 más	

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


OBRA: 2026 OLABEAGA BILBAO | **ÁMBITO:** PORTAL 2
Datos: 21/10/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
GRUPO EIBAR · Camino de la Ventosa nº 3, Barrio Olabeaga (Basurto-Zorroza), 48013 Bilbao (Bizkaia)...

3.2%	1.1%	4/379	9	42
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **3.2%** de avance estimado y un **1.1%** terminado; las viviendas avanzan +3.5 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 9 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 12 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

EVOLUCIÓN (VIVIENDAS)

Cada punto muestra el avance ponderado de la revisión; el marcador final distingue el total de obra cuando existe garaje.

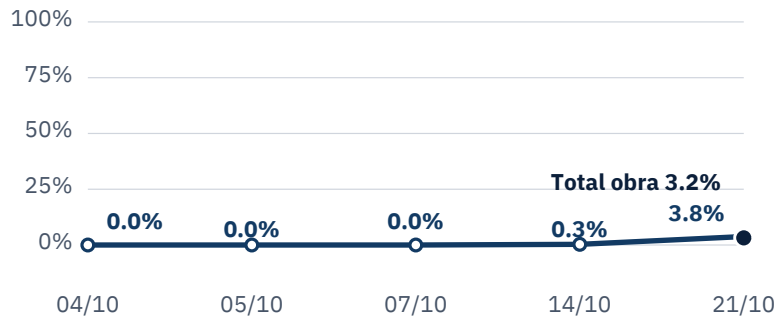

AVANCE POR PLANTA

1ª	8.5%	0/48
2ª	14.4%	4/48
3ª	2.1%	0/48
4ª	0.0%	0/48
DUPLX ATICO	0.0%	0/48
PB	0.0%	0/72
Zonas especiales	0.0%	0/67

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % | 50 a 79 % | 80 a 99 % | 100 %

Inicio de obra	18.5%	0/13	Infraestructura	14.8%	4/65
Instalación interior	0.0%	0/98	Recuperación tras Pladur	0.0%	0/13
Conexiones	0.0%	0/26	Cierre técnico	0.0%	0/26
Mecanismos	0.0%	0/26	Remates finales	0.0%	0/13
Remates exteriores	0.0%	0/13	Iluminación final	0.0%	0/13
Entrega	0.0%	0/26	Cubierta — Antena/pararrayos	0.0%	0/7
Equipos	0.0%	0/20	Cuadros	0.0%	0/20

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 6 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Rozas de timbres Inicio de obra	18%	0/13	9
Montante eléctrica Infraestructura	28%	2/13	7
Montante de telecomunicaciones Infraestructura	28%	2/13	7
Montante de servicios comunes Infraestructura	8%	0/13	9
Tubeado de zonas comunes Infraestructura	9%	0/13	11
Cableado de zonas comunes Infraestructura	0%	0/13	13
+38 más · continúan en el mismo orden de ejecución			

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Tabicado Cuadros presentados, Montante de servicio...	40
Pintura — primera mano Mecanizado eléctrico, Telemecanizado	26
Pintura — segunda mano Casquillos y bombillas, Placas y tapas	26
+32 más	

PRÓXIMOS FRENTES

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Rozas de timbres Inicio de obra	6
Montante eléctrica Infraestructura	5
Montante de telecomunicaciones Infraestructura	5
+6 más	

Fuente: base viva de la obra + catálogo de tajos y dependencias · Datos 21/10/2026 · Generado 27/10/2026 17:41

Montajes Eléctricos Sagarde, S.L.

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


OBRA: 2026 OLABEAGA BILBAO | **ÁMBITO:** PORTAL 3
Datos: 21/10/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
GRUPO EIBAR · Camino de la Ventosa nº 3, Barrio Olabeaga (Basurto-Zorroza), 48013 Bilbao (Bizkaia)...

8.9%	2.6%	8/309	7	37
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **8.9%** de avance estimado y un **2.6%** terminado; las viviendas avanzan +1.7 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 7 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 12 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

EVOLUCIÓN (VIVIENDAS)

Cada punto muestra el avance ponderado de la revisión; el marcador final distingue el total de obra cuando existe garaje.

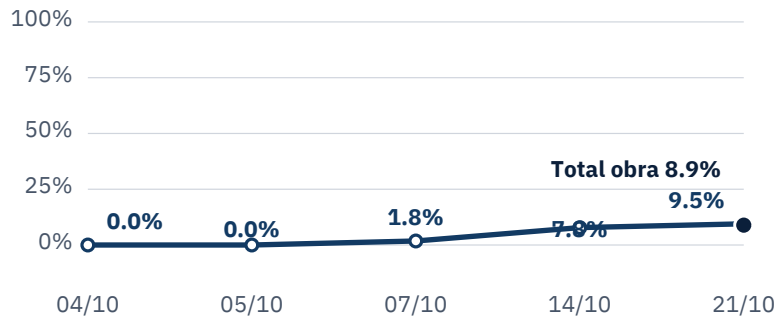

AVANCE POR PLANTA

1ª	15.2%	3/72
2ª	12.7%	3/72
3ª	7.3%	0/72
4ª	2.8%	2/72
Zonas especiales	0.0%	0/21

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % | 50 a 79 % | 80 a 99 % | 100 %

Inicio de obra	76.7%	8/12	Infraestructura	29.0%	0/60
Instalación interior	0.9%	0/80	Recuperación tras Pladur	0.0%	0/12
Conexiones	0.0%	0/24	Cierre técnico	0.0%	0/24
Mecanismos	0.0%	0/24	Remates finales	0.0%	0/12
Remates exteriores	0.0%	0/12	Iluminación final	0.0%	0/12
Entrega	0.0%	0/24	Equipos	0.0%	0/8
Cuadros	0.0%	0/5			

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 6 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Rozas de timbres Inicio de obra	77%	8/12	2
Montante eléctrica Infraestructura	36%	0/12	3
Montante de telecomunicaciones Infraestructura	36%	0/12	3
Montante de servicios comunes Infraestructura	27%	0/12	3
Tubeado de zonas comunes Infraestructura	45%	0/12	3
Cableado de zonas comunes Infraestructura	0%	0/12	12
+31 más · continúan en el mismo orden de ejecución			

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura — primera mano Mecanizado eléctrico, Telemecanizado	24
Pintura — segunda mano Casquillos y bombillas, Placas y tapas	24
Tabicado Cuadros presentados, Montante de servicio...	22
+27 más	

PRÓXIMOS FRENTES

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Rozas de timbres Inicio de obra	2
Montante eléctrica Infraestructura	8
Montante de telecomunicaciones Infraestructura	8
+4 más	

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


OBRA: 2026 OLABEAGA BILBAO | **ÁMBITO:** GARAJE
Datos: 21/10/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
GRUPO EIBAR · Camino de la Ventosa nº 3, Barrio Olabeaga (Basurto-Zorroza), 48013 Bilbao (Bizkaia)...

7.8%	5.9%	12/204	4	25
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **7.8%** de avance estimado y un **5.9%** terminado; avance de +5.0 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 4 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 6 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

EVOLUCIÓN DEL AVANCE

Cada punto muestra el avance ponderado de la revisión; el marcador final distingue el total de obra cuando existe garaje.

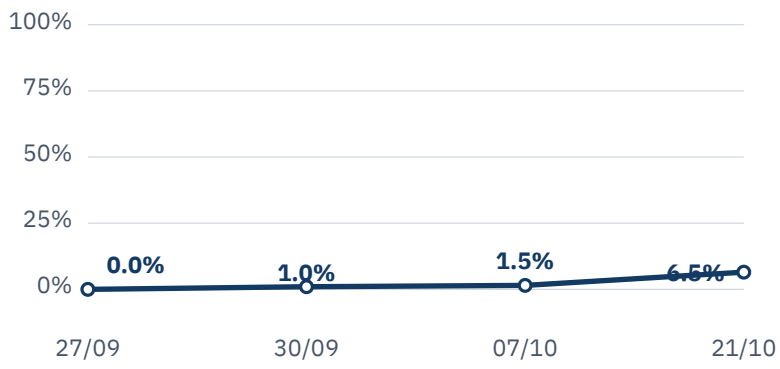

DETALLE POR ZONA

Basuras 2 **0%** · 0/12	**Basuras P1** **0%** · 0/12
Cuadro General Garaje P1 **0%** · 0/18	**Cuarto Ventilacion P3** **0%** · 0/18
Escalera Garaje P2 **0%** · 0/16	**Portal 1** **0%** · 0/16
Portal 2 **0%** · 0/16	**Portal 3** **0%** · 0/16
Rampa -1 **0%** · 0/8	**Sala Hidraulica** **0%** · 0/18
Trasteros -1 **0%** · 0/10	**Trasteros -2** **0%** · 0/10

+4 más

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % | 50 a 79 % | 80 a 99 % | 100 %

Instalación interior	0.0%	0/44	
Equipos	0.0%	0/104	
Cuadros	6.3%	0/19	
Remates garaje	40.0%	0/3	
Instalación interior garaje	51.2%	3/8	
Equipos garaje	41.3%	9/23	
Cuartos técnicos garaje	0.0%	0/3	

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 6 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Tubeado empotrado Instalación interior	0%	0/13	13
Cableado empotrado Instalación interior	0%	0/13	13
Tubeado visto Instalación interior	0%	0/9	9
Cableado visto Instalación interior	0%	0/9	9
Tubeado de viales Instalación interior garaje	75%	3/4	1
Cableado de viales Instalación interior garaje	28%	0/4	1
+22 más · continúan en el mismo orden de ejecución			

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura (recintos) — 2ª mano Embornado alumbrado fijo (recintos), Embo...	56
Pintura (recintos) — 1ª mano Colocación alumbrado fijo (recintos), Col...	55
Tabicado (zona común) Derivación de tierra de cuarto técnico, T...	20
+16 más	

PRÓXIMOS FRENTES

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Tubeado de viales Instalación interior garaje	1
Cableado de viales Instalación interior garaje	3
Alimentación de cuadro de puerta de acceso Remates garaje	1
+1 más	

Fuente: base viva de la obra + catálogo de tajos y dependencias · Datos 21/10/2026 · Generado 27/10/2026 17:41

Montajes Eléctricos Sagarde, S.L.

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO

OBRA: 2026 OLABEAGA BILBAO | **ÁMBITO:** ZONAS ESPECIALES
Datos: 21/10/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
GRUPO EIBAR · Camino de la Ventosa nº 3, Barrio Olabeaga (Basurto-Zorroza), 48013 Bilbao (Bizkaia)...

0.0%	0.0%	0/154	3	23
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **0.0%** de avance estimado y un **0.0%** terminado; sin comparación histórica suficiente. **Producción:** 3 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 4 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

Sin cuatro revisiones comparables; composición del último estado medido.



DETALLE POR ZONA

ASEO PISCINAS CUBIERTA **0%** · 0/8	**Bicicletas** **0%** · 0/8
Bicicletas (2/3) **0%** · 0/8	**Centralización de contadores (P1)** **0%** · 0/13
Centralización de contadores (P2/3) **0%** · 0/13	**CUADRO E/A (P1)** **0%** · 0/13
CUADRO E/A (P2/3) **0%** · 0/13	**CUADRO PISCINA** **0%** · 0/13
CUADRO SERVICIOS GENERALES **0%** · 0/13	**Cuarto RITI / Teleco** **0%** · 0/13
Cuarto RITI / Teleco (2/3) **0%** · 0/13	**Cubierta** **0%** · 0/6

+2 más

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % · 50 a 79 % · 80 a 99 % · 100 %

Cubierta — Fotovoltaica	**0.0%** **0/6**	Cubierta — Antena/pararrayos	**0.0%** **0/7**
Instalación interior	**0.0%** **0/48**	Equipos	**0.0%** **0/48**
Cuadros	**0.0%** **0/45**		

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 6 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Instalación de paneles fotovoltaicos Cubierta — Fotovoltaica	**0%**	0/1	1
Cableado de paneles fotovoltaicos Cubierta — Fotovoltaica	**0%**	0/1	1
Tierra de paneles fotovoltaicos Cubierta — Fotovoltaica	**0%**	0/1	1
Cableado de strings hasta equipos Cubierta — Fotovoltaica	**0%**	0/1	1
Instalación de equipos y protecciones Cubierta — Fotovoltaica	**0%**	0/1	1
Puesta en marcha de fotovoltaica Cubierta — Fotovoltaica	**0%**	0/1	1
+20 más · continúan en el mismo orden de ejecución			

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura (recintos) — 1ª mano Colocación alumbrado fijo (recintos), Col...	33
Pintura (recintos) — 2ª mano Embornado alumbrado fijo (recintos), Embo...	33
Tabicado (zona común) Tubeado empotrado, Tubeado y cableado has...	21
+18 más	

PRÓXIMOS FRENTES

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Instalación de paneles fotovoltaicos Cubierta — Fotovoltaica	1
Colocación de soporte de antena Cubierta — Antena/pararrayos	1
Colocación de soporte de pararrayos Cubierta — Antena/pararrayos	1
