INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


OBRA: 2026 BARAKALDO 104V OBRAS ESPECIALES | **ÁMBITO:** RESUMEN GENERAL (2 PORTALES/BLOQUES)
Datos: 08/10/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Bloque 1, Unidad de Ejecución UE-12 Rontegui, Barakaldo (Bizkaia), CP 48903. GPS: 43...

0.1%	0.0%	0/2706	3	47	0/4
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados	Cierre de expediente

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **0.1%** de avance estimado y un **0.0%** terminado; sin comparación histórica suficiente. **Producción:** 3 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 12 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

Sin cuatro revisiones comparables; composición del último estado medido.



AVANCE POR BLOQUE

Portal 1	**0.1% 0/1872**
Portal 2	**0.0% 0/672**
ZONAS ESPECIALES	**0.0% 0/162**

CIERRE DE EXPEDIENTE

Ensayos instrumentales PENDIENTE	**Inspección OCA** PENDIENTE
CIE / Boletín eléctrico PENDIENTE	**Libro del Edificio** PENDIENTE

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % | 50 a 79 % | 80 a 99 % | 100 %

Inicio de obra	0.0% 0/106	Infraestructura	0.5% 0/530
Instalación interior	0.0% 0/684	Recuperación tras Pladur	0.0% 0/106
Conexiones	0.0% 0/212	Cierre técnico	0.0% 0/212
Mecanismos	0.0% 0/212	Remates finales	0.0% 0/106
Remates exteriores	0.0% 0/106	Iluminación final	0.0% 0/106
Entrega	0.0% 0/212	Cubierta — Fotovoltaica	0.0% 0/12
Cubierta — Antena/pararrayos	0.0% 0/14	Equipos	0.0% 0/48
Cuadros	0.0% 0/40		

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 6 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Rozas de timbres Inicio de obra	0%	0/106	106
Montante eléctrica Infraestructura	2%	0/106	96
Montante de telecomunicaciones Infraestructura	0%	0/106	106
Montante de servicios comunes Infraestructura	0%	0/106	106
Tubeado de zonas comunes Infraestructura	0%	0/106	106
Cableado de zonas comunes Infraestructura	0%	0/106	106
+44 más · continúan en el mismo orden de ejecución			

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Tabicado Cuadros presentados, Montante de servicio...	636
Pintura — primera mano Mecanizado eléctrico, Telemecanizado	212
+38 más	

PRÓXIMOS FRENTES

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Instalación de paneles fotovoltaicos Cubierta — Fotovoltaica	2
Colocación de soporte de antena Cubierta — Antena/pararrayos	2
Colocación de soporte de pararrayos Cubierta — Antena/pararrayos	2

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO

OBRA: 2026 BARAKALDO 104V OBRAS ESPECIALES | **ÁMBITO:** Portal 1
Datos: 08/10/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Bloque 1, Unidad de Ejecución UE-12 Rontegui, Barakaldo (Bizkaia), CP 48903. GPS: 43...

0.1%	0.0%	0/1953	3	47
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **0.1%** de avance estimado y un **0.0%** terminado; sin comparación histórica suficiente. **Producción:** 3 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 12 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

Sin cuatro revisiones comparables; composición del último estado medido.



Terminado X: 0
En marcha M: 0
Iniciado /: 10
Pendiente: 1943

AVANCE POR PLANTA

1.1	1.0%	0/96
1.10	0.0%	0/144
1.11	0.0%	0/144
1.12	0.0%	0/144
1.13	0.0%	0/144
1.14	0.0%	0/48
1.2	1.0%	0/144
1.3	0.0%	0/144
1.4	0.0%	0/144
1.5	0.0%	0/144

+5 más

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % | 50 a 79 % | 80 a 99 % | 100 %

Inicio de obra	0.0% 0/78	Infraestructura	0.6% 0/390
Instalación interior	0.0% 0/492	Recuperación tras Pladur	0.0% 0/78
Conexiones	0.0% 0/156	Cierre técnico	0.0% 0/156
Mecanismos	0.0% 0/156	Remates finales	0.0% 0/78
Remates exteriores	0.0% 0/78	Iluminación final	0.0% 0/78
Entrega	0.0% 0/156	Cubierta — Fotovoltaica	0.0% 0/6
Cubierta — Antena/pararrayos	0.0% 0/7	Equipos	0.0% 0/24
Cuadros	0.0% 0/20		

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 6 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Rozas de timbres Inicio de obra	0%	0/78	78
Montante eléctrica Infraestructura	3%	0/78	68
Montante de telecomunicaciones Infraestructura	0%	0/78	78
Montante de servicios comunes Infraestructura	0%	0/78	78
Tubeado de zonas comunes Infraestructura	0%	0/78	78
Cableado de zonas comunes Infraestructura	0%	0/78	78
+44 más · continúan en el mismo orden de ejecución			

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Tabicado Cuadros presentados, Montante de servicio...	468
Pintura — primera mano Mecanizado eléctrico, Telemecanizado	156
+38 más	

PRÓXIMOS FRENTES

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Instalación de paneles fotovoltaicos Cubierta — Fotovoltaica	1
Colocación de soporte de antena Cubierta — Antena/pararrayos	1
+1 más	

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


OBRA: 2026 BARAKALDO 104V OBRAS ESPECIALES | **ÁMBITO:** Portal 2
Datos: 08/10/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Bloque 1, Unidad de Ejecución UE-12 Rontegui, Barakaldo (Bizkaia), CP 48903. GPS: 43...

0.0%	0.0%	0/753	3	47
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **0.0%** de avance estimado y un **0.0%** terminado; sin comparación histórica suficiente. **Producción:** 3 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 12 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

Sin cuatro revisiones comparables; composición del último estado medido.



AVANCE POR PLANTA

2.1	0.0%	0/96
2.10	0.0%	0/48
2.11	0.0%	0/48
2.12	0.0%	0/48
2.13	0.0%	0/48
2.2	0.0%	0/48
2.3	0.0%	0/48
2.4	0.0%	0/48
2.5	0.0%	0/48
2.6	0.0%	0/48

+4 más

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % | 50 a 79 % | 80 a 99 % | 100 %

Inicio de obra	0.0% 0/28	Infraestructura	0.0% 0/140
Instalación interior	0.0% 0/192	Recuperación tras Pladur	0.0% 0/28
Conexiones	0.0% 0/56	Cierre técnico	0.0% 0/56
Mecanismos	0.0% 0/56	Remates finales	0.0% 0/28
Remates exteriores	0.0% 0/28	Iluminación final	0.0% 0/28
Entrega	0.0% 0/56	Cubierta — Fotovoltaica	0.0% 0/6
Cubierta — Antena/pararrayos	0.0% 0/7	Equipos	0.0% 0/24
Cuadros	0.0% 0/20		

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 6 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Rozas de timbres Inicio de obra	0%	0/28	28
Montante eléctrica Infraestructura	0%	0/28	28
Montante de telecomunicaciones Infraestructura	0%	0/28	28
Montante de servicios comunes Infraestructura	0%	0/28	28
Tubeado de zonas comunes Infraestructura	0%	0/28	28
Cableado de zonas comunes Infraestructura	0%	0/28	28
+44 más · continúan en el mismo orden de ejecución			

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Tabicado Cuadros presentados, Montante de servicio...	168
Pintura — primera mano Mecanizado eléctrico, Telemecanizado	56
+38 más	

PRÓXIMOS FRENTES

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Instalación de paneles fotovoltaicos Cubierta — Fotovoltaica	1
Colocación de soporte de antena Cubierta — Antena/pararrayos	1
+1 más	

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


OBRA: 2026 BARAKALDO 104V OBRAS ESPECIALES | **ÁMBITO:** ZONAS ESPECIALES
Datos: 08/10/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Bloque 1, Unidad de Ejecución UE-12 Rontegui, Barakaldo (Bizkaia), CP 48903. GPS: 43...

0.0%	0.0%	0/162	3	23
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **0.0%** de avance estimado y un **0.0%** terminado; sin comparación histórica suficiente. **Producción:** 3 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 4 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

Sin cuatro revisiones comparables; composición del último estado medido.

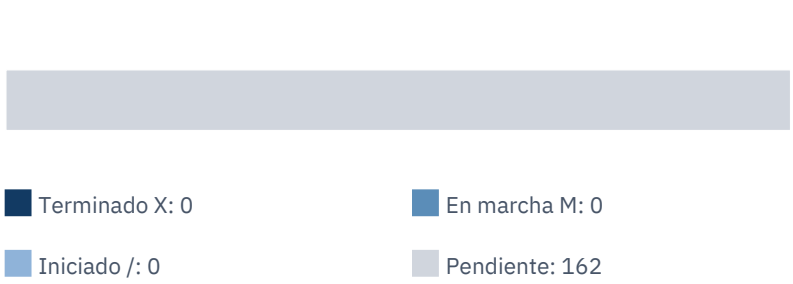

DETALLE POR ZONA

Bicicletas
0% · 0/8

Bicicletas
0% · 0/8

Centralización de contadores
0% · 0/13

Centralización de contadores
0% · 0/13

Centralización de contadores 2
0% · 0/13

CUARTO HIDRAULICA
0% · 0/13

Cuarto RITI LRB (PB)
0% · 0/13

Cuarto RITS (CUBIERTA)
0% · 0/13

Cuarto RITS LRB (CUBIERTA)
0% · 0/13

Cubierta
0% · 0/13

Cubierta
0% · 0/13

GRUPO DE PRESION
0% · 0/13

+2 más

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % | 50 a 79 % | 80 a 99 % | 100 %

Cubierta — Fotovoltaica	0.0%	0/12	Cubierta — Antena/pararrayos	0.0%	0/14
Instalación interior	0.0%	0/48	Equipos	0.0%	0/48
Cuadros	0.0%	0/40			

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 6 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Instalación de paneles fotovoltaicos Cubierta — Fotovoltaica	0%	0/2	2
Cableado de paneles fotovoltaicos Cubierta — Fotovoltaica	0%	0/2	2
Tierra de paneles fotovoltaicos Cubierta — Fotovoltaica	0%	0/2	2
Cableado de strings hasta equipos Cubierta — Fotovoltaica	0%	0/2	2
Instalación de equipos y protecciones Cubierta — Fotovoltaica	0%	0/2	2
Puesta en marcha de fotovoltaica Cubierta — Fotovoltaica	0%	0/2	2
+20 más · continúan en el mismo orden de ejecución			

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura (recintos) — 1ª mano Colocación alumbrado fijo (recintos), Col...	32
Pintura (recintos) — 2ª mano Embornado alumbrado fijo (recintos), Embo...	32
Tabicado (zona común) Tubeado empotrado, Tubeado y cableado has...	20
+18 más	

PRÓXIMOS FRENTES

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Instalación de paneles fotovoltaicos Cubierta — Fotovoltaica	2
Colocación de soporte de antena Cubierta — Antena/pararrayos	2
Colocación de soporte de pararrayos Cubierta — Antena/pararrayos	2
