# INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


**OBRA:** 2026 OLABEAGA BILBAO | **ÁMBITO:** RESUMEN GENERAL (3 PORTALES/BLOQUES)
**Datos:** 02/11/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
GRUPO EIBAR · Camino de la Ventosa nº 3, Barrio Olabeaga (Basurto-Zorroza), 48013 Bilbao (Bizkaia)...

| 11.4% | 9.8% | 115/1174 | 20 | 47 | 0/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Avance estimado | Terminado estricto | Celdas terminadas | Tajos listos | Tajos condicionados | Cierre de expediente |

**Situación eléctrica:** Sagarde alcanza un **11.4%** de avance estimado y un **9.8%** terminado; las viviendas avanzan +4.9 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 20 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 12 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

## EVOLUCIÓN (VIVIENDAS)

Cada punto muestra el avance ponderado de la revisión; el marcador final distingue el total de obra cuando existe garaje.

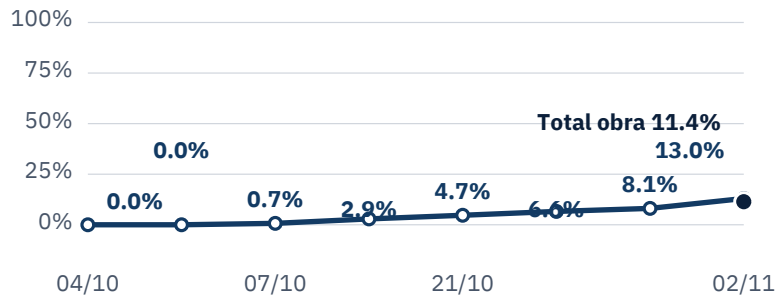


## AVANCE POR BLOQUE

| | | |
|---|---|---|
| **PORTAL 1** | 1.1% | 2/240 |
| **PORTAL 2** | 8.6% | 15/291 |
| **PORTAL 3** | 27.2% | 77/288 |
| **GARAJE** | 11.8% | 20/205 |
| **ZONAS ESPECIALES** | 2.2% | 1/150 |

## CIERRE DE EXPEDIENTE

| | |
|---|---|
| **Ensayos instrumentales** PENDIENTE | **Inspección OCA** PENDIENTE |
| **CIE / Boletín eléctrico** PENDIENTE | **Libro del Edificio** PENDIENTE |

## FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % · 50 a 79 % · 80 a 99 % · 100 %

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inicio de obra | 45.7% | 16/35 | |
| Instalación interior | 10.3% | 27/293 | |
| Conexiones | 0.0% | 0/70 | |
| Mecanismos | 0.0% | 0/70 | |
| Remates exteriores | 0.0% | 0/32 | |
| Entrega | 0.0% | 0/70 | |
| Cubierta — Antena/pararrayos | 0.0% | 0/7 | |
| Equipos | 0.0% | 0/151 | |
| Cuadros | 3.0% | 0/61 | |
| Remates garaje | 55.0% | 1/4 | |
| Infraestructura | 35.8% | 52/175 | |
| Recuperación tras Pladur | 0.0% | 0/32 | |
| Cierre técnico | 0.0% | 0/64 | |
| Remates finales | 0.0% | 0/35 | |
| Iluminación final | 0.0% | 0/35 | |
| Cubierta — Fotovoltaica | 0.0% | 0/6 | |
| Instalación interior garaje | 65.6% | 5/8 | |
| Equipos garaje | 67.2% | 14/23 | |
| Cuartos técnicos garaje | 0.0% | 0/3 | |

## TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 6 filas, en el orden de ejecución de la base.

| Tajo Sagarde / fase | Avance | Hecho | Pend. |
|---|---|---|---|
| **Rozas de timbres** Inicio de obra | 46% | 16/35 | 19 |
| **Montante eléctrica** Infraestructura | 51% | 14/35 | 12 |
| **Montante de telecomunicaciones** Infraestructura | 47% | 14/35 | 14 |
| **Montante de servicios comunes** Infraestructura | 39% | 12/35 | 17 |
| **Tubeado de zonas comunes** Infraestructura | 41% | 12/35 | 19 |
| **Cableado de zonas comunes** Infraestructura | 1% | 0/35 | 34 |
| **+59 más · continúan en el mismo orden de ejecución** | | | |

## CONDICIONANTES

| Condicionante | Afecta |
|---|---|
| **Pintura — primera mano** Mecanizado eléctrico, Telemecanizado | 70 |
| **Pintura — segunda mano** Casquillos y bombillas, Placas y tapas | 70 |
| **+38 más** | |

## PRÓXIMOS FRENTES

| Próximo tajo Sagarde | Uds. |
|---|---|
| **Rozas de timbres** Inicio de obra | 12 |
| **Montante eléctrica** Infraestructura | 14 |
| **+18 más** | |

Fuente: base viva de la obra + catálogo de tajos y dependencias · Datos 02/11/2026 · Generado 02/11/2026 22:07

**Montajes Eléctricos Sagarde, S.L.**

# INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


**OBRA:** 2026 OLABEAGA BILBAO | **ÁMBITO:** PORTAL 1
**Datos:** 02/11/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
GRUPO EIBAR · Camino de la Ventosa nº 3, Barrio Olabeaga (Basurto-Zorroza), 48013 Bilbao (Bizkaia)...

| 0.9% | 0.7% | 2/293 | 12 | 42 |
|---|---|---|---|---|
| Avance estimado | Terminado estricto | Celdas terminadas | Tajos listos | Tajos condicionados |

**Situación eléctrica:** Sagarde alcanza un **0.9%** de avance estimado y un **0.7%** terminado; las viviendas avanzan +0.8 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 12 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 12 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

## EVOLUCIÓN (VIVIENDAS)

Cada punto muestra el avance ponderado de la revisión; el marcador final distingue el total de obra cuando existe garaje.

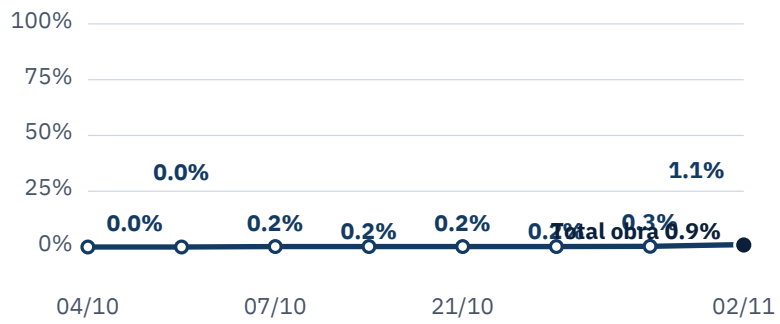


## AVANCE POR PLANTA

| | | |
|---|---|---|
| PB | 0.0% | 0/48 |
| 1ª | 5.2% | 2/48 |
| 2ª | 0.5% | 0/48 |
| 3ª | 0.0% | 0/48 |
| 4ª | 0.0% | 0/48 |
| Zonas especiales | 0.0% | 0/53 |

## FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % | 50 a 79 % | 80 a 99 % | 100 %

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inicio de obra | 0.0% | 0/10 | Infraestructura | 1.5% | 0/50 |
| Instalación interior | 2.6% | 2/76 | Recuperación tras Pladur | 0.0% | 0/10 |
| Conexiones | 0.0% | 0/20 | Cierre técnico | 0.0% | 0/20 |
| Mecanismos | 0.0% | 0/20 | Remates finales | 0.0% | 0/10 |
| Remates exteriores | 0.0% | 0/10 | Iluminación final | 0.0% | 0/10 |
| Entrega | 0.0% | 0/20 | Cubierta — Fotovoltaica | 0.0% | 0/6 |
| Equipos | 0.0% | 0/16 | Cuadros | 0.0% | 0/15 |

## TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 6 filas, en el orden de ejecución de la base.

| Tajo Sagarde / fase | Avance | Hecho | Pend. |
|---|---|---|---|
| **Rozas de timbres**<br>Inicio de obra | 0% | 0/10 | 10 |
| **Montante eléctrica**<br>Infraestructura | 5% | 0/10 | 8 |
| **Montante de telecomunicaciones**<br>Infraestructura | 0% | 0/10 | 10 |
| **Montante de servicios comunes**<br>Infraestructura | 0% | 0/10 | 10 |
| **Tubeado de zonas comunes**<br>Infraestructura | 0% | 0/10 | 10 |
| **Cableado de zonas comunes**<br>Infraestructura | 2% | 0/10 | 9 |
| **+37 más · continúan en el mismo orden de ejecución** | | | |

## CONDICIONANTES

| Condicionante | Afecta |
|---|---|
| **Pintura — primera mano**<br>Mecanizado eléctrico, Telemecanizado | 20 |
| **Pintura — segunda mano**<br>Casquillos y bombillas, Placas y tapas | 20 |
| **Tabicado**<br>Cuadros presentados, Montante de servicio... | 12 |
| **+32 más** | |

## PRÓXIMOS FRENTES

| Próximo tajo Sagarde | Uds. |
|---|---|
| **Rozas de timbres**<br>Inicio de obra | 8 |
| **Montante eléctrica**<br>Infraestructura | 8 |
| **Montante de telecomunicaciones**<br>Infraestructura | 8 |
| **+9 más** | |

Fuente: base viva de la obra + catálogo de tajos y dependencias · Datos 02/11/2026 · Generado 02/11/2026 22:07

**Montajes Eléctricos Sagarde, S.L.**

# INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


**OBRA:** 2026 OLABEAGA BILBAO | **ÁMBITO:** PORTAL 2
**Datos:** 02/11/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
GRUPO EIBAR · Camino de la Ventosa nº 3, Barrio Olabeaga (Basurto-Zorroza), 48013 Bilbao (Bizkaia)...

| 7.1% | 4.0% | 15/371 | 12 | 42 |
|---|---|---|---|---|
| Avance estimado | Terminado estricto | Celdas terminadas | Tajos listos | Tajos condicionados |

**Situación eléctrica:** Sagarde alcanza un **7.1%** de avance estimado y un **4.0%** terminado; las viviendas avanzan +0.3 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 12 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 12 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

## EVOLUCIÓN (VIVIENDAS)

Cada punto muestra el avance ponderado de la revisión; el marcador final distingue el total de obra cuando existe garaje.

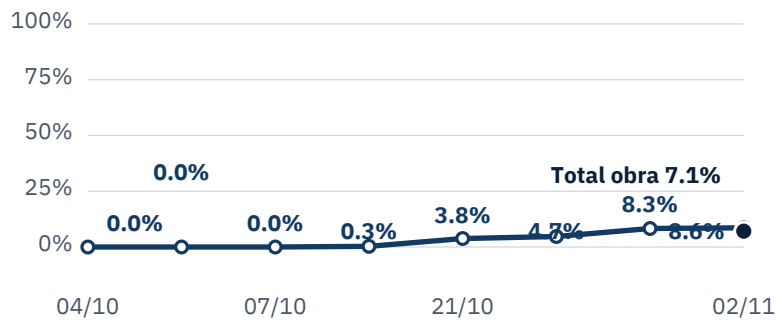


## AVANCE POR PLANTA

| | | |
|---|---|---|
| PB | 5.0% | 0/51 |
| 1ª | 27.8% | 9/48 |
| 2ª | 16.0% | 6/48 |
| 3ª | 3.1% | 0/48 |
| 4ª | 0.0% | 0/48 |
| DUPLX ATICO | 0.0% | 0/48 |
| Zonas especiales | 1.4% | 0/80 |

## FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % | 50 a 79 % | 80 a 99 % | 100 %

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inicio de obra | 30.8% | 4/13 | Infraestructura | 21.3% | 4/65 |
| Instalación interior | 9.0% | 7/93 | Recuperación tras Pladur | 0.0% | 0/10 |
| Conexiones | 0.0% | 0/26 | Cierre técnico | 0.0% | 0/20 |
| Mecanismos | 0.0% | 0/26 | Remates finales | 0.0% | 0/13 |
| Remates exteriores | 0.0% | 0/10 | Iluminación final | 0.0% | 0/13 |
| Entrega | 0.0% | 0/26 | Cubierta — Antena/pararrayos | 0.0% | 0/7 |
| Equipos | 0.0% | 0/24 | Cuadros | 0.0% | 0/25 |

## TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 6 filas, en el orden de ejecución de la base.

| Tajo Sagarde / fase | Avance | Hecho | Pend. |
|---|---|---|---|
| **Rozas de timbres**<br>Inicio de obra | 31% | 4/13 | 9 |
| **Montante eléctrica**<br>Infraestructura | 42% | 2/13 | 4 |
| **Montante de telecomunicaciones**<br>Infraestructura | 34% | 2/13 | 4 |
| **Montante de servicios comunes**<br>Infraestructura | 12% | 0/13 | 7 |
| **Tubeado de zonas comunes**<br>Infraestructura | 18% | 0/13 | 9 |
| **Cableado de zonas comunes**<br>Infraestructura | 0% | 0/13 | 13 |
| **+38 más · continúan en el mismo orden de ejecución** | | | |

## CONDICIONANTES

| Condicionante | Afecta |
|---|---|
| **Tabicado**<br>Cuadros presentados, Montante de servicio... | 30 |
| **Pintura — primera mano**<br>Mecanizado eléctrico, Telemecanizado | 26 |
| **Pintura — segunda mano**<br>Casquillos y bombillas, Placas y tapas | 26 |
| **+32 más** | |

## PRÓXIMOS FRENTES

| Próximo tajo Sagarde | Uds. |
|---|---|
| **Rozas de timbres**<br>Inicio de obra | 4 |
| **Montante eléctrica**<br>Infraestructura | 6 |
| **Montante de telecomunicaciones**<br>Infraestructura | 6 |
| **+9 más** | |

Fuente: base viva de la obra + catálogo de tajos y dependencias · Datos 02/11/2026 · Generado 02/11/2026 22:07

**Montajes Eléctricos Sagarde, S.L.**

# INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


**OBRA:** 2026 OLABEAGA BILBAO | **ÁMBITO:** PORTAL 3
**Datos:** 02/11/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
GRUPO EIBAR · Camino de la Ventosa nº 3, Barrio Olabeaga (Basurto-Zorroza), 48013 Bilbao (Bizkaia)...

| 26.4% | 25.6% | 78/305 | 10 | 27 |
|---|---|---|---|---|
| Avance estimado | Terminado estricto | Celdas terminadas | Tajos listos | Tajos condicionados |

**Situación eléctrica:** Sagarde alcanza un **26.4%** de avance estimado y un **25.6%** terminado; las viviendas avanzan +12.7 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 10 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 12 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

## EVOLUCIÓN (VIVIENDAS)

Cada punto muestra el avance ponderado de la revisión; el marcador final distingue el total de obra cuando existe garaje.

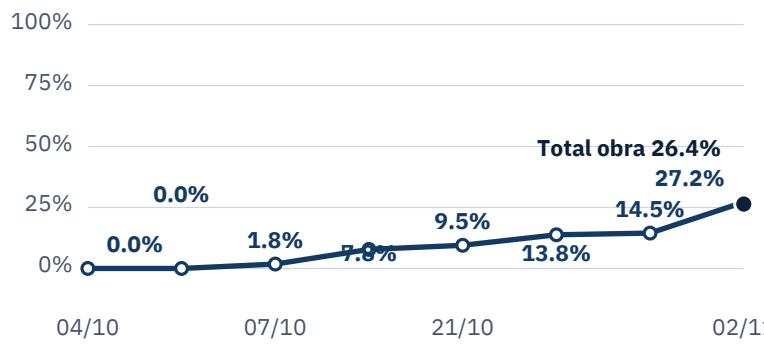


## AVANCE POR PLANTA

| | | |
|---|---|---|
| 1ª | 43.8% | 31/72 |
| 2ª | 23.4% | 16/72 |
| 3ª | 20.8% | 15/72 |
| 4ª | 20.8% | 15/72 |
| Zonas especiales | 12.9% | 1/17 |

## FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % | 50 a 79 % | 80 a 99 % | 100 %

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inicio de obra | 100.0% | 12/12 | Infraestructura | 80.0% | 48/60 |
| Instalación interior | 24.9% | 18/80 | Recuperación tras Pladur | 0.0% | 0/12 |
| Conexiones | 0.0% | 0/24 | Cierre técnico | 0.0% | 0/24 |
| Mecanismos | 0.0% | 0/24 | Remates finales | 0.0% | 0/12 |
| Remates exteriores | 0.0% | 0/12 | Iluminación final | 0.0% | 0/12 |
| Entrega | 0.0% | 0/24 | Equipos | 0.0% | 0/7 |
| Cuadros | 30.0% | 0/2 | | | |

## TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 6 filas, en el orden de ejecución de la base.

| Tajo Sagarde / fase | Avance | Hecho | Pend. |
|---|---|---|---|
| **Cableado de zonas comunes**<br>Infraestructura | 0% | 0/12 | 12 |
| **Cuadros presentados**<br>Instalación interior | 35% | 4/12 | 7 |
| **Tubeado interior**<br>Instalación interior | 30% | 3/12 | 8 |
| **Cableado eléctrico**<br>Instalación interior | 19% | 2/12 | 9 |
| **Telecableado**<br>Instalación interior | 19% | 2/12 | 9 |
| **Portero / videoportero**<br>Instalación interior | 25% | 3/12 | 9 |
| **+23 más · continúan en el mismo orden de ejecución** | | | |

## CONDICIONANTES

| Condicionante | Afecta |
|---|---|
| **Pintura — primera mano**<br>Mecanizado eléctrico, Telemecanizado | 24 |
| **Pintura — segunda mano**<br>Casquillos y bombillas, Placas y tapas | 24 |
| **Fachada terminada**<br>Apliques y enchufes de terraza | 12 |
| **+23 más** | |

## PRÓXIMOS FRENTES

| Próximo tajo Sagarde | Uds. |
|---|---|
| **Cableado de zonas comunes**<br>Infraestructura | 12 |
| **Cuadros presentados**<br>Instalación interior | 5 |
| **Tubeado interior**<br>Instalación interior | 5 |
| **+7 más** | |

# INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


**OBRA:** 2026 OLABEAGA BILBAO | **ÁMBITO:** GARAJE
**Datos:** 02/11/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
GRUPO EIBAR · Camino de la Ventosa nº 3, Barrio Olabeaga (Basurto-Zorroza), 48013 Bilbao (Bizkaia)...

| 11.8% | 9.8% | 20/205 | 4 | 25 |
|---|---|---|---|---|
| Avance estimado | Terminado estricto | Celdas terminadas | Tajos listos | Tajos condicionados |

**Situación eléctrica:** Sagarde alcanza un **11.8%** de avance estimado y un **9.8%** terminado; avance de +3.0 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 4 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 6 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

## EVOLUCIÓN DEL AVANCE

Cada punto muestra el avance ponderado de la revisión; el marcador final distingue el total de obra cuando existe garaje.

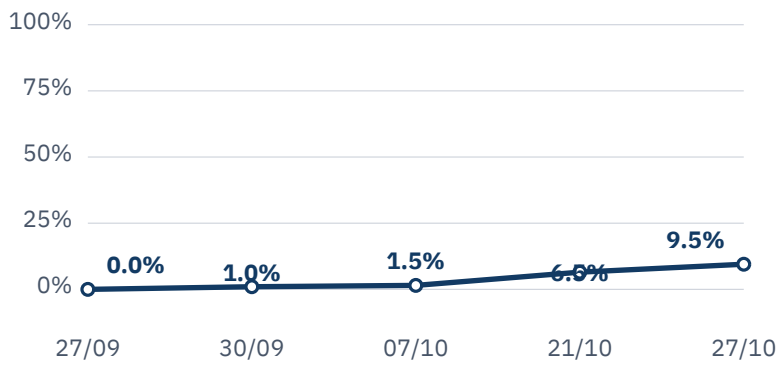


## DETALLE POR ZONA

| | |
|---|---|
| **Basuras 2**<br>**0%** · 0/12 | **Basuras P1**<br>**0%** · 0/12 |
| **Cuadro General Garaje P1**<br>**0%** · 0/18 | **Cuarto Ventilacion P3**<br>**0%** · 0/18 |
| **Escalera Garaje P2**<br>**0%** · 0/16 | **Portal 1**<br>**0%** · 0/16 |
| **Portal 2**<br>**0%** · 0/16 | **Portal 3**<br>**0%** · 0/16 |
| **Rampa -1**<br>**0%** · 0/8 | **Sala Hidraulica**<br>**0%** · 0/18 |
| **Trasteros -1**<br>**0%** · 0/10 | **Trasteros -2**<br>**0%** · 0/10 |

**+4 más**

## FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % | 50 a 79 % | 80 a 99 % | 100 %

| | | | |
|---|---|---|---|
| Instalación interior | 0.0% | 0/44 | |
| Equipos | 0.0% | 0/104 | |
| Cuadros | 6.3% | 0/19 | |
| Remates garaje | 55.0% | 1/4 | |
| Instalación interior garaje | 65.6% | 5/8 | |
| Equipos garaje | 67.2% | 14/23 | |
| Cuartos técnicos garaje | 0.0% | 0/3 | |

## TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 6 filas, en el orden de ejecución de la base.

| Tajo Sagarde / fase | Avance | Hecho | Pend. |
|---|---|---|---|
| **Tubeado empotrado**<br>Instalación interior | **0%** | 0/13 | 13 |
| **Cableado empotrado**<br>Instalación interior | **0%** | 0/13 | 13 |
| **Tubeado visto**<br>Instalación interior | **0%** | 0/9 | 9 |
| **Cableado visto**<br>Instalación interior | **0%** | 0/9 | 9 |
| **Tubeado de viales**<br>Instalación interior garaje | **75%** | 3/4 | 1 |
| **Cableado de viales**<br>Instalación interior garaje | **56%** | 2/4 | 1 |
| **+22 más · continúan en el mismo orden de ejecución** | | | |

## CONDICIONANTES

| Condicionante | Afecta |
|---|---|
| **Pintura (recintos) — 2ª mano**<br>Embornado alumbrado fijo (recintos), Embo... | 56 |
| **Pintura (recintos) — 1ª mano**<br>Colocación alumbrado fijo (recintos), Col... | 55 |
| **Tabicado (zona común)**<br>Derivación de tierra de cuarto técnico, T... | 20 |
| **+16 más** | |

## PRÓXIMOS FRENTES

| Próximo tajo Sagarde | Uds. |
|---|---|
| **Tubeado de viales**<br>Instalación interior garaje | 1 |
| **Cableado de viales**<br>Instalación interior garaje | 1 |
| **Alimentación de cuadro de puerta de acceso**<br>Remates garaje | 1 |
| **+1 más** | |

Fuente: base viva de la obra + catálogo de tajos y dependencias · Datos 02/11/2026 · Generado 02/11/2026 22:08

**Montajes Eléctricos Sagarde, S.L.**

# INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO

**OBRA:** 2026 OLABEAGA BILBAO | **ÁMBITO:** ZONAS ESPECIALES
**Datos:** 02/11/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
GRUPO EIBAR · Camino de la Ventosa nº 3, Barrio Olabeaga (Basurto-Zorroza), 48013 Bilbao (Bizkaia)...

| 2.2% | 0.7% | 1/150 | 4 | 23 |
|---|---|---|---|---|
| Avance estimado | Terminado estricto | Celdas terminadas | Tajos listos | Tajos condicionados |

**Situación eléctrica:** Sagarde alcanza un **2.2%** de avance estimado y un **0.7%** terminado; sin comparación histórica suficiente. **Producción:** 4 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 4 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

## ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

Sin cuatro revisiones comparables; composición del último estado medido.




## DETALLE POR ZONA

**Bicicletas**
**0%** · 0/8

**Bicicletas (2/3)**
**0%** · 0/8

**Centralización de contadores (P1)**
**0%** · 0/13

**CUADRO E/A (P1)**
**0%** · 0/13

**CUADRO E/A (P2/3)**
**0%** · 0/13

**CUADRO SERVICIOS GENERALES**
**0%** · 0/13

**Cubierta**
**0%** · 0/6

**Cubierta**
**0%** · 0/7

**Sala de calderas (P2/3)**
**0%** · 0/13

**Cuarto RITI / Teleco (2/3)**
**2%** · 0/13

**Cuarto RITIS/ Teleco**
**2%** · 0/13

**Centralización de contadores (P2/3)**
**5%** · 0/13

**+2 más**

## FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % | 50 a 79 % | 80 a 99 % | 100 %

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cubierta — Fotovoltaica | 0.0% 0/6 | Cubierta — Antena/pararrayos | 0.0% 0/7 |
| Instalación interior | 5.6% 1/48 | Equipos | 0.0% 0/47 |
| Cuadros | 1.4% 0/42 | | |

## TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 6 filas, en el orden de ejecución de la base.

| Tajo Sagarde / fase | Avance | Hecho | Pend. |
|---|---|---|---|
| **Instalación de paneles fotovoltaicos**<br>Cubierta — Fotovoltaica | **0%** | 0/1 | 1 |
| **Cableado de paneles fotovoltaicos**<br>Cubierta — Fotovoltaica | **0%** | 0/1 | 1 |
| **Tierra de paneles fotovoltaicos**<br>Cubierta — Fotovoltaica | **0%** | 0/1 | 1 |
| **Cableado de strings hasta equipos**<br>Cubierta — Fotovoltaica | **0%** | 0/1 | 1 |
| **Instalación de equipos y protecciones**<br>Cubierta — Fotovoltaica | **0%** | 0/1 | 1 |
| **Puesta en marcha de fotovoltaica**<br>Cubierta — Fotovoltaica | **0%** | 0/1 | 1 |
| **+20 más · continúan en el mismo orden de ejecución** | | | |

## CONDICIONANTES

| Condicionante | Afecta |
|---|---|
| **Pintura (recintos) — 2ª mano**<br>Embornado alumbrado fijo (recintos), Embo... | 32 |
| **Pintura (recintos) — 1ª mano**<br>Colocación alumbrado fijo (recintos), Col... | 31 |
| **Tabicado (zona común)**<br>Tubeado empotrado, Tubeado y cableado has... | 20 |
| **+18 más** | |

## PRÓXIMOS FRENTES

| Próximo tajo Sagarde | Uds. |
|---|---|
| **Instalación de paneles fotovoltaicos**<br>Cubierta — Fotovoltaica | 1 |
| **Colocación de soporte de antena**<br>Cubierta — Antena/pararrayos | 1 |
| **+2 más** | |
