# INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


**OBRA:** 2026 BOLUETA ACR | **ÁMBITO:** RESUMEN GENERAL
**Datos:** 13/10/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Neinor Península, S.L.U · Parcela RE A4, Bolueta, 48004 Bilbao (Bizkaia)

| 68.6% | 65.2% | 1602/2458 | 21 | 35 | 0/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Avance estimado | Terminado estricto | Celdas terminadas | Tajos listos | Tajos condicionados | Cierre de expediente |

**Situación eléctrica:** Sagarde alcanza un **68.6%** de avance estimado y un **65.2%** terminado; las viviendas avanzan +2.7 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 21 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 11 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

## EVOLUCIÓN (VIVIENDAS)

Cada punto muestra el avance ponderado de la revisión; el marcador final distingue el total de obra cuando existe garaje.

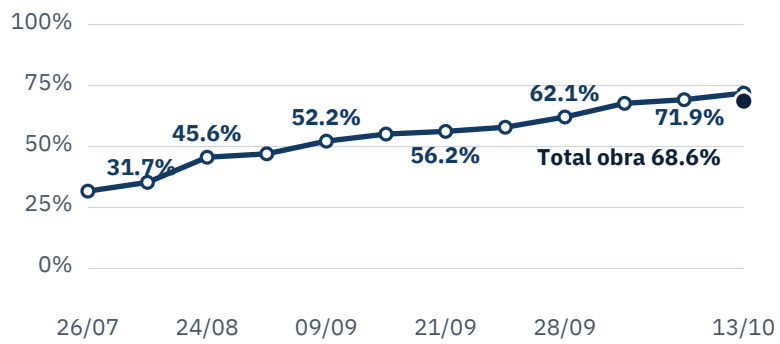


## AVANCE POR BLOQUE

**BOLUETA** 71.9% 1570/2289

**GARAJE** 43.5% 29/72

**ZONAS ESPECIALES** 10.7% 3/97

## CIERRE DE EXPEDIENTE

**Ensayos instrumentales**
PENDIENTE

**Inspección OCA**
PENDIENTE

**CIE / Boletín eléctrico**
PENDIENTE

**Libro del Edificio**
PENDIENTE

## FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % | 50 a 79 % | 80 a 99 % | 100 %

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inicio de obra | 94.8% 92/97 | Infraestructura | 94.5% 416/478 |
| Instalación interior | 91.8% 560/616 | Recuperación tras Pladur | 92.6% 88/95 |
| Conexiones | 44.2% 81/190 | Cierre técnico | 59.1% 106/190 |
| Mecanismos | 65.8% 123/190 | Remates finales | 8.4% 8/95 |
| Remates exteriores | 0.0% 0/95 | Iluminación final | 88.0% 80/95 |
| Entrega | 24.4% 24/190 | Cubierta — Antena/pararrayos | 7.1% 0/7 |
| Instalación interior garaje | 100.0% 4/4 | Equipos | 8.6% 4/58 |
| Equipos garaje | 100.0% 12/12 | Cuadros | 16.7% 3/42 |
| Cuartos técnicos garaje | 0.0% 0/1 | Remates garaje | 53.3% 1/3 |

## TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 6 filas, en el orden de ejecución de la base.

| Tajo Sagarde / fase | Avance | Hecho | Pend. |
|---|---|---|---|
| **Rozas de timbres**<br>Inicio de obra | 95% | 92/97 | 5 |
| **Montante eléctrica**<br>Infraestructura | 97% | 92/97 | 0 |
| **Montante de telecomunicaciones**<br>Infraestructura | 97% | 92/97 | 0 |
| **Montante de servicios comunes**<br>Infraestructura | 78% | 43/95 | 0 |
| **Cuadros presentados**<br>Instalación interior | 95% | 92/97 | 5 |
| **Tubeado interior**<br>Instalación interior | 99% | 92/95 | 0 |
| **+42 más · continúan en el mismo orden de ejecución** | | | |

## CONDICIONANTES

| Condicionante | Afecta |
|---|---|
| **Pintura — segunda mano**<br>Casquillos y bombillas, Placas y tapas | 143 |
| **Fachada terminada**<br>Apliques y enchufes de terraza | 95 |
| **Pintura de zonas comunes**<br>Iluminación de rellanos / ZZCC | 91 |
| **+30 más** | |

## PRÓXIMOS FRENTES

| Próximo tajo Sagarde | Uds. |
|---|---|
| **Rozas de timbres**<br>Inicio de obra | 5 |
| **Montante eléctrica**<br>Infraestructura | 5 |
| **+19 más** | |

# INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


**OBRA:** 2026 BOLUETA ACR | **ÁMBITO:** GARAJE
**Datos:** 13/10/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Neinor Península, S.L.U · Parcela RE A4, Bolueta, 48004 Bilbao (Bizkaia)

| 43.5% | 40.3% | 29/72 | 4 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Avance estimado | Terminado estricto | Celdas terminadas | Tajos listos | Tajos condicionados |

**Situación eléctrica:** Sagarde alcanza un **43.5%** de avance estimado y un **40.3%** terminado; avance de +3.7 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 4 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 3 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

## ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

Sin cuatro revisiones comparables; composición del último estado medido.



Terminado X: 29 · En marcha M: 1 · Iniciado /: 7 · Pendiente: 35

## DETALLE POR ZONA

| | |
|---|---|
| **Escalera Principal** 2% · 0/12 | **Escalera 2** 4% · 0/12 |
| **Trasteros -1** 25% · 0/4 | **Cuadro General Garaje** 27% · 4/15 |
| **bombas de achique** 67% · 4/6 | **planta -1** 86% · 8/10 |
| **planta -2** 100% · 9/9 | **Trasteros -2** 100% · 4/4 |

## FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % · 50 a 79 % · 80 a 99 % · 100 %

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Instalación interior | 43.8% | 6/16 | Instalación interior garaje | 100.0% | 4/4 |
| Equipos | 17.6% | 4/27 | Equipos garaje | 100.0% | 12/12 |
| Cuadros | 22.2% | 2/9 | Cuartos técnicos garaje | 0.0% | 0/1 |
| Remates garaje | 53.3% | 1/3 | | | |

## TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 10 filas, en el orden de ejecución de la base.

| Tajo Sagarde / fase | Avance | Hecho | Pend. |
|---|---|---|---|
| **Tubeado visto** Instalación interior | 47% | 3/8 | 2 |
| **Cableado visto** Instalación interior | 41% | 3/8 | 4 |
| **Colocación alumbrado fijo (recintos)** Equipos | 18% | 1/7 | 5 |
| **Colocación alumbrado temporizado (recintos)** Equipos | 0% | 0/1 | 1 |
| **Colocación luminarias de emergencia (recintos)** Equipos | 5% | 0/5 | 4 |
| **Colocación de enchufe de cuarto técnico** Equipos | 0% | 0/1 | 1 |
| **Tubeado y cableado hasta cuadro secundario** Cuadros | 50% | 1/2 | 1 |
| **Colocación y mecanizado de cuadro propio** Cuadros | 0% | 0/2 | 2 |
| **Embornado de cuadro propio** Cuadros | 0% | 0/1 | 1 |
| **Rotulación de cuadro propio** Cuadros | 0% | 0/2 | 2 |
| **+7 más · continúan en el mismo orden de ejecución** | | | |

## CONDICIONANTES

| Condicionante | Afecta |
|---|---|
| **Pintura (recintos) — 1ª mano** Colocación alumbrado fijo (recintos), Col... | 15 |
| **Pintura (recintos) — 2ª mano** Embornado alumbrado fijo (recintos), Embo... | 11 |
| **Lucido** Tubeado visto | 5 |
| **Colocación alumbrado fijo (recintos)** Embornado alumbrado fijo (recintos) | 5 |
| **+6 más** | |

## PRÓXIMOS FRENTES

| Próximo tajo Sagarde | Uds. |
|---|---|
| **Tubeado y cableado hasta cuadro secundario** Cuadros | 1 |
| **Derivación de tierra de cuarto técnico** Cuartos técnicos garaje | 1 |
| **Alimentación de cuadro de puerta de acceso** Remates garaje | 1 |
| **Preinstalación vehículo eléctrico (IRVE)** Remates garaje | 1 |

# INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO

**OBRA:** 2026 BOLUETA ACR | **ÁMBITO:** ZONAS ESPECIALES
**Datos:** 13/10/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Neinor Península, S.L.U · Parcela RE A4, Bolueta, 48004 Bilbao (Bizkaia)

| 10.7% | 3.1% | 3/97 | 6 | 18 |
|---|---|---|---|---|
| Avance estimado | Terminado estricto | Celdas terminadas | Tajos listos | Tajos condicionados |

**Situación eléctrica:** Sagarde alcanza un **10.7%** de avance estimado y un **3.1%** terminado; sin comparación histórica suficiente. **Producción:** 6 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 4 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

## ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

Sin cuatro revisiones comparables; composición del último estado medido.




## DETALLE POR ZONA

- **Basuras** — **0%** · 0/8
- **Cuarto Aerotermia** — **0%** · 0/13
- **Instalaciones generales** — **0%** · 0/13
- **Sala de calderas** — **7%** · 0/9
- **Cubierta** — **7%** · 0/7
- **Cuarto RITI / Teleco** — **11%** · 0/11
- **Centralización de contadores** — **15%** · 1/11
- **Centralización de contadores P24** — **20%** · 0/12
- **Cuarto RITS P24** — **31%** · 2/13

## FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % | 50 a 79 % | 80 a 99 % | 100 %

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cubierta — Antena/pararrayos | 7.1% | 0/7 | Instalación interior | 17.9% | 2/26 |
| Equipos | 0.8% | 0/31 | Cuadros | 15.2% | 1/33 |

## TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 10 filas, en el orden de ejecución de la base.

| Tajo Sagarde / fase | Avance | Hecho | Pend. |
|---|---|---|---|
| **Colocación de soporte de antena**<br>Cubierta — Antena/pararrayos | 25% | 0/1 | 0 |
| **Colocación de soporte de pararrayos**<br>Cubierta — Antena/pararrayos | 25% | 0/1 | 0 |
| **Instalación de antena**<br>Cubierta — Antena/pararrayos | 0% | 0/1 | 1 |
| **Instalación de pararrayos**<br>Cubierta — Antena/pararrayos | 0% | 0/1 | 1 |
| **Cableado de antena**<br>Cubierta — Antena/pararrayos | 0% | 0/1 | 1 |
| **Cableado de pararrayos**<br>Cubierta — Antena/pararrayos | 0% | 0/1 | 1 |
| **Tierra de antena**<br>Cubierta — Antena/pararrayos | 0% | 0/1 | 1 |
| **Tubeado empotrado**<br>Instalación interior | 26% | 0/7 | 4 |
| **Cableado empotrado**<br>Instalación interior | 12% | 0/7 | 5 |
| **Tubeado visto**<br>Instalación interior | 17% | 1/6 | 5 |
| **+10 más · continúan en el mismo orden de ejecución** | | | |

## CONDICIONANTES

| Condicionante | Afecta |
|---|---|
| **Pintura (recintos) — 1ª mano**<br>Colocación alumbrado fijo (recintos), Col... | 22 |
| **Pintura (recintos) — 2ª mano**<br>Embornado alumbrado fijo (recintos), Embo... | 21 |
| **Tabicado (zona común)**<br>Tubeado empotrado, Tubeado y cableado has... | 5 |
| **Lucido**<br>Tubeado visto | 3 |
| **+12 más** | |

## PRÓXIMOS FRENTES

| Próximo tajo Sagarde | Uds. |
|---|---|
| **Colocación de soporte de antena**<br>Cubierta — Antena/pararrayos | 1 |
| **Colocación de soporte de pararrayos**<br>Cubierta — Antena/pararrayos | 1 |
| **Tubeado empotrado**<br>Instalación interior | 4 |
| **Tubeado visto**<br>Instalación interior | 2 |
| **+2 más** | |

Fuente: base viva de la obra + catálogo de tajos y dependencias · Datos 13/10/2026 · Generado 15/10/2026 15:06

**Montajes Eléctricos Sagarde, S.L.**
