


RESUMEN EJECUTIVO

**Situación eléctrica:** Sagarde alcanza un **12.2%** de avance estimado y un **9.6%** terminado; sin comparación histórica suficiente.  
**Producción:** 14 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 8 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.




ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

No hay suficientes revisiones comparables para una tendencia fiable; se muestra la composición del último estado medido.



AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

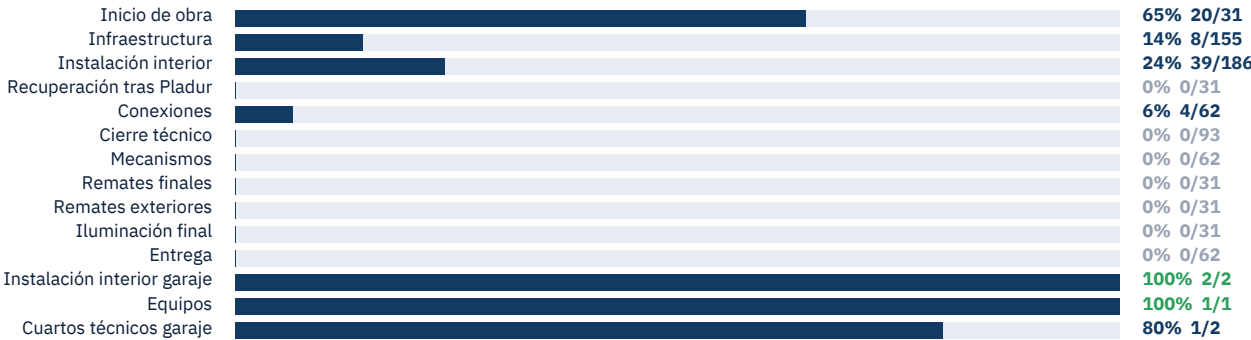

TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

| Tajo Sagarde                   | Fase                 | Avance | Hecho | Pendiente |
|--------------------------------|----------------------|--------|-------|-----------|
| Rozas de timbres               | Inicio de obra       | 65%    | 20/31 | 11        |
| Montante eléctrica             | Infraestructura      | 15%    | 0/31  | 23        |
| Montante de telecomunicaciones | Infraestructura      | 15%    | 0/31  | 23        |
| Montante de servicios comunes  | Infraestructura      | 15%    | 0/31  | 23        |
| Tubeado de zonas comunes       | Infraestructura      | 26%    | 8/31  | 23        |
| Cableado de zonas comunes      | Infraestructura      | 0%     | 0/31  | 31        |
| Cuadros presentados            | Instalación interior | 43%    | 13/31 | 17        |
| Tubeado interior               | Instalación interior | 38%    | 10/31 | 18        |

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

| Próximo tajo Sagarde                              | Uds. |
|---------------------------------------------------|------|
| Montante eléctrica<br>Infraestructura             | 20   |
| Montante de telecomunicaciones<br>Infraestructura | 20   |
| Montante de servicios comunes<br>Infraestructura  | 20   |
| Tubeado de zonas comunes<br>Infraestructura       | 12   |
| Cableado de zonas comunes<br>Infraestructura      | 8    |

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

| Condicionante                                                                      | Afecta |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabicado · OTRO GREMIO<br>Cuadros presentados, Montante de servicios comunes, M... | 66     |
| Pintura — primera mano · OTRO GREMIO<br>Mecanizado eléctrico, Telemecanizado       | 62     |
| Pintura — segunda mano · OTRO GREMIO<br>Casquillos y bombillas, Placas y tapas     | 62     |
| Fachada terminada · OTRO GREMIO<br>Aplicques y enchufes de terraza                 | 31     |
| Pintura de zonas comunes · OTRO GREMIO<br>Iluminación de rellanos / ZZCC           | 31     |


RESUMEN EJECUTIVO

**Situación eléctrica:** Sagarde alcanza un **4.5%** de avance estimado y un **4.3%** terminado; sin comparación histórica suficiente. **Producción:** 10 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 8 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.




ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

No hay suficientes revisiones comparables para una tendencia fiable; se muestra la composición del último estado medido.



AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

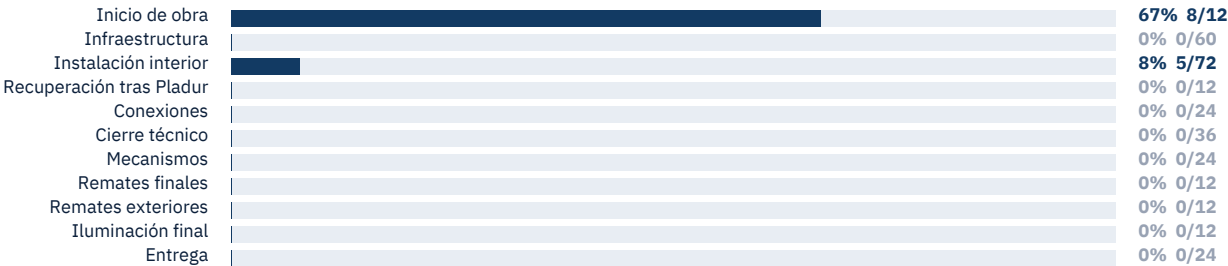

TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

| Tajo Sagarde                   | Fase                 | Avance | Hecho | Pendiente |
|--------------------------------|----------------------|--------|-------|-----------|
| Rozas de timbres               | Inicio de obra       | 67%    | 8/12  | 4         |
| Montante eléctrica             | Infraestructura      | 0%     | 0/12  | 12        |
| Montante de telecomunicaciones | Infraestructura      | 0%     | 0/12  | 12        |
| Montante de servicios comunes  | Infraestructura      | 0%     | 0/12  | 12        |
| Tubeado de zonas comunes       | Infraestructura      | 0%     | 0/12  | 12        |
| Cableado de zonas comunes      | Infraestructura      | 0%     | 0/12  | 12        |
| Cuadros presentados            | Instalación interior | 25%    | 3/12  | 9         |
| Tubeado interior               | Instalación interior | 22%    | 2/12  | 9         |

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN


| Próximo tajo Sagarde                              | Uds. |
|---------------------------------------------------|------|
| Montante eléctrica<br>Infraestructura             | 8    |
| Montante de telecomunicaciones<br>Infraestructura | 8    |
| Montante de servicios comunes<br>Infraestructura  | 8    |
| Tubeado de zonas comunes<br>Infraestructura       | 8    |
| Cuadros presentados<br>Instalación interior       | 5    |

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

| Condicionante                                                                      | Afecta |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Pintura — primera mano · OTRO GREMIO<br>Mecanizado eléctrico, Telemecanizado       | 24     |
| Pintura — segunda mano · OTRO GREMIO<br>Casquillos y bombillas, Placas y tapas     | 24     |
| Tabicado · OTRO GREMIO<br>Cuadros presentados, Montante de servicios comunes, M... | 24     |
| Fachada terminada · OTRO GREMIO<br>Aplicques y enchufes de terraza                 | 12     |
| Pintura de zonas comunes · OTRO GREMIO<br>Iluminación de rellanos / ZZCC           | 12     |

RESUMEN EJECUTIVO

**Situación eléctrica:** Sagarde alcanza un **92.0%** de avance estimado y un **80.0%** terminado; sin comparación histórica suficiente.  
**Producción:** 0 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 1 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.



ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

No hay suficientes revisiones comparables para una tendencia fiable; se muestra la composición del último estado medido.



AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.



TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

| Tajo Sagarde                        | Fase                    | Avance | Hecho | Pendiente |
|-------------------------------------|-------------------------|--------|-------|-----------|
| Colocación de módulos de contadores | Cuartos técnicos garaje | 60%    | 0/1   | 0         |

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

No hay frentes propios clasificados como listos.

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

| Condicionante                                                                     | Afecta |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Pintura (recintos) – 1ª mano · OTRO GREMIO<br>Colocación de módulos de contadores | 1      |

# CIERRE DE EXPEDIENTE

| HITO                    | ESTADO    | FECHA | NOTA |
|-------------------------|-----------|-------|------|
| Ensayos instrumentales  | PENDIENTE | —     | —    |
| Inspección OCA          | PENDIENTE | —     | —    |
| CIE / Boletín eléctrico | PENDIENTE | —     | —    |
| Libro del Edificio      | PENDIENTE | —     | —    |
