


RESUMEN EJECUTIVO

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **11.7%** de avance estimado y un **9.2%** terminado; sin comparación histórica suficiente.
Producción: 15 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 8 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.




ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

No hay suficientes revisiones comparables para una tendencia fiable; se muestra la composición del último estado medido.



AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

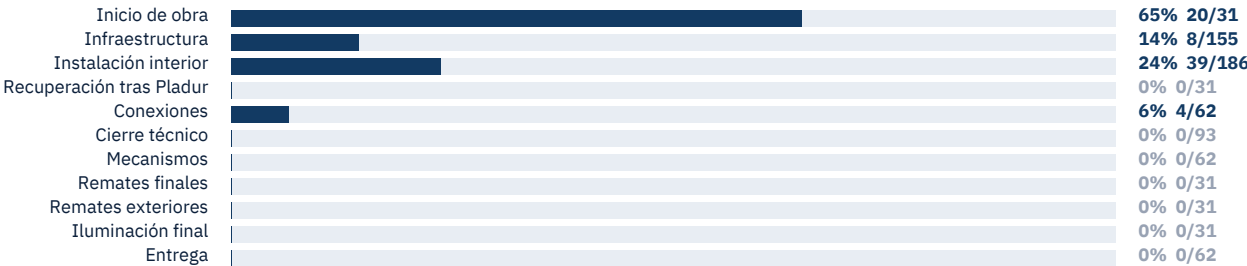

TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

Tajo Sagarde	Fase	Avance	Hecho	Pendiente
Rozas de timbres	Inicio de obra	65%	20/31	11
Montante eléctrica	Infraestructura	15%	0/31	23
Montante de telecomunicaciones	Infraestructura	15%	0/31	23
Montante de servicios comunes	Infraestructura	15%	0/31	23
Tubeado de zonas comunes	Infraestructura	26%	8/31	23
Cableado de zonas comunes	Infraestructura	0%	0/31	31
Cuadros presentados	Instalación interior	43%	13/31	17
Tubeado interior	Instalación interior	38%	10/31	18

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Montante eléctrica Infraestructura	20
Montante de telecomunicaciones Infraestructura	20
Montante de servicios comunes Infraestructura	20
Tubeado de zonas comunes Infraestructura	12
Cableado de zonas comunes Infraestructura	8

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Condicionante	Afecta
Tabicado · OTRO GREMIO Cuadros presentados, Montante de servicios comunes, M...	66
Pintura — primera mano · OTRO GREMIO Mecanizado eléctrico, Telemecanizado	62
Pintura — segunda mano · OTRO GREMIO Casquillos y bombillas, Placas y tapas	62
Fachada terminada · OTRO GREMIO Aplicques y enchufes de terraza	31
Pintura de zonas comunes · OTRO GREMIO Iluminación de rellanos / ZZCC	31


RESUMEN EJECUTIVO

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **4.5%** de avance estimado y un **4.3%** terminado; sin comparación histórica suficiente. **Producción:** 11 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 8 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.




ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

No hay suficientes revisiones comparables para una tendencia fiable; se muestra la composición del último estado medido.



AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

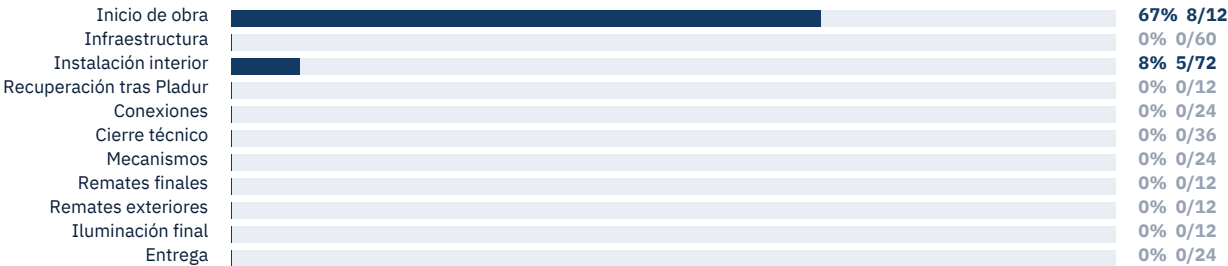

TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

Tajo Sagarde	Fase	Avance	Hecho	Pendiente
Rozas de timbres	Inicio de obra	67%	8/12	4
Montante eléctrica	Infraestructura	0%	0/12	12
Montante de telecomunicaciones	Infraestructura	0%	0/12	12
Montante de servicios comunes	Infraestructura	0%	0/12	12
Tubeado de zonas comunes	Infraestructura	0%	0/12	12
Cableado de zonas comunes	Infraestructura	0%	0/12	12
Cuadros presentados	Instalación interior	25%	3/12	9
Tubeado interior	Instalación interior	22%	2/12	9

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Montante eléctrica Infraestructura	8
Montante de telecomunicaciones Infraestructura	8
Montante de servicios comunes Infraestructura	8
Tubeado de zonas comunes Infraestructura	8
Cuadros presentados Instalación interior	5

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Condicionante	Afecta
Pintura — primera mano · OTRO GREMIO Mecanizado eléctrico, Telemecanizado	24
Pintura — segunda mano · OTRO GREMIO Casquillos y bombillas, Placas y tapas	24
Tabicado · OTRO GREMIO Cuadros presentados, Montante de servicios comunes, M...	24
Fachada terminada · OTRO GREMIO Aplicques y enchufes de terraza	12
Pintura de zonas comunes · OTRO GREMIO Iluminación de rellanos / ZZCC	12

CIERRE DE EXPEDIENTE

HITO	ESTADO	FECHA	NOTA
Ensayos instrumentales	PENDIENTE	—	—
Inspección OCA	PENDIENTE	—	—
CIE / Boletín eléctrico	PENDIENTE	—	—
Libro del Edificio	PENDIENTE	—	—
